



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพบ.(กป.) ๒๓๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายถิภกรพร วังพันธุหา ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัดญา ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพบ.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ ช่วงเวลาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองบัวหนอง ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5 (สพบ.2)	16 ธ.ค. 62	09.00	12.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองบัวหนอง	TKK3R-01	TKK3S-03	นายพนันต์ พรหมศรี ไฟ.๒๕๖๒๕๖๖๕
๒.	F5 (สพบ.2)	16 ธ.ค. 62	09.00	17.00		TKK3R-03	DIS ชั่วคราว นบ.๑ บ้านหนอง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) รีโวลเซอร์บ้านดอนพรหม - บ้านหนองบัวหนอง - DIS ชั่วคราว หนองบัวหนอง.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายถิภกรพร วังพันธุหา ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพบ. โทรศ.๑๕๕๒๐๐๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายนครินทร์ รัตนปัดญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สพบ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

นศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPOS จาก TKK3R-01 ถึง TKK3S-03  
 ในวันที่ 16 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1149/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPOS จาก TKK3S-03 ถึง DIS ชั่ว. นบ.๑ บ้านหนอง  
 ในวันที่ 16 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย นริศมยงค์ ไร่โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟดับ คุณกรกรฤกษ์ นนธ์  
 7 ธ.ค. 62

รศ.พร สันต์โกศลรัง  
 (๑๐ก. 6 แทน นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ก.๓.สพบ.(สพ.) 2220

เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ.

อภ.บข.(ก.๓), อภ.บว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
 แผนผังแนบ 1 แผน



หมายเหตุ - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

ก.๓.๑คปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

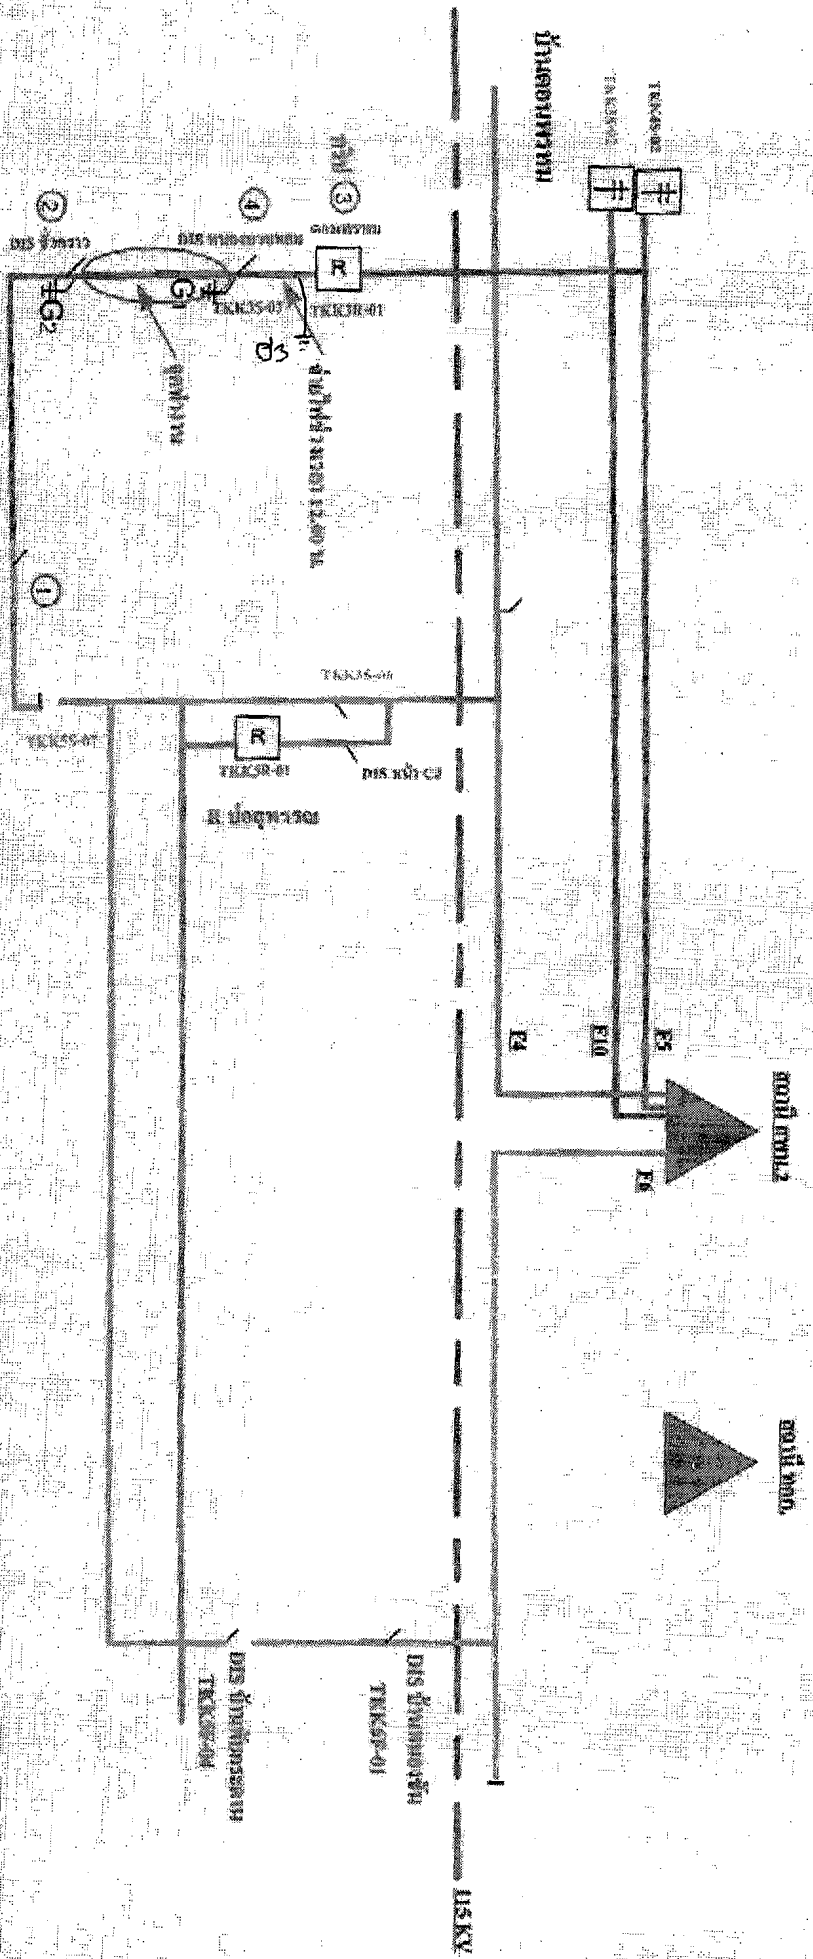
**ใบสั่งทำสวิตชิง**

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองบวบหอม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปักเสาเข็มไลน์และพาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1149/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	7 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	- ๘ ส.ค. ๒๕๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายภคกษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-
2	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	ดอนพรหม
3	ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
4	TKK03S-04	ปลด	สับ		ทคก.	DIS	หนองทิ้งส้ม
5	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.	DIS	บ้านหนองบวบหอม
6	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
7	TKK03R-01	สับ	ปลด		ทคก.	R	ดอนพรหม
8	แจ้งช่างหน้างาน ปลดไบมิตด้านนอกไลน์ TKK03R-01 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
9	TKK03S-03	สับ	ปลด		ทคก.	DIS	บ้านหนองบวบหอม
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short ground จุด G3						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
15	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
16	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตั้งแต่ TKK03R-01 ถึง TKK03S-03 ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
19	แจ้งช่างหน้างาน สับไบมิตด้านนอกไลน์ TKK03R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	TKK03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทคก.	R	ดอนพรหม
21	TKK03R-01	Nonreclosing	Normal		ทคก.	R	ดอนพรหม
22	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***						
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมดและยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short ground จุด G2						
26	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-
27	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	ดอนพรหม
28	TKK03S-03	ปลด	สับ		ทคก.	DIS	บ้านหนองบวบหอม
29	ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนกลับจาก SPO06						
30	DIS ชค.	ปลด	สับ		ทคก.	DIS	บ้านหนองบวบหอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	TKK03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS	หนองจิ่งสู่ม
32	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
33	TKK03R-01	Nonreclosing	Normal		ทคก.		R	ดอนพรหม
34	<u>***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***</u>							

**แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง**  
**วันที่ 16 ต.ล. เวลา 09.00-17.00 น.**  
**บริเวณ บ้านหนองนาบหอม**



เมื่อ DIS 4 ขึ้นมาเสร็จใน DIS 2 ให้ DIS 5 และ 12 ปิดลงทันที และ 3 รอไฟมาจนกระทั่ง TRKSR-01 มีไฟถึงหน้า DIS 4 ปิดลงทันที และ 12 ปิดลง และ DIS 4 ขึ้นมาจนกระทั่ง TRKSR-02 ลง 5 ปิดลงทันที และ 6 ปิดลงทันที
