





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวหน้าสถานีสุพรรณบุรี 2(SPA09) - DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-ต.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1434/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนุช ทองย้อย		วันที่ 12 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต นายมนุช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>**ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง**</b>							
1	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
2	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
3	<b>**ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07**</b>						
4	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
5	DIS ชั่วคราวฯ โหลด SPA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
เมื่อพร้อมตัด DDE							
6	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการโอนโหลดหม้อแปลงออกทั้งหมด						
7	หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการโอนโหลดหม้อแปลงออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
8	แจ้ง กฟจ.สพ.. ให้ออกไลน์กระเช้า ทำการปลด DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟส						
9	หลังจาก กฟจ.สพ.. ให้ออกไลน์กระเช้า ทำการปลด DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				สพ.		
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				สพ.		
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
16	<b>ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ</b>						
17	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
18	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				สพ.		
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				สพ.		
21	แจ้ง กฟจ.สพ.. ให้ออกไลน์กระเช้า ทำการจัม DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบเข้าทั้งสามเฟส						
22	หลังจาก กฟจ.สพ.. ให้ออกไลน์กระเช้า ทำการจัม DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบเข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
23	<b>**ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับคืนจาก SPA07**</b>						
24	DIS ชั่วคราวฯ โหลด SPA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
25	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
26	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการโอนโหลดหม้อแปลงกลับคืนทั้งหมด						
27	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
28	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
<b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>							



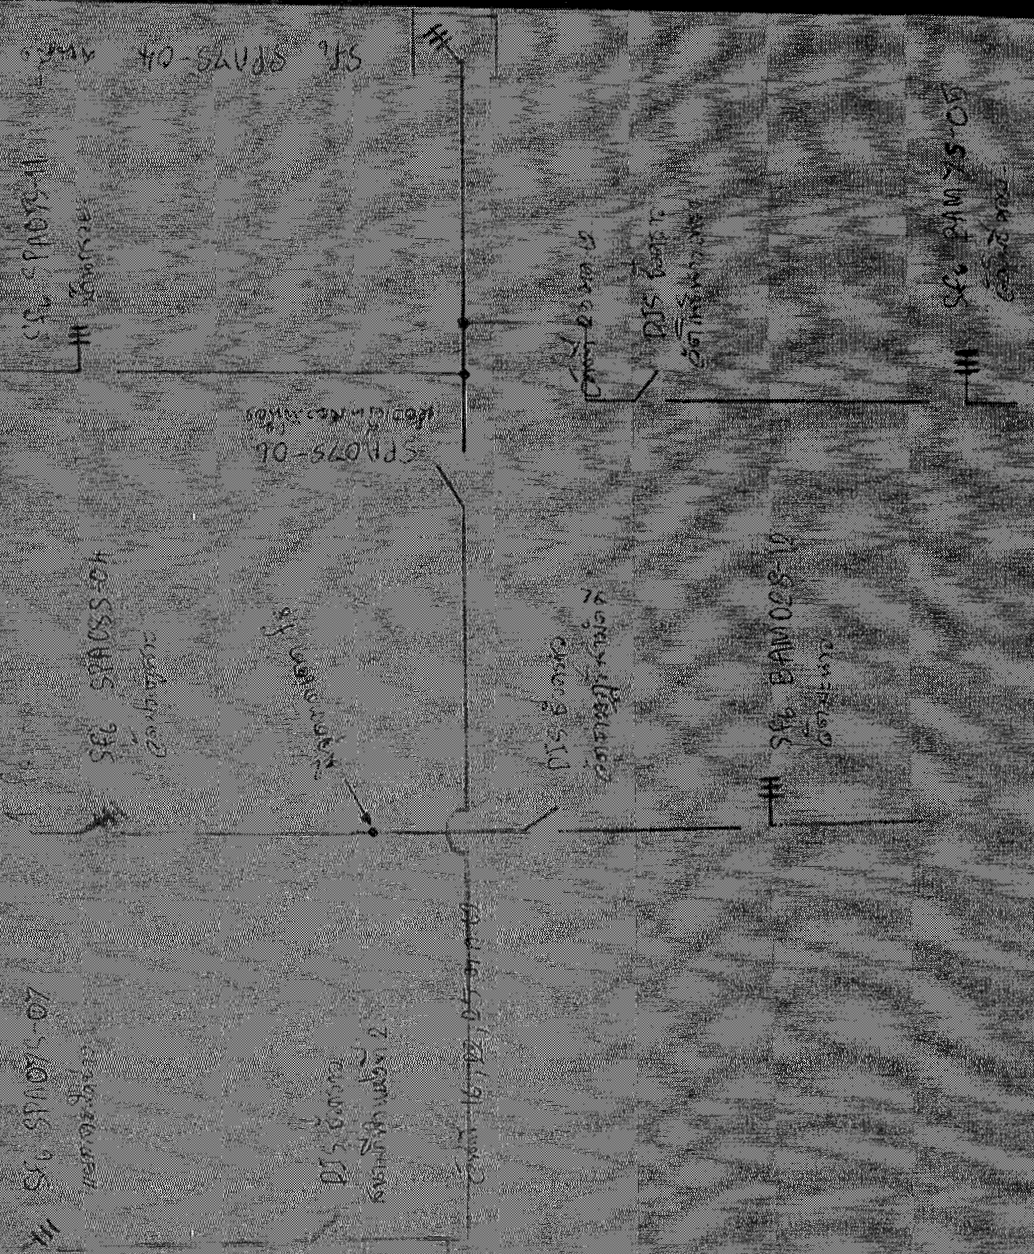

Sun 20.01.02

(SFG SPADSS-08)

SPADSS-09

SPADSS-08

SPADSS-07
