



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๐๘๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สมทิกปัญญา

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ย. 62

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สต.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ความแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	27/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าโขลง, DOE จพ.บ	โทร.๐๘๖-๓๓๓๓๓๓๓๓ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	29/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว นิมปท.	DOE จพ.บ	โทร.๐๘๖-๓๓๓๓๓๓๓๓ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	30/10/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว วัดโพธิ์บางแพรก	DOE ดิจิทัล ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๓๓๓๓๓๓ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๔.	๙ สท.	1/12/62 2/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีจพ.๒	DOE ดิจิทัล ถนนนิม	โทร.๐๘๖-๓๓๓๓๓๓๓๓ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชจ.๗ (สช.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สมทิกปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟภ. สต.

สำเนาแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเดอร์ SPA9 จาก Disชั่วคราว สถานีจพ.๒ ถึง DOE ดิจิทัล หน้าห้างสรรพสินค้า
ในวันที่ 1, 2 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 7692

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ภิรินทร์ กองชัย
23 พ.ย. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัชวาล สุวรรณประทีป

(นายชัชวาล สุวรรณประทีป)
(ผจก. กฟภ. สต.)

สำเนาผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3291
เรียน ผจก. กฟภ. สต.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 25 พ.ย. ๖๕๖2

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวหน้าสถานีสุพรรณบุรี 2(SPA09) - DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1,2 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1672/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	24 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พ.ย 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พ.ค. 61	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต นายมน โทงย้อย			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
2	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
เมื่อพร้อมดับไฟ ตัด DDE เวลา 08.00 น.							
3	DIS ชั่วคราวห ไลน์ SPA09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
4	แจ้ง กฟช.สพ. ทำการไลน์ไหลดหม้อแปลงออกทั้งหมด						
5	หลังจาก กฟช.สพ. ทำการไลน์ไหลดหม้อแปลงออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
6	แจ้ง กฟช.สพ.. ให้ออฟไลน์กระแส 22 เควี ทำการปลด DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟส						
7	หลังจาก กฟช.สพ.. ให้ออฟไลน์กระแส 22 เควี ทำการปลด DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
8	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟช.สพ. รับทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
14	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค. 62							
15	หลังจากชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
16	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	DIS ชั่วคราวห ไลน์ SPA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
20	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 1 ธ.ค. 62							
สวิตชิงวันที่ 2 ธ.ค. 62							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
21	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
22	DIS ชั่วคราวห ไลน์ SPA09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟช.สพ. รับทราบ						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุดสวิตช์ช่วงเช้าวันที่ 2 ธ.ค. 62							
28	หลังจากชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
เมื่อพร้อมดับไฟจี้ม DDE เวลา 17.00 น.							
29	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
30	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
31	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1					สพ.	
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2					สพ.	
34	แจ้ง กพจ.สพ. ทำการไล่นีโพลดหม้อแปลงออกทั้งหมด						
35	หลังจาก กพจ.สพ. ทำการไล่นีโพลดหม้อแปลงออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กพจ.สพ.. ให้ออทไลน์กระเช้า 22 เควี ทำการจี้ม DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟส						
37	หลังจาก กพจ.สพ.. ให้ออทไลน์กระเช้า 22 เควี ทำการจี้ม DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี ตามผังแนบออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
38	DIS ชั่วคราวท ไลน์ SPA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
39	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
40	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ. กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑,๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจู้ Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี

สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พีดเคอร์ ...๗... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจู้ Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง...ชม.กส.กฟภ.สพ...เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเทิน

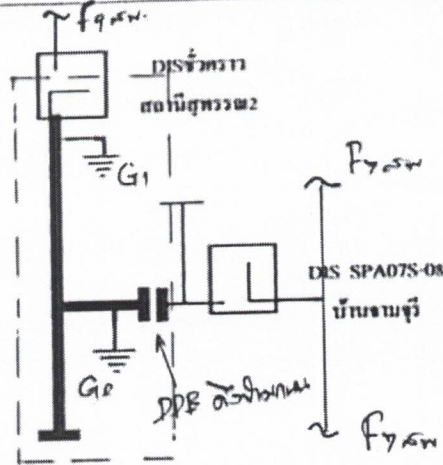

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดไหลออกจากระบบ
๒. ปลดไหลจุด Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDEดึงข้ามถนน ๑ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก่ไฟฟ้าชั่วคราวจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Ok
(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๙๕-๕๓๕๖๒๗๘, ๑๕๕๕๕, ๑๕๕๖๐
