



ใบสั่งทำสวิตชิง


สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (ถาวร)						
กำหนดวันที่ทำงาน	23/02/2562	เวลา 08.30	น.	ถึง	23/02/2562	เวลา 16.30	น.
ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	จัมสายส่ง 115KV เข้า KTE (ถาวร)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	227/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	18 ก.พ. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	18 ก.พ. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 						
							(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
							(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
							(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTZ, BNP, BAL,							
1	ย้ายโหลด KTZ ไปรับไฟจาก SAA						
2	BNP03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		
3	BAL03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KTZ01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
5	KTZ02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	KTZ02YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
7	KTZ02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	KTZ01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
9	จ่ายไฟ 115 KV โหลด บ้านแพ้ว - บางปลา แบบ Open loop						
10	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		
11	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส BNP03YS-04 (หน้า บ.มหาชัยมารีน่า)						
14	BNP03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ		LBS. 115KV หน้ามหาชัยมารีน่า
15	ตรวจสอบสถานะ Targat ของ LBS.115KV รหัส BNP03YS-04 (หน้า บ.มหาชัยมารีน่า) เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ทั้ง 3 เฟส						
16	BAL03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		
17	ดำเนินการจัมสายส่ง 115 KV โดยฮอทไลน์ (ชุด นายอนุชา คำสีดา) ตามผังแนบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
18	ตรวจสอบ KTE05YB-01, KTE05YS-02 (สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 ถาวร) แสดงสถานะ Open						
19	BAL03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		-
20	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		
22	จ่ายไฟ 115 KV ไลน์ บ้านแพ้ว - บางปลา แบบ Close loop						
23	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส BNP03YS-04 (หน้า บ.มหาชัยมารีน่า)						
24	BNP03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กทบ		LBS. 115KV หน้ามหาชัยมารีน่า
25	ตรวจสอบสถานะ Targat ของ LBS.115KV รหัส BNP03YS-04 (หน้า บ.มหาชัยมารีน่า) เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ทั้ง 3 เฟส						
26	ย้ายโหลด KTZ ไปรับไฟจาก SAA						
27	KTZ02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
28	KTZ02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
29	KTZ02YB-01	ปลด	สับ <i>or Manual</i>		ศูนย์ฯ		
30	KTZ01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
31	KTZ02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
32	BNP03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		
33	BAL03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังการจ่ายไฟสถานี Close Loop 115 เควี ในพื้นที่ กฟภ.3

แสดงสถานะจ่ายไฟสถานี 5 กระจุมแบน 5 (ถาวร) ก่อนดำเนินการ

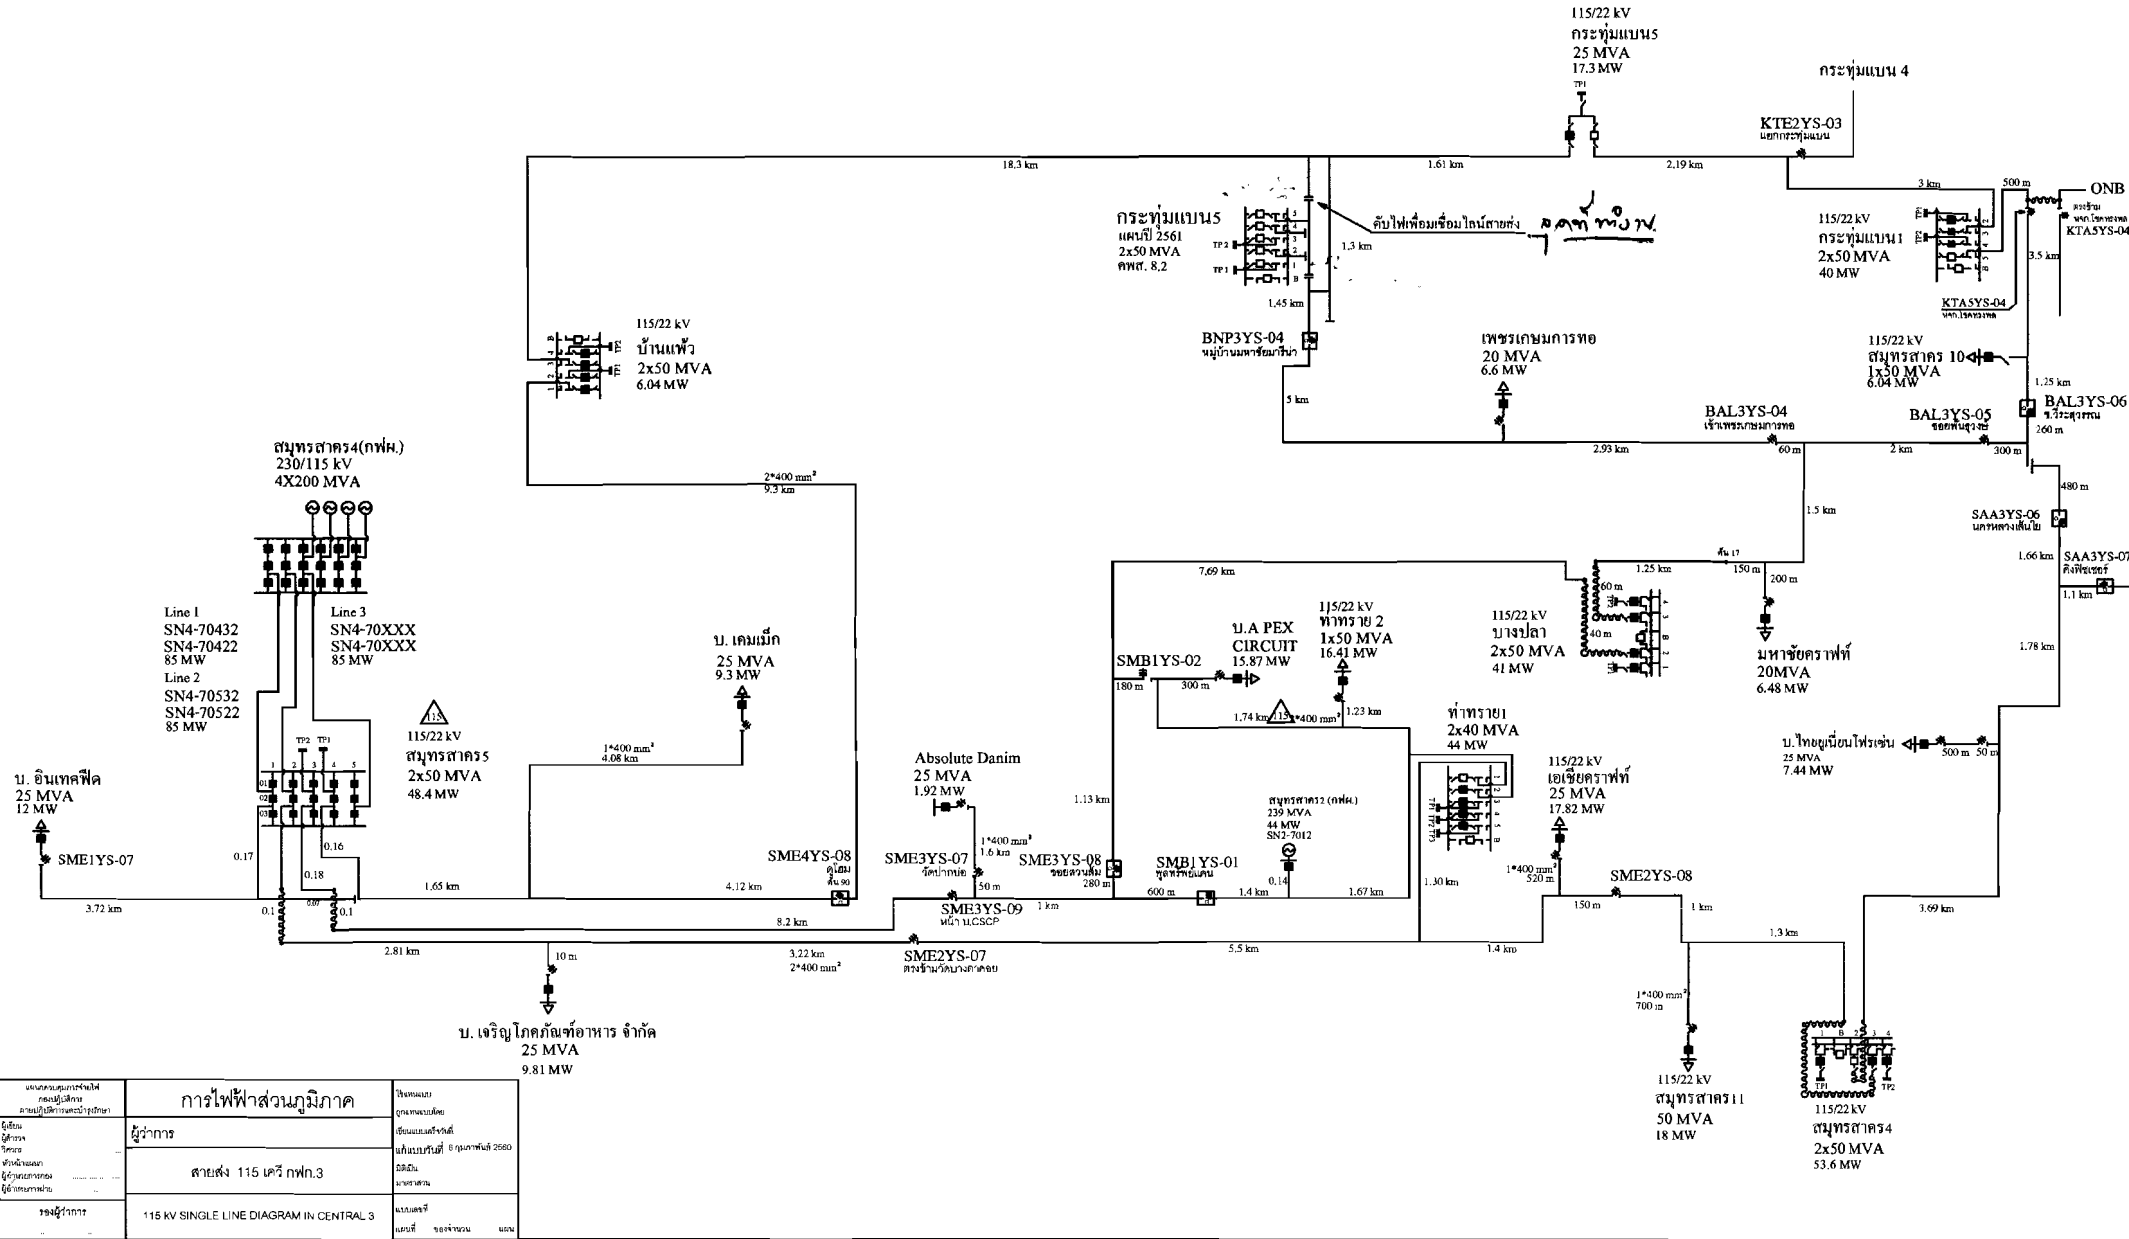

แผนผังการจ่ายไฟ สถานี 5 กระจุมแบน 5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อโครงการ ฐานการผลิต
ผู้จัดทำ วิศวกร	ผู้ว่าราชการ	ชื่อและขนาดโรงผลิต
ผู้ตรวจสอบ วิศวกร	สายส่ง 115 เควี กฟภ.3	ลักษณะพื้นที่ 6 ไร่ กว้าง 150 เมตร
ผู้ดำเนินการ วิศวกร	115 kV SINGLE LINE DIAGRAM IN CENTRAL 3	ประเภทสถานี ผลิต
วันที่จัดทำ		แบบแปลน ชนิดที่ 308 จำนวน 1 แผ่น

