




ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | DIS ชค.หน้า รร.บ้านลำเหย - SF6 BOP05S-08 บ้านยางสูง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26,27/4/2019 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 477/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 9 เมษายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 เม.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 เม.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช
3. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	*****งาน 477 นี้มีช้อนกับงาน 435 ด้วยครับ*****						
2	งานดับไฟย้ายโหลดไลน์แยก บ้านสันติสุข วันที่ 26 เมย.62 เวลา 12.00 น.เพื่อรองรับงานวันที่ 27 เมย.62						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
4	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		R หนองรีลำอี่ชู
5	Drop ไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		D/F สันติสุข
6	Drop ไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		D/F หนองแกนใน
7	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		ทปร.		R หนองรีลำอี่ชู
สิ้นสุด Switching (วันที่ 26 เมย.62)							
8	*****งาน 477 นี้มีช้อนกับงาน 435 ด้วยครับ*****						
9	กฟอ.บพล.เริ่มทำงานวันที่ 27 เมย.62						
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching ให้ 435 แล้วเสร็จก่อน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
12	DIS ชค.BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS หน้า รร.ลำเหย
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า (วันที่ 27 เมย.62)							
18	เมื่อชุด กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 27 เมย.62)*****เช็คงาน 435 ด้วยว่าแล้วเสร็จหรือยัง*****						
19	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		R หนองรีลำอี่ชู
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพเดิม						
25	DIS ชค.BOP05	ปลด	สับ		บพล.		DIS หน้า รร.ลำเหย
26	ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยก บ้านสันติสุข กลับสภาพปกติ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	Drop ไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพล.		D/F	หนองแกนนโน
28	Drop ไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		D/F	สันติสุข
29	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		ทปร.		R	หนองรีลำอีชู
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								


สถานะการณ้จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

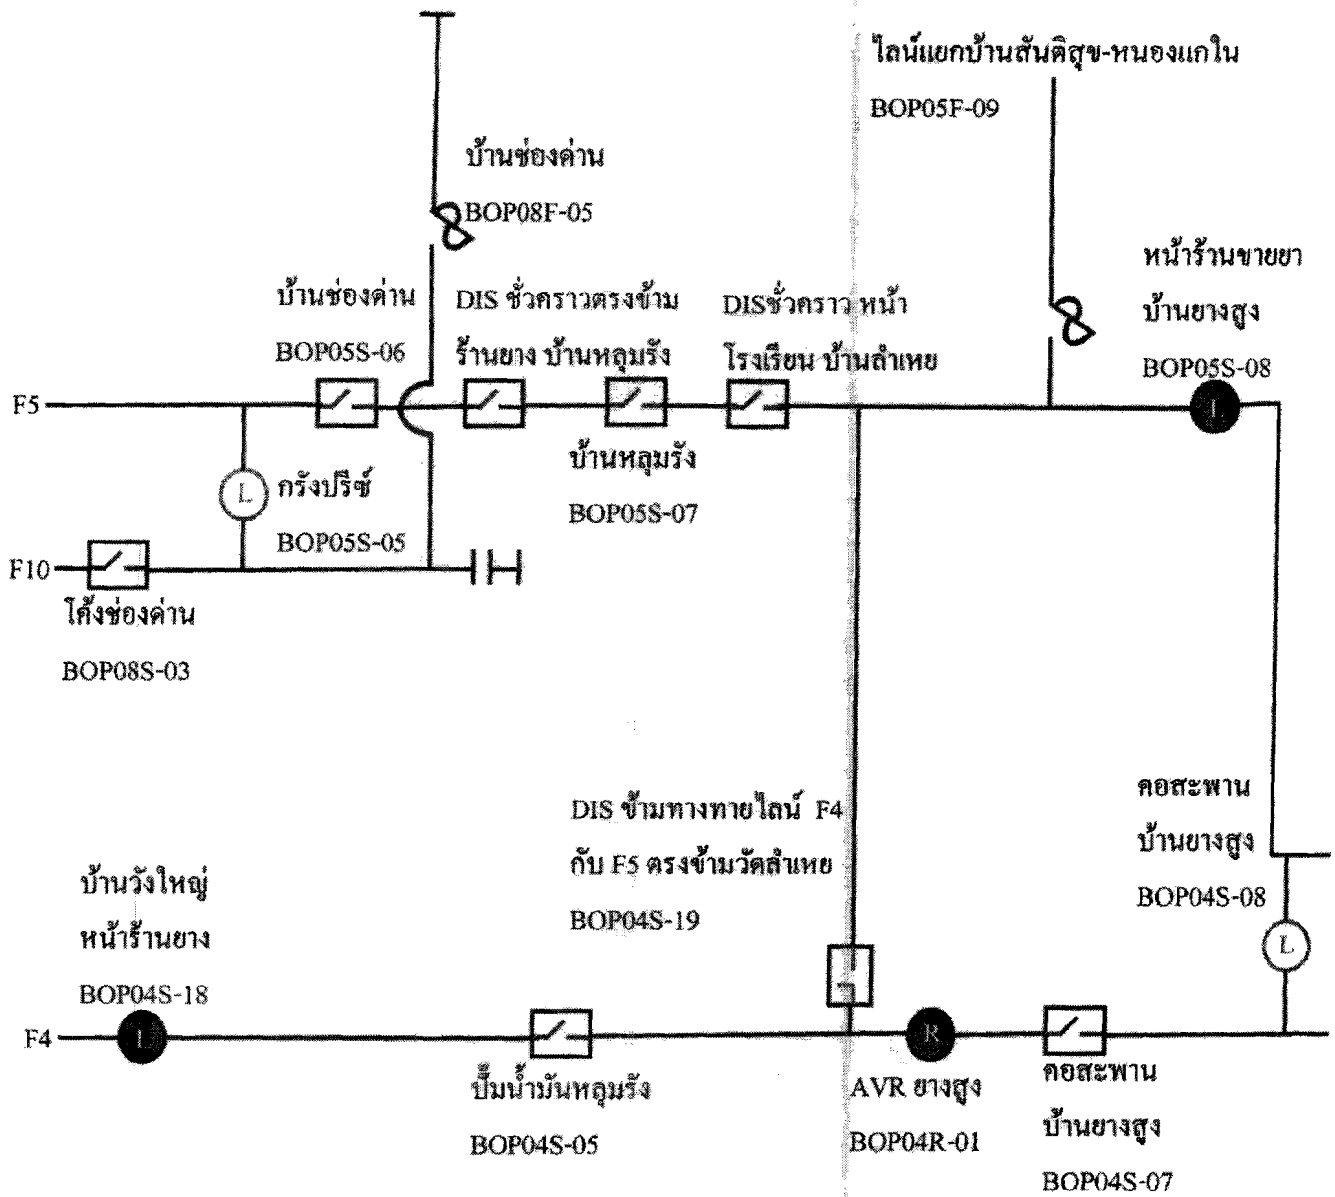



[Handwritten Signature]
๗ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

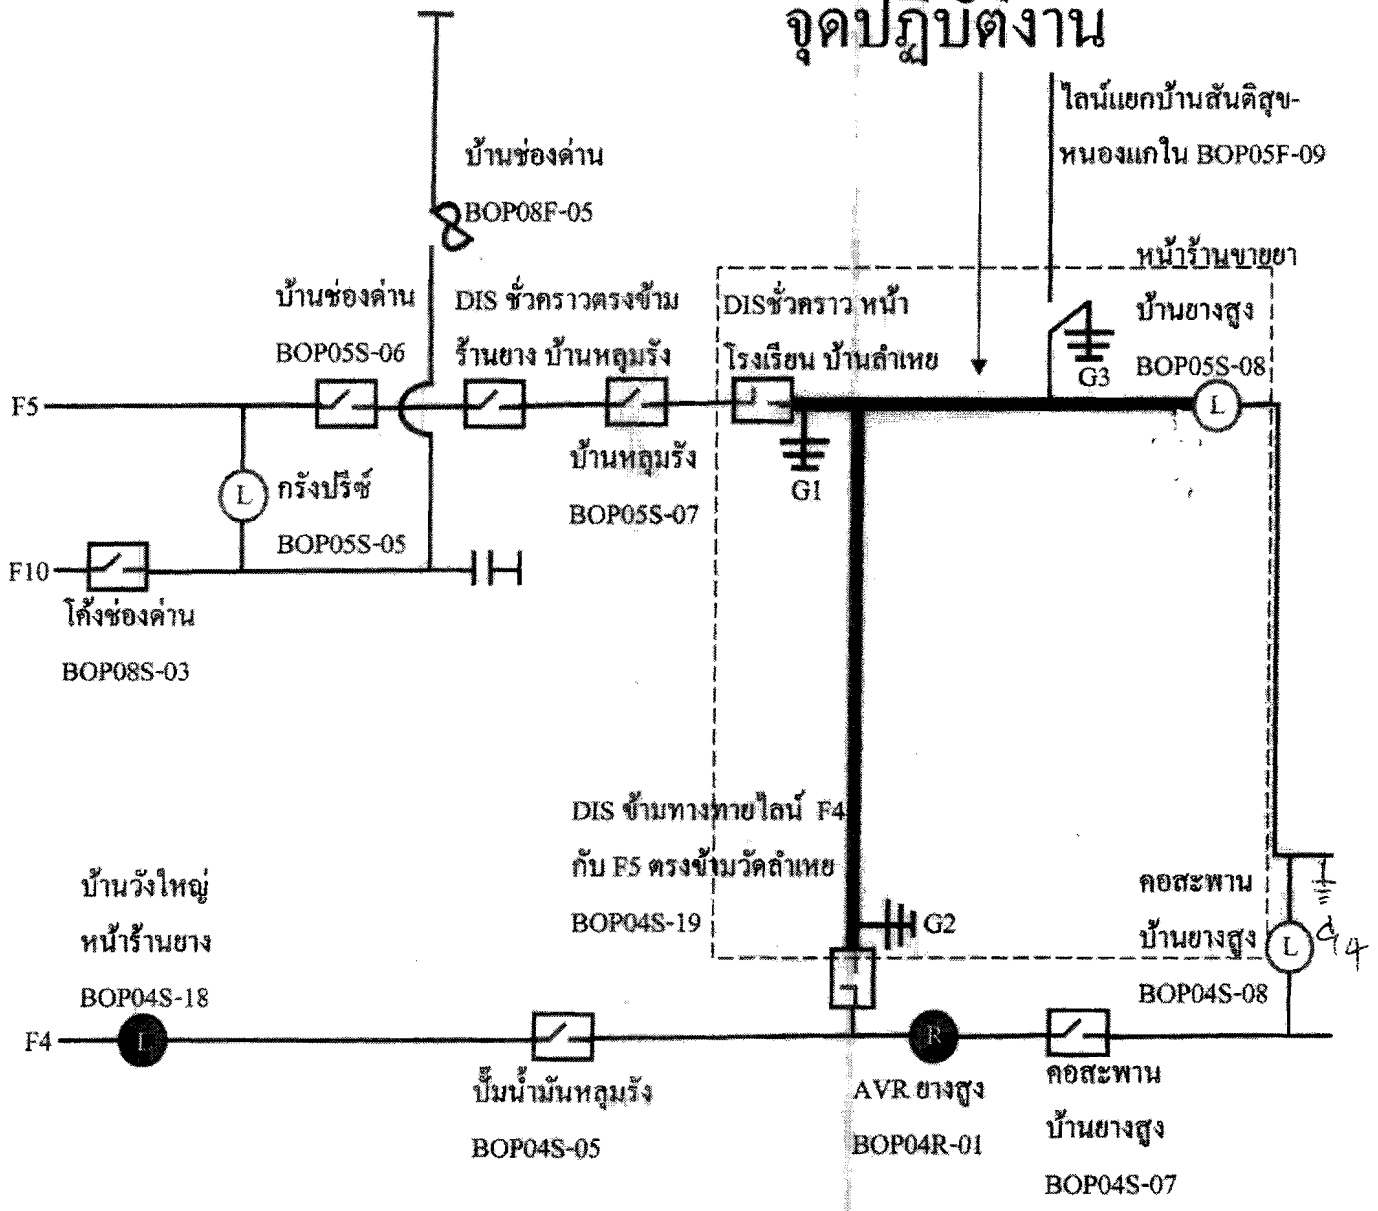จุดปฏิบัติงาน



 พื้นที่ปฏิบัติงาน
 พื้นที่ดับไฟ
 จุดช็อตกราวด์

ทำการย้ายโหลด โหลดแยกบ้านสันติสุข BOP05F-09
 ไปรับไฟจาก โหลดแยกบ้านหนองแกใน BOP05F-11/03
 ช่วงหน้า ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.


 E-๕ เม.ย. ๒๕๖๒
