



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 ๑๑ ๖๒

เลขที่ ก.๓ อ.ทอง (ป.บ.) ๔๔๘๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถวัลย์พงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง นายชานนท์ วีระดำรงกุล

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.บ.บ.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	FD สถานี ๒	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ติดตั้งแอร์เบรก ๑๑๕ เควี	SF๒ หน้าบริษัท CL คอนกรีต	SF๒ หน้าโรงงาน ไทยฟูตส์	นายวัฒน์นา ออนุศรี ท.ป.บ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓
๒	F๑ อุทอง	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลตเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายทาดสายแรงสูง ๑๓๕	DIS หน้าบริษัท โตว่องไว	DDEสามแยกไฟแดงจะเข้สามพัน	นายวัฒน์นา ออนุศรี ท.ป.บ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓
๓.	๑๑๕	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ติดตั้งแอร์เบรก ๑๑๕ เควี	สถานี ๑ สถานี ๒	สถานี ๑ อุทอง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มี ๕ ต.สระพังสาม อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒน์นา ออนุศรี ตำแหน่ง หน.บ.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ท.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายชานนท์ วีระดำรงกุล )

ตำแหน่ง หน.บ.บ.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศท.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผศท. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 3 พิดเตอร์ SP004 จาก SF6 หน้า CL คอนกรีต หน้าโรงงานไทยฟูตส์

ในวันที่ 14 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1276

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OT6-01 จาก DIS หน้า โตว่องไว ถึง 006 สามแยกไฟแดงจะเข้สามพัน

ในวันที่ 14 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1276

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันตักเศรษฐกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัฒน์นา ออนุศรี

2 ต.ค. ๖๒

สมพร ตันตักเศรษฐกิจ

( ๐๐๓-6 1๒๓๓-๐๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

2767

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ร(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจท. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ก่อนถึง บ.ไทยฟูตส์ (ABS 115 เควี), สระพังลาน                                      |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14-ต.ค.-62  | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.อทง.  | งานที่ทำ | ติดตั้ง ABS 115, ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1276/62   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ  |          | วันที่ 2 ตุลาคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ ๕ ต.ค. ๖๒   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 5 ต.ค. ๖๒   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |          | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1.กฟพ.2 ติดตั้งแอร์เบรก 115 เควี บริเวณ		ก่อนถึง บ.ไทยฟูตส์				
3	2.กฟอ.อทง. ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ระหว่าง Dis ชั่วคราวหน้า บริษัท ไทว่องไว ถึง DDE สามแยกจรเข้สามพัน				
4	** SF6 ชั่วคราวหน้า บ. CL คอนกรีต จะติดตั้งในวันที่ 8 ต.ค.62 **						
5	** ตรวจสอบ สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (ปลด SPO03YB-01 อยู่) **						
6	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		-
7	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
9	ให้ กฟอ.อทง. ติดต่อ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ไทยฟูตส์ ให้ปลดโหลดภายใน						
10	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 หน้า บ. CL คอนกรีต
11	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้า บ. ไทว่องไว
12	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
14	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
15	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
16	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
17	UTG04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS บ.ไทยฟูตส์
18	ให้ กฟอ.อทง. ล็อคคาน SF6 ไทยฟูตส์ รหัส TKK05S-05						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				อทง.		
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				อทง.		
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3				อทง.		
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4				อทง.		
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5				กฟพ.2		กราวด์ 115 เควี
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6				กฟพ.2		กราวด์ 115 เควี
25	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		-
26	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				อทง.		
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				อทง.		
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3				อทง.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G4			อทง.		
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G5			กทพ.2		กราวด์ 115 เควี
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G6			กทพ.2		กราวด์ 115 เควี
34	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		-
35	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
36	ให้ ABS.115 เควี บริเวณก่อน ถึงบริษัท ไทยฟุตส์ (ติดตั้งใหม่) ให้อยู่ในสถานะสับอยู่ ใบมีดสนิททั้งสามเฟส						
37	ให้ กทพ.อทง. ติดต่อ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ไทยฟุตส์ ให้พร้อมรับไฟ						
38	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
39	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
40	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
41	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
42	UTG04YS-05	ปลด	สับ		อทง.		ABS บ.ไทยฟุตส์
43	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ให้ กทพ.อทง. ปลดล๊อคคาน SF6 ไทยฟุตส์ รหัส TKK05S-05						
46	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้า บ. CL คอนกรีต
47	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้า บ. ไทว่องไว
48	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		-
49	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
สิ้นสุด Switching							

# สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

จุดต่อ SF6 วันที่ 8 ต.ค. 62

พื้นที่ 4 รศท. 002

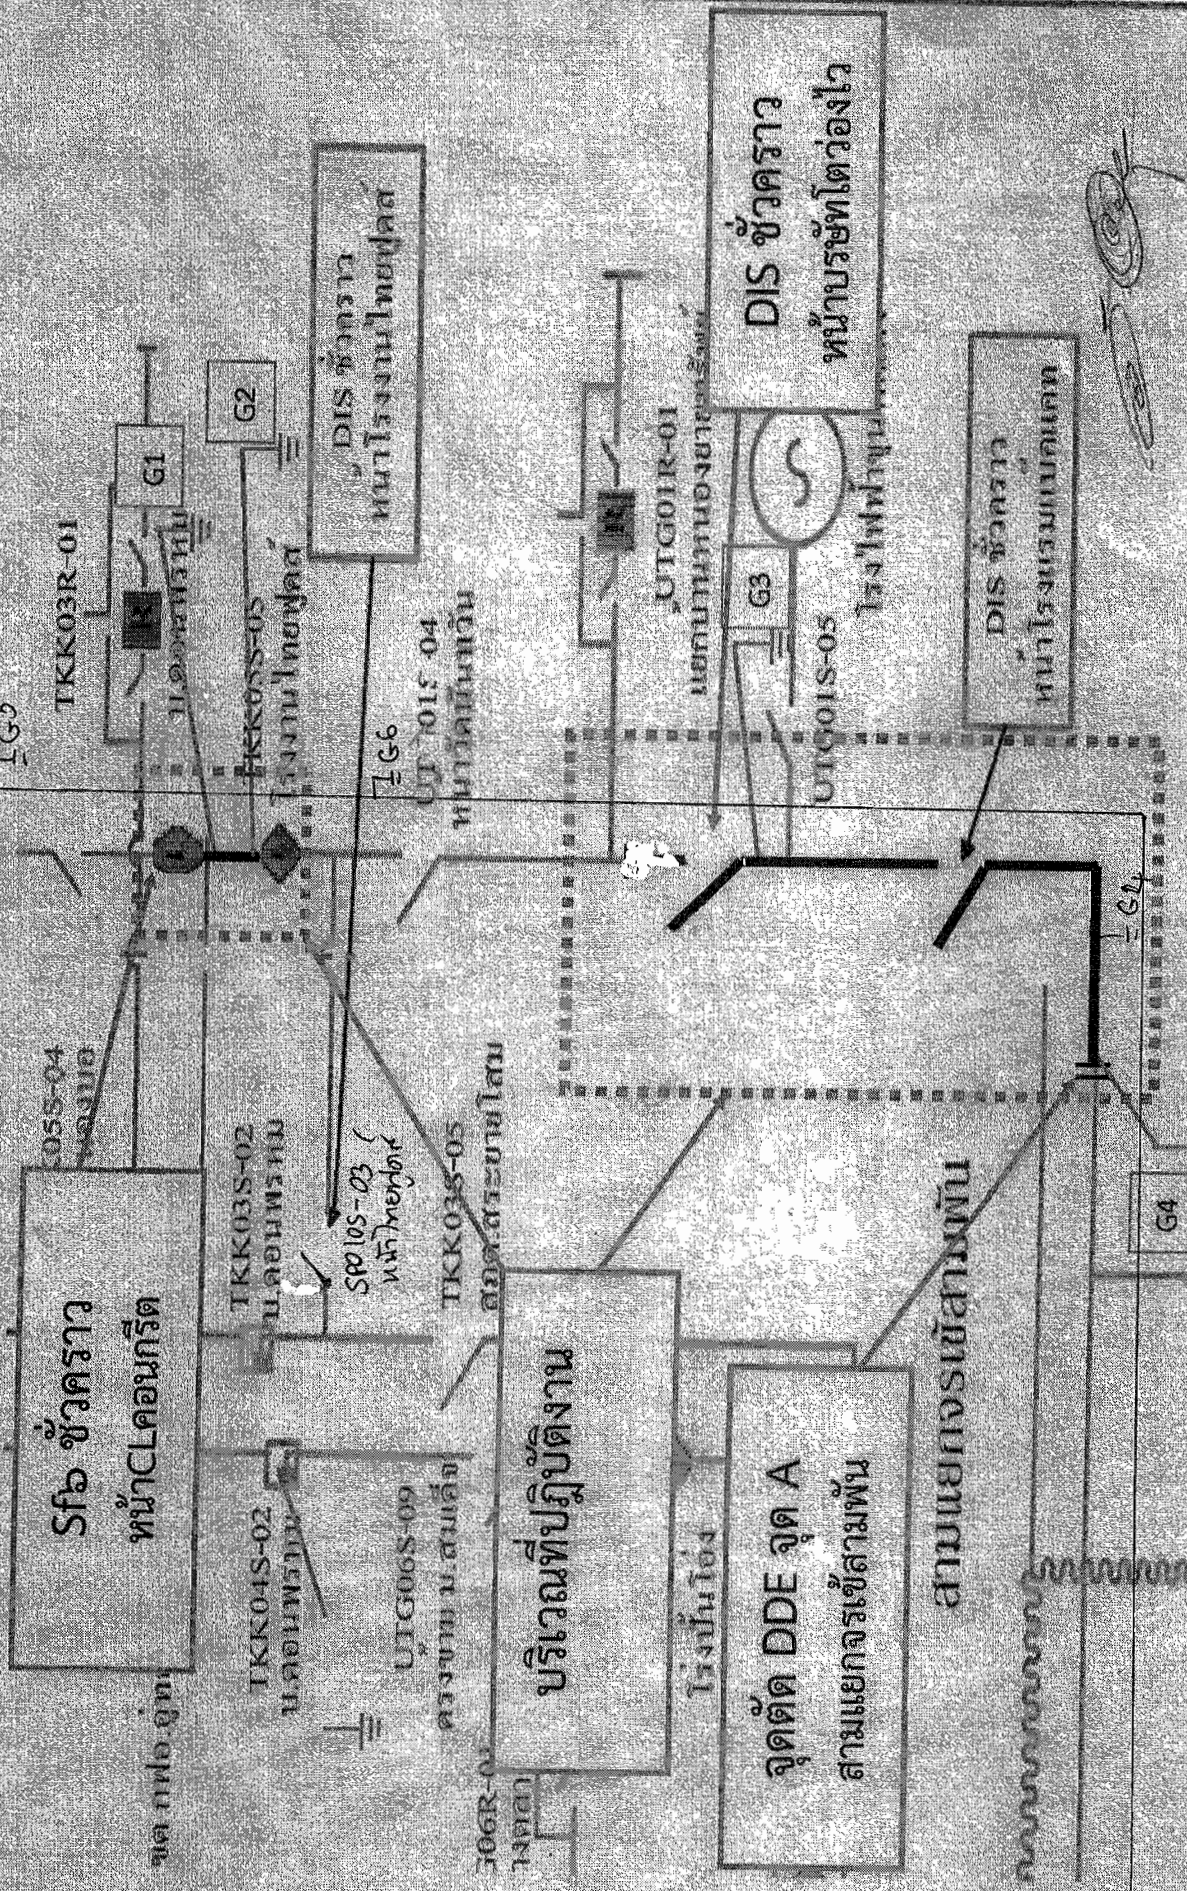

พื้นที่ 4 รศท. 002
