



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.พ. ๕๓๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๓)

ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทก.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|----------------|----------------|---|
| ๑. | F๕ | ๑๙ มิ.ย. ๖๒ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | รื้อถอน SVR ๓๐๐ A. | โกลเซอร์ ๕P-๐๒ | VLA๕S-๑๓ | นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๙-๒๐๓๗๗๗๘ |
| ๒. | F๕ | ๒๐ มิ.ย. ๖๒ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | รื้อถอนโกลเซอร์ VLA๕R-๐๒ | โกลเซอร์ ๕P-๐๒ | VLA๕S-๑๓ | นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๙-๒๐๓๗๗๗๘ |
| ๓. | F๕ | ๒๑ มิ.ย. ๖๒ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | ติดตั้ง SVR ๓๐๐ A. | VLA๕R-๐3 | สุรระบบจำหน่าย | นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๙-๒๐๓๗๗๗๘ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ได้รับผลกระทบ ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๗ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย รื่นประเสริฐ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทก. โทร ๐๘๙-๕๔๓-๖๗๕๕

ลงชื่อ

(นายณณมิตร ศิริพรรค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA๐5 จาก VLA๕R-๐2 ถึง VLA๕S-11

ในวันที่ 19 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 803

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ VLA๐5 จาก VLA๕R-๐2 ถึง VLA๕S-11

ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 803

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ VLA๐๖ จาก VLA๕R-๐3 ถึง สุรระบบจำหน่าย

ในวันที่ ๒1 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 803

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย (นายณณมิตร ศิริพรรค) ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ กฟส.ทก. ๑๖ มิ.ย. ๖๒

14 มิ.ย. 62

กฟท.๓ (๑๐/๖ หน้า นพ.๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

1684

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทก. กฟส.ทก. สขม.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๖/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

17 มิ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผน


แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์


นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ตลาดสังขละบุรี และ บ้านห้วยมาลัย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19,20,21,22 มิ.ย.62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทก. | งานที่ทำ | ย้าย SVR และรีลอคอน Recloser ตามใบขอปฏิบัติงาน 803/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | วันที่ 14 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | <i>สมพส</i> | | วันที่ 14 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 17 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ | | | | | | |
| 2 | สวิตชิงวันที่ 19 มิ.ย.62 (รีลอคอน SVR 100A ปัจจุบันไม่ได้เข้าระบบ) | | | | | | |
| 3 | ย้ายโหลด VLA05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก VLA04 | | | | | | |
| 4 | VLA05R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สังขละฯ | | R ตลาดสังขละฯ |
| 5 | VLA04R-05 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สังขละฯ | | AVR ด้านศาลกากร |
| 6 | VLA04S-16 | ปลด | ล๊ับ | | สังขละฯ | | SF6 ป้อมตำรวจแยกด่านเจดีย์ |
| 7 | VLA05S-08 | ล๊ับ | ปลด, ล็อคคาน | | สังขละฯ | | SF6 หน้าอิงตะวัน |
| 8 | ตรวจสอบ VLA05S-11 SF6 วัดสมเด็จ ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล็อคคาน | | | | | | |
| 9 | เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 10 | VLA05R-02 | ล๊ับ | ปลด | | สังขละฯ | | R ตลาดสังขละฯ |
| 11 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 12 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 13 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 14 | แจ้งช่างหน้างานให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 15 | VLA04R-05 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สังขละฯ | | AVR ด้านศาลกากร |
| สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า | | | | | | | |
| 16 | เมื่อช่างหน้างานปฏิบัติงานรีลอคอน SVR แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ (หน้างานไม่ขอย้ายโหลดกลับ เพื่อรองรับงานวันที่ 20) | | | | | | |
| 17 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 19 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 20 | VLA05R-02 | ปลด | ล๊ับ คง Nonreclosing, Alt | | สังขละฯ | | R ตลาดสังขละฯ |
| 21 | VLA05R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สังขละฯ | | R ตลาดสังขละฯ |
| สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 19 มิ.ย.62 | | | | | | | |
| 22 | สวิตชิงวันที่ 20 มิ.ย.62 (รีลอคอน Recloser VLA05R-02 R.ตลาดสังขละ) | | | | | | |
| 23 | ตรวจสอบ VLA05S-11 SF6 วัดสมเด็จ ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล็อคคาน | | | | | | |
| 24 | เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 25 | VLA05R-02 | ล๊ับ | ปลด | | สังขละฯ | | R ตลาดสังขละฯ |
| 26 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 27 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 28 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 29 | แจ้งช่างหน้างานให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า | | | | | | | |
| 30 | เมื่อช่างหน้างานปฏิบัติงานรื้อถอน R VLA05R-02 แล้วเสร็จ (คงเหลือ Sw.Bypass ไว้) | | | | | | |
| 31 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 32 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 33 | VLA04R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สังขละฯ | | AVR ตรงข้ามด้านตุลกากร |
| 34 | VLA04R-05 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สังขละฯ | | AVR ด้านตุลกากร |
| 35 | Dis bypass | ปลด | สับ | | สังขละฯ | | DIS Dis bypaas ตลาดสังขละฯ |
| 36 | ย้ายโหลด VLA05 (บางส่วน) กลับจาก VLA04 | | | | | | |
| 37 | VLA05S-11 | ปลด | สับ | | สังขละฯ | | SF6 วัดสมเด็จ |
| 38 | VLA04S-15 | ปลด | สับ | | สังขละฯ | SCADA | SF6 สามแยกด้านตุลกากร |
| 39 | VLA05S-10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สังขละฯ | | DIS ก่อนข้ามสะพานของกาเลีย |
| 40 | VLA04S-15 | สับ | ปลด | | สังขละฯ | SCADA | SF6 สามแยกด้านตุลกากร |
| 41 | VLA04R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สังขละฯ | | AVR ตรงข้ามด้านตุลกากร |
| 42 | VLA04R-05 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สังขละฯ | | AVR ด้านตุลกากร |
| สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 20 มิ.ย.62 | | | | | | | |
| 43 | สวิตชิงวันที่ 21 มิ.ย.62 และ 22 มิ.ย 62 (ติดตั้ง SVR 100A) ดับไฟตอนเช้าและจ่ายไฟกลับตอนเย็น | | | | | | |
| 44 | VLA05R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สังขละฯ | | R บ.ห้วยมาลัย |
| 45 | VLA05R-03 | สับ | ปลด | | สังขละฯ | | R บ.ห้วยมาลัย |
| 46 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดไบมิตด้านออกไลน์ ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 47 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 | | | | | | |
| 48 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 | | | | | | |
| 49 | แจ้งช่างหน้างานให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า | | | | | | | |
| 50 | เมื่อช่างหน้างานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ (กฟส.ทองผาภูมิแจ้งว่า ไม่ยืนยันว่าจะสามารถนำ SVA เข้าระบบทัน) | | | | | | |
| 51 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G4 | | | | | | |
| 52 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลด Short ground จุด G5 | | | | | | |
| 53 | แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 54 | VLA05R-03 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,Alt | | สังขละฯ | | R บ้านห้วยมาลัย |
| 55 | VLA05R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สังขละฯ | | R บ้านห้วยมาลัย |
| สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด | | | | | | | |

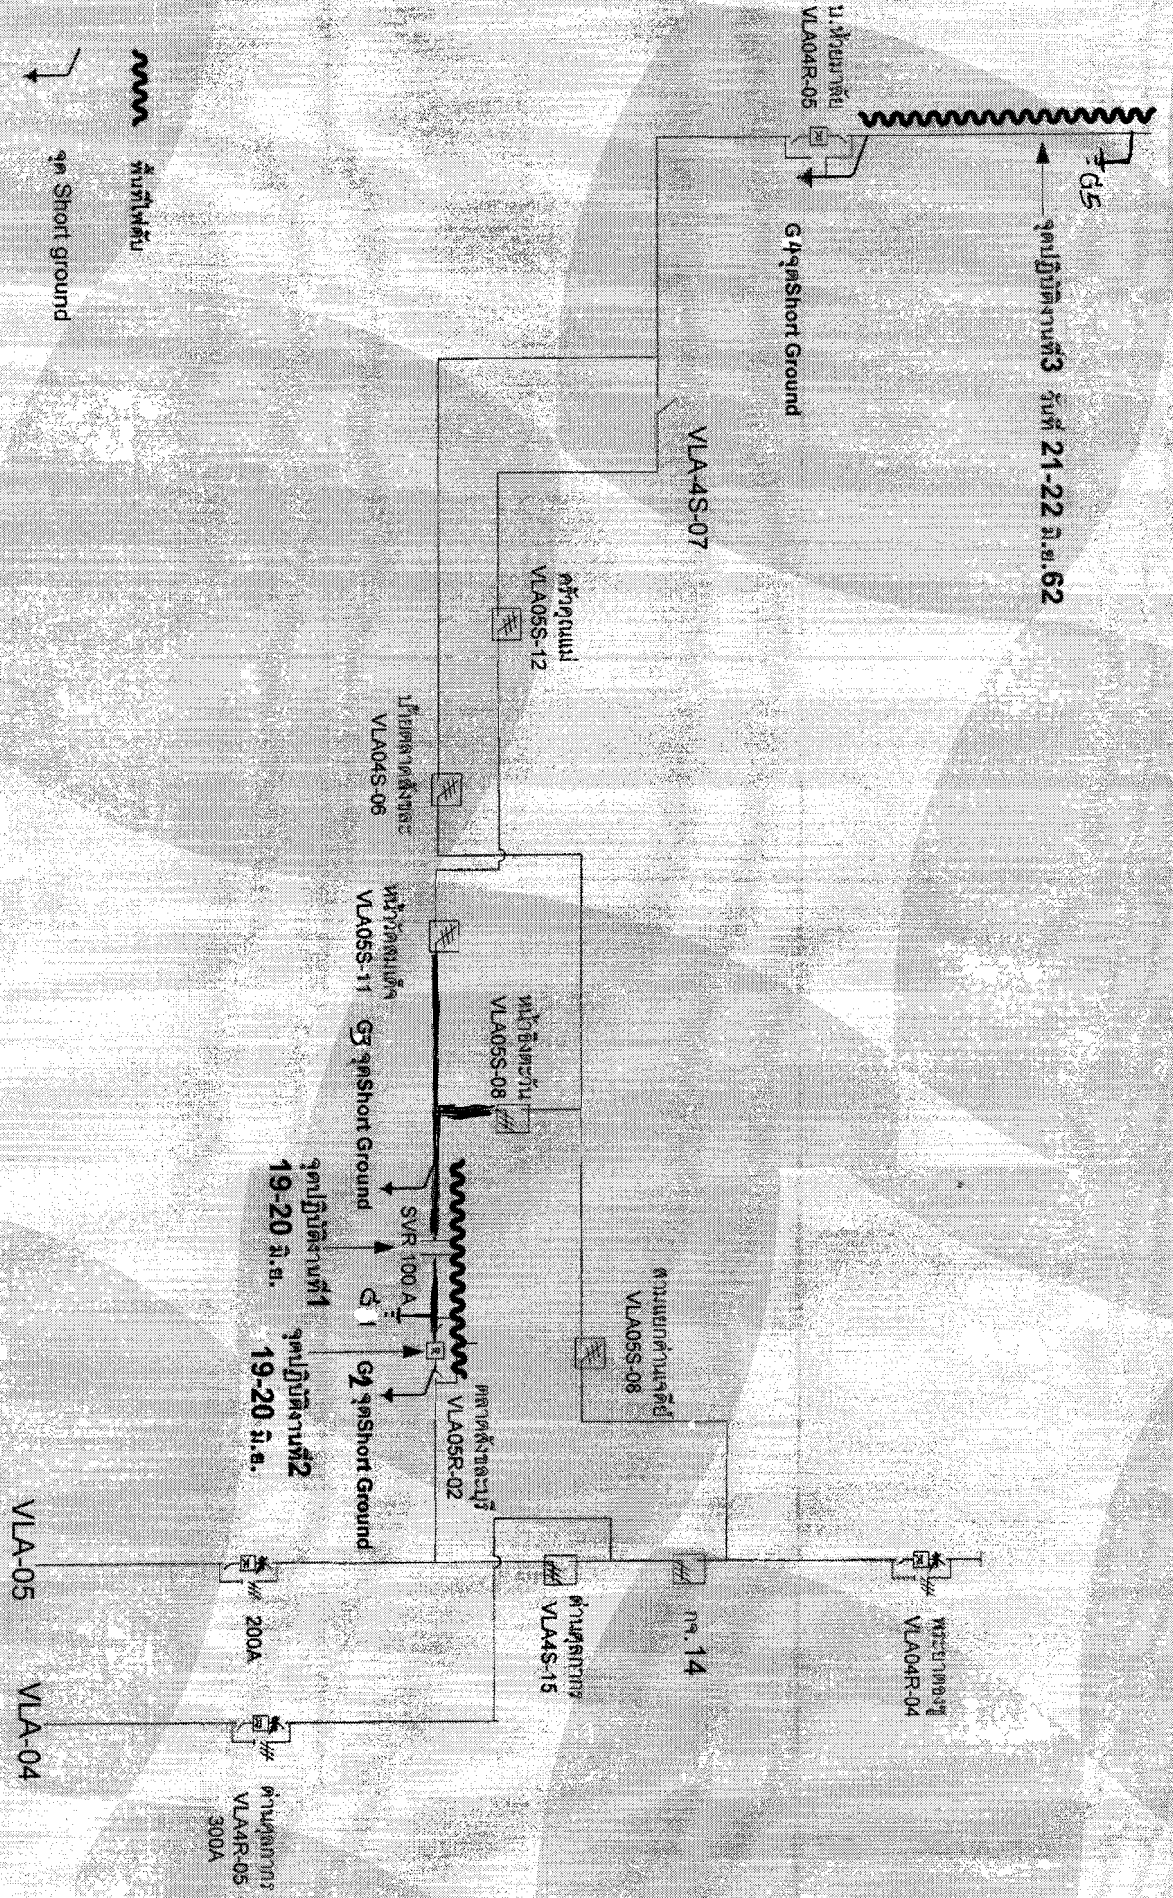

จำนวนตู้จำนวน 3 ตู้ 21-22 น.ร. 62

บ. ตู้ควบคุม
VLA04R-05

VLA-4S-07

ตู้ควบคุม
VLA05S-12

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA04S-06

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA05S-11

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA05S-08

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA05S-08

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA05R-02

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA4S-15

นร. 14

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA04R-04

VLA-05 VLA-04

200A

ตู้ควบคุมตู้เครื่อง
VLA4R-05
300A

จำนวนตู้จำนวน 1
19-20 น.ร. 61

จำนวนตู้จำนวน 2
19-20 น.ร. 62

SVR 100 A

C1
