

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP04 จาก BOP05-05 ถึง 5:50:00 น. 21 มิถุนายน 2562
ในวันที่ 15.๑.62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1042/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิมล ธีระ ประธานงานขอดับไฟกับ ผคฟ.กฟผ.๓

พรวิมล ธีระ
(รองประธานศูนย์ฯ)
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2074 /๒๕๖๒

เรียน ผจก. กฟอ.บพล.ฉก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ ดร.วิมล ธีระ ผอ. กฟอ.บพล.ฉก.ว.
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โทร. ๕๕๕๕๕๕๕๕

ดร.วิมล ธีระ
(นางสาวอรอุษา สักสังขยา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก.๓)



24 ก.ค. 2562

สำเนาเรียน สฟฟ.

๓๓๓ (๕๓๓))
ที่ห้องควบคุมการจ่ายไฟ กฟอ.บพล.ฉก.ว.
ปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ ผอ.กฟอ.
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ น. ผอ.กฟอ.
จนกว่าจะแจ้งคำสั่ง

ดร.วิมล ธีระ
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าบีม PT หลุมรั้ง - หน้ามินิมาร์ทบุญยง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ส.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	1 ส.ค. 62	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บพล.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง	ตามใบขอปฏิบัติงาน		1042/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	23 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23-07-2562	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24/7/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด วงจร BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร BOP05						
3	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
4	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
5	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
6	ดิส ชั่วคราว วงจร DTM04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS หน้ามินิมาร์ทบุญยง
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	BOP04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS บีมน้ำมันหลุมรั้ง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล. ทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
14	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
15	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP	SCADA	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
17	ผู้ยืนยันงานแล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ผู้แจ้ง.....						
18	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
19	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
20	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
22	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ผู้แจ้ง.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BOP04S-05	ปลด	สับ		บพล.		DIS ป้อนน้ำมันหลุมรั้ง
24	ดิส ชั่วคราว วงจร DTM04	ปลด	สับ		บพล.		DIS หน้ามินิมาร์ทบุญยง
25	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
26	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
27	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP	SCADA	- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

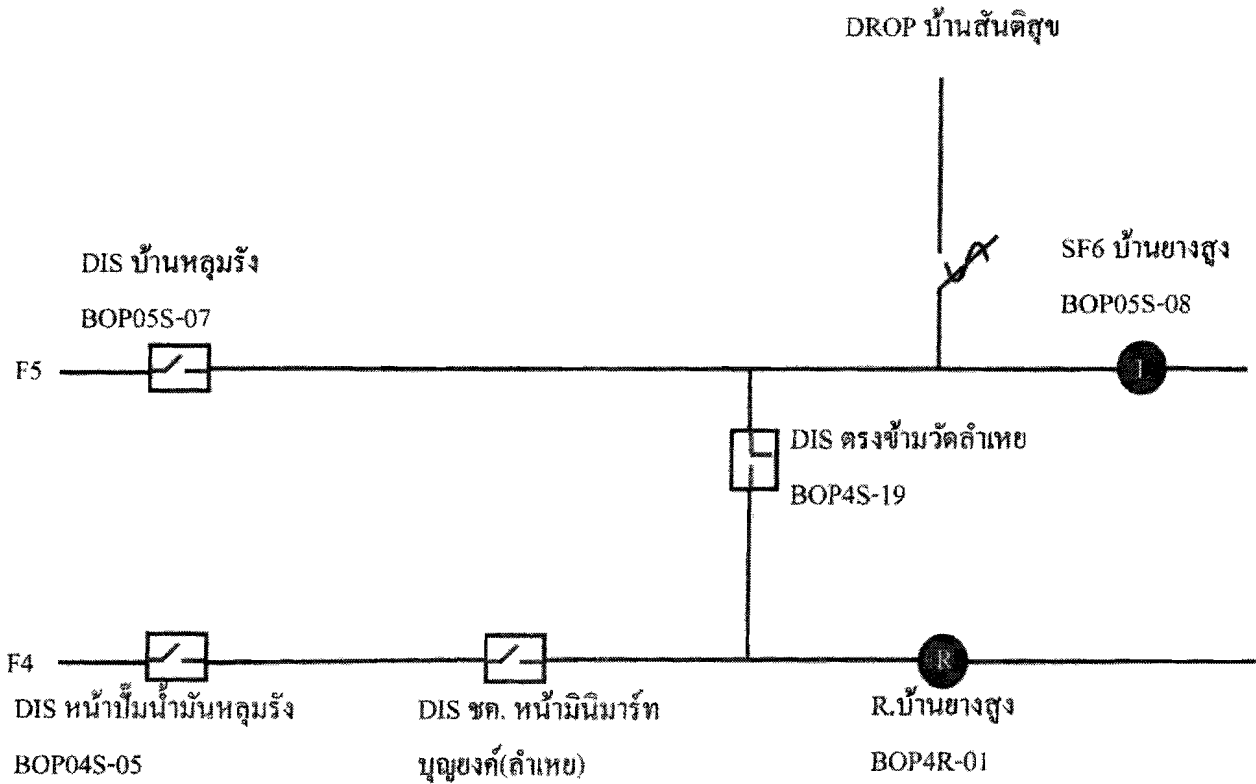

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

