



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๐๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ. (ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	ชื่อ เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๔ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑.๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS หน้าป้อม PT ทุลมรั้ง BOP๐๔S- ๐๕	DIS ชค. หน้ามินิ มาร์ทบุญ บงค์	นายกิจจา อินทสาสดี ขพ.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งสงครวม ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๙๕-๒๕๓๑๙๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสาสดี ตำแหน่ง ขพ.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.บพล.

๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ/ ฟีดเตอร์ BOPSS จาก BOPSS-05 ถึง 05 ธันวาคม 2562
ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 1116

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ/ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ/ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ/ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ/ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุสิน ธีระ ประสานงานขอดับไฟกับ 2024158 กฟผ.ปบ

15 ธ.ค. 62

ภาณุสิน ธีระ
(นาย ภาณุสิน ธีระ)
ว.ค.ท.ท. 2024158

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. 2148
อก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

อ.ก. 2562
(นางสาวอรุษา - คัดดีพัฒนา)
ร.ค.ผ.ค.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าบ่ยม PT หลุมรัง - หน้ามินิมาร์ทบุญยง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ส.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	14 ส.ค. 62	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บพล.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1116/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	1 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ส.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด วงจร BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร BOP05						
3	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
4	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
5	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
6	ดีส ชั่วคราว วงจร BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS หน้ามินิมาร์ทบุญยง
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	BOP04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS บ่มน้ำมันหลุมรัง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล. ทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
14	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
15	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP	SCADA	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกจุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
17	ผู้ยืนยันงานแล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ผู้แจ้ง.....						
18	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
19	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
20	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
22	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ผู้แจ้ง.....						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BOP04S-05	ปลด	สับ		บพล.		DIS ป้อนน้ำมันหลุมรั้ง
24	ดีส ชั่วคราว วงจร DTM04	ปลด	สับ		บพล.		DIS หน้ามินิมาร์ทบุญยง
25	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
26	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
27	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP	SCADA	- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

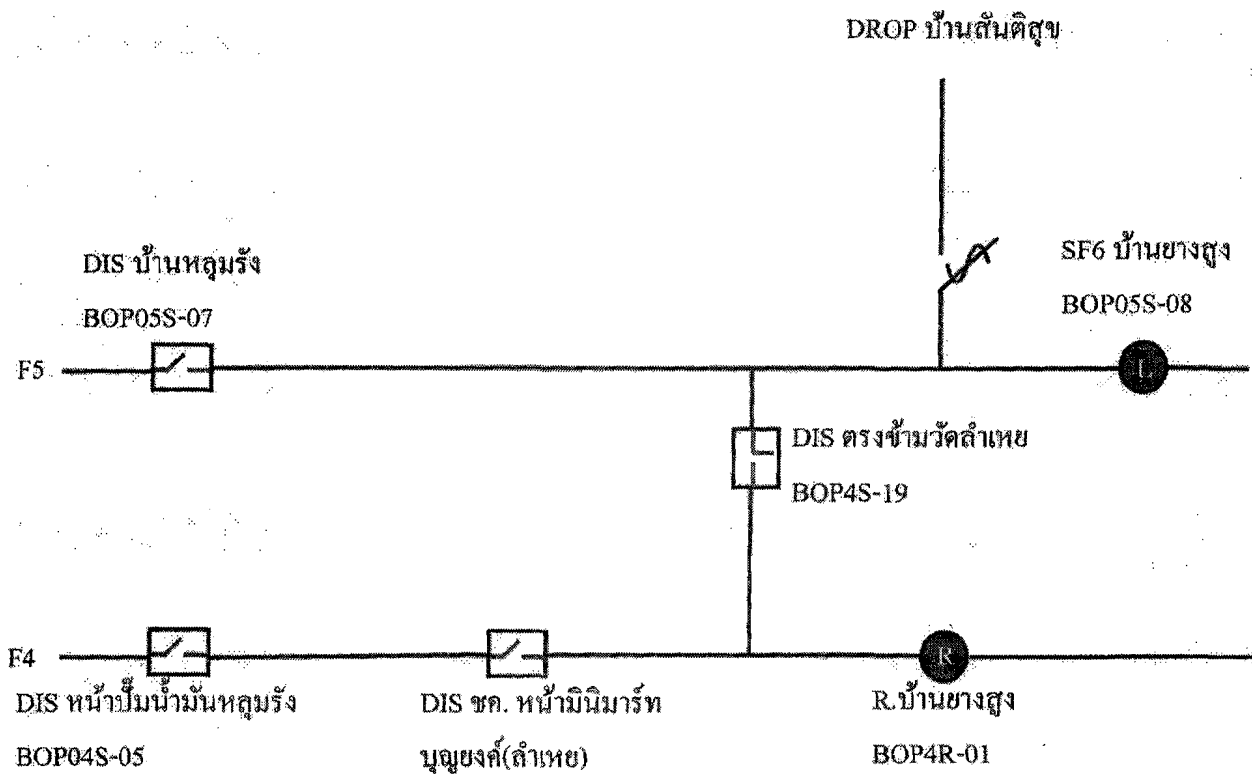

๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

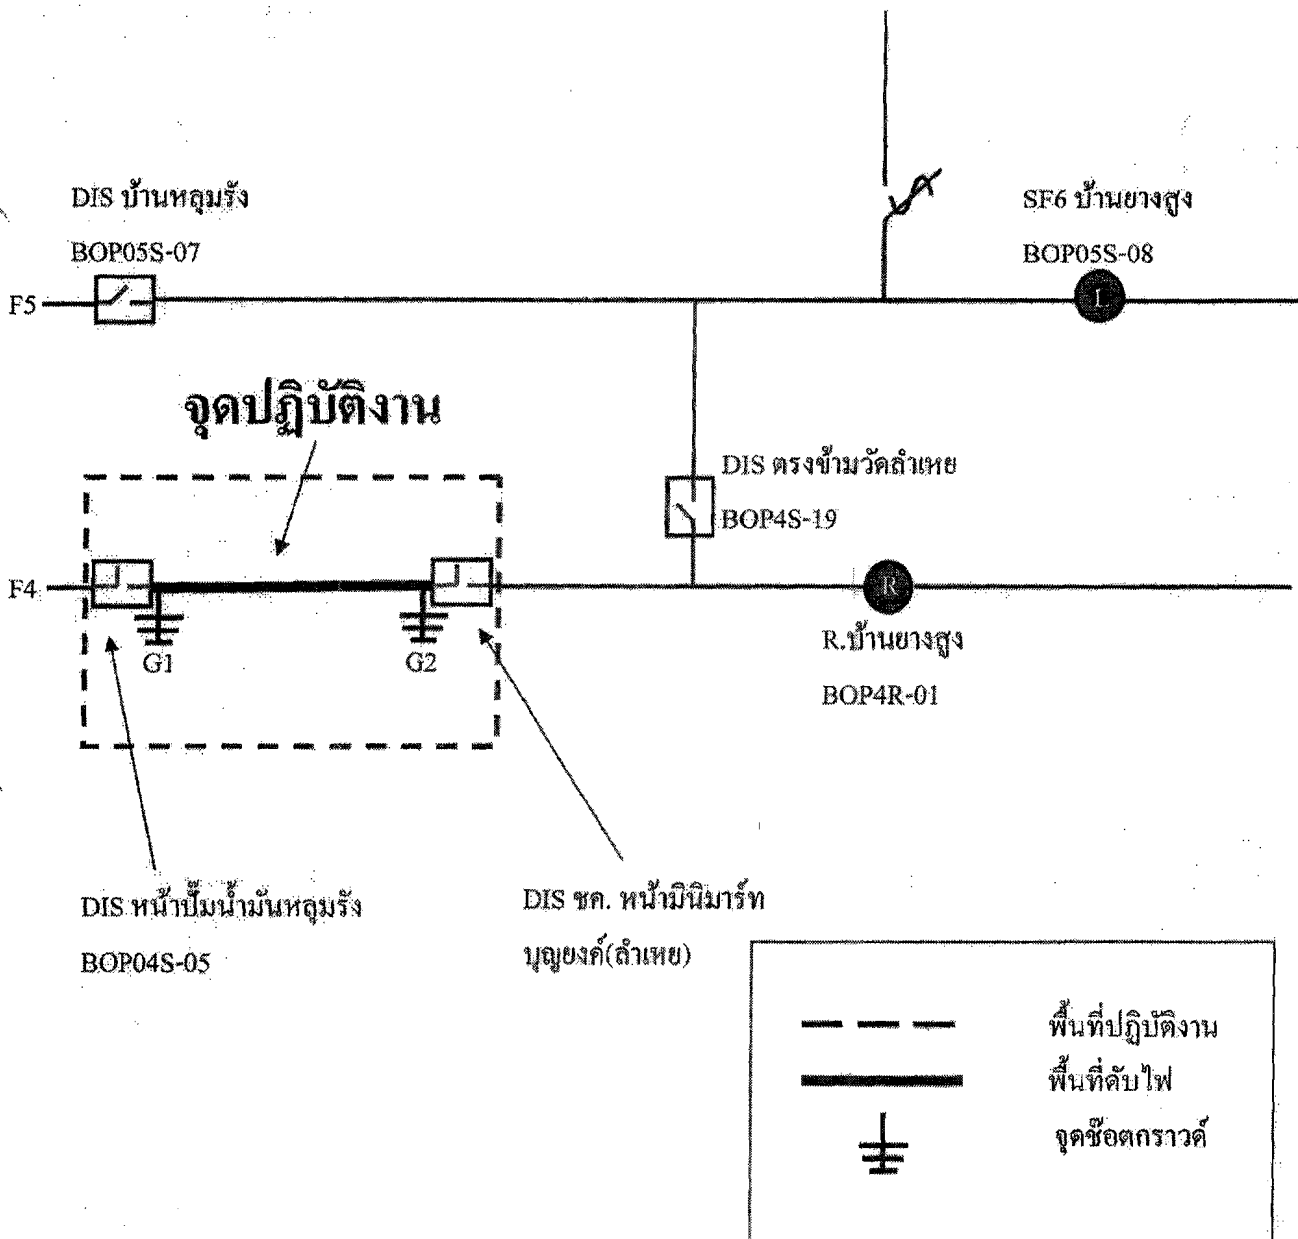

(Handwritten signature)
