

ตั้งแล้ว
Obs/พณ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงศ์พิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยาว

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี รวมผลบังคับใช้แบบ จำนวน ๔ แบบ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	29/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๖๓๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7.8 สท.	30/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ๒	SPA07S-06	โทร.๐๘๖-๓๓๘๖๓๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	31/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-09 DDE สถานีอ่างทอง๒	DDE ปีมะลิ	โทร.๐๘๖-๓๓๘๖๓๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7.9 สท.	2/11/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDE ชุมชน บ้านจามบุรี	SPA07S-08	โทร.๐๘๖-๓๓๘๖๓๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงศ.(สช.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๙๕๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศ.สร.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยาว)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.การแทน
ผจก.พ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศ.พ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ผศ.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 3 พิดเตอร์ SPA๗ จาก DDE สถานีอ่างทอง๒ ถึง DDE ปีมะลิ

ในวันที่ 31 ๓.๑. 62 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 16.50 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1486/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย หลดรินทร์ ตั้งสนาวิน ประธานงานการขอตัดไฟกับ จอ อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(Signature)
(นายหลดรินทร์ ตั้งสนาวิน)
๐๘๖.5 ๓๓๘ ๖๓๕๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ 2963

ที่ ก.๓ กบ.(คท.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓.คท. กฟภ.๒.ปม.

อ.ก.บ.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
(นายอภิรักษ์ วงศ์พิชิต)

อ.ก.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี บริเวณสะพานเลียงเมือง (SPA07) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 08.10 น. ถึง 16.50 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.สพ. | งานที่ทำ | ก่อสร้างสายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1486 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวคิน | | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 25 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA	-	
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	
5	BAM01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM	-	
6	BAM07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM	-	
7	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM01						
8	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SF6	SM การเดินท์
9	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	วัดโพธิ์ค้อย
10	SPA07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	สะพานเลียงเมืองขนส่ง
11	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	วัดโพธิ์ค้อย
12	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.10 น.						
13	-แจ้ง Hotline ดำเนินการตัด DDE บริเวณสะพานเลียงเมืองได้ (ช่วงตัด DDE ไม่มีโหลด)						
14	-เมื่อ Hotline ดำเนินการตัด DDE บริเวณสะพานเลียงเมืองแล้วเสร็จ						
15	-แจ้ง Hotline ดำเนินการตัด DDE บริเวณบัสเซลล์ได้ (ช่วงตัด DDE ไม่มีโหลด)						
16	-เมื่อ Hotline ดำเนินการตัด DDE บริเวณบัสเซลล์แล้วเสร็จ						
17	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
20	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
21	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
22	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA	-	
23	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	
24	BAM01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM	-	
25	BAM07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ <i>กรณี SPA07 Dis. สหภาพละมอพรวิ ได้ มีดวงอาทิตย์ 3 เฟส 10 นาที</i>							
27	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1							
28	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2							
29	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
30	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-	
31	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	
32	BAM01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		-	
33	BAM07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		-	
34	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	-แจ้ง Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณสะพานเลี้ยงเมืองได้							
36	-เมื่อ Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณสะพานเลี้ยงเมืองแล้วเสร็จ							
37	-แจ้ง Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณบ่้มเซลล์ได้							
38	-เมื่อ Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณบ่้มเซลล์แล้วเสร็จ							
39	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01							
40	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์คอย
41	SPA07S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS	สะพานเลี้ยงเมืองขนส่ง
42	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์คอย
43	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
44	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
45	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-	
46	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	
47	BAM01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		-	
48	BAM07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทล.บ.บ.กฟ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ป.บ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟ.สพ./รจก.กฟ.สพ.

ถึง ผจก.กฟ.สพ.


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟทั่วบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๙- DDE บีมเซลล์... เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ...๗... สถานี...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๙- DDE บีมเซลล์

กฟ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๙๙๖๖๙๙๙...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง...ชม.กส.กฟ.สพ. เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๓๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบผังซึ่งเกี่วกัน

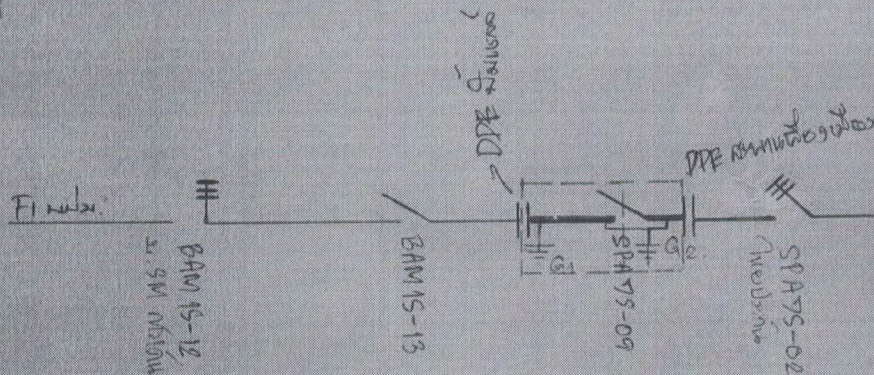

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดเรียบร้อย Hot Line สพ.ตัดเตดกลางSPAN บีมเซลล์ และตัดสะพานไฟ๑๕๐
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช็อคกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขช็อคกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(Handwritten signature)

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ดิยากร)

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา รจก.(ท) รักษาการแทน
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐ ผจก.กฟ.สพ.

(Handwritten signature)
(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พช.๗ ผ.บ.กฟ.สพ.
