



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๑๕๖๗ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสานิตย์ เจริญศิริ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA5Y	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DE. ตรงข้าม ที่ดิน นช.	NCA5YS-04 NCA5YS-05 SAC NCA4YS-04	นายอนันต์ หนูอินทร์ โทร.๐๘๑-๙๙๑๙๘๘๑๔
๒.	NCA5	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA5S-10	NCA5S-11 NCA5S-05	
๓.	NCA6	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA6S-10	NCA6S-11 NCA8S-08 NCA6S-12 NCA6S-14 NCA6S-15	
๔.	NCA10	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA10S-02	NCA6S-03 NCA10S-03 NCA10S-09 NCA4S-05 NCA10S-10 NCA10S-11	
๕.	NCA1	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		NCA1S-07 NCA1S-08 NCA1S-09 NCA1S-10 NCA1S-11 NCA1S-12 NCA1S-24	
๖.	NCA12	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA12S-04	NCA12S-05 NCA12S-06 NCA12S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนบรมราชชนนี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวขำ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสานิตย์ เจริญศิริ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน


ชื่องาน	ปรับปรุงใต้ไลน์๑๑๕เควี ถนนบรม		
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	ปรับปรุงใต้ไลน์๑๑๕เควี ถนนบรม		
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน	๓๐ มิ.ย. ๖๒	เริ่มเวลา	๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี		
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	ชื่อ นายสมเกียรติ อ.สงวน ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี		
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	๐๙๓-๔๙๗๙๕๔๕	ชื่อเรียกขานทางวิทยุ	U-๒
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก	นายอนันต์ หนูอินทร์		
ตำแหน่ง	ชม.กส.กฟอ.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๙๑๙๘๑๔ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ -		
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว	กฟอ.นครชัยศรี , ผู้รับเหมา		
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า	นายชลิต สีขาวชา ชม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)		
๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑	ร้านต้นข้	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๒	ปากทาง ม.กฤษดา	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๓-๔	ปากทางสาย๘	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๕	-หน้าพื้นที่ฝั่ง	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๖-๗	ตรงข้ามที่ดิน นช	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๘	-ร้านเนื้อสาย๘	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
จุดที่ ๙	ตรงข้ามร้านเนื้อสาย๘	ผู้รับผิดชอบ	นายมนตรี มีสวางษ์
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่	ก.๓ นช.(ปบ)	/๒๕๖๒	พร้อมแผนผัง Switching
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นางสาวปัทมา หงษ์สินี		
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ..... วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง		
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรมีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น ๑ วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) , ผบ. , ผกส.จป. กฟอ.นช.ผู้รับเหมาเอกชน		
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๒		

C๓ Safety CAP ๐๑


หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

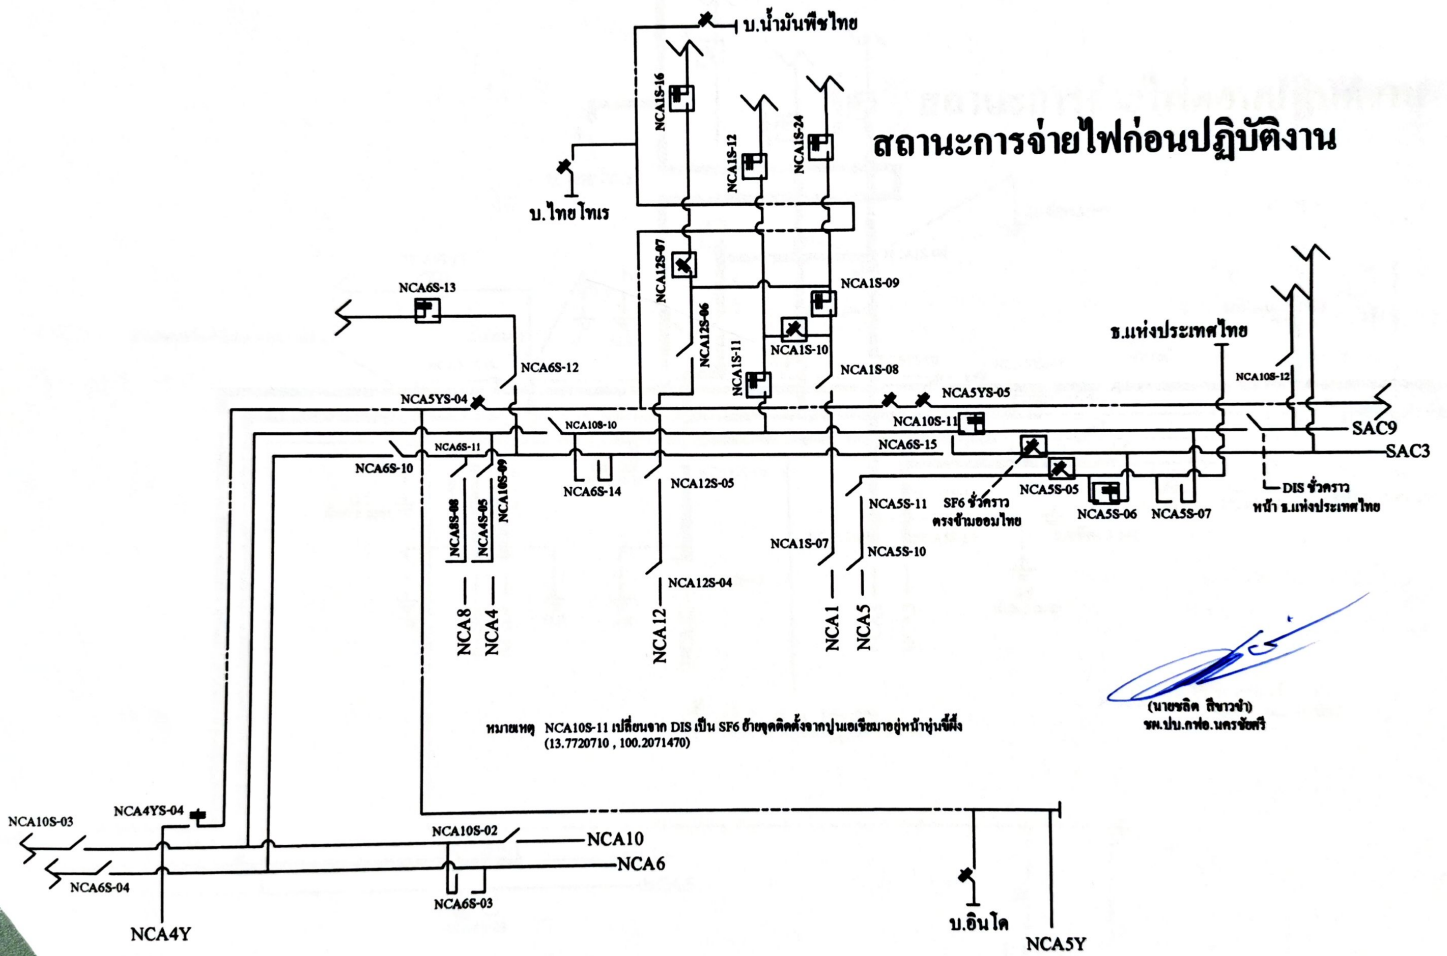

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

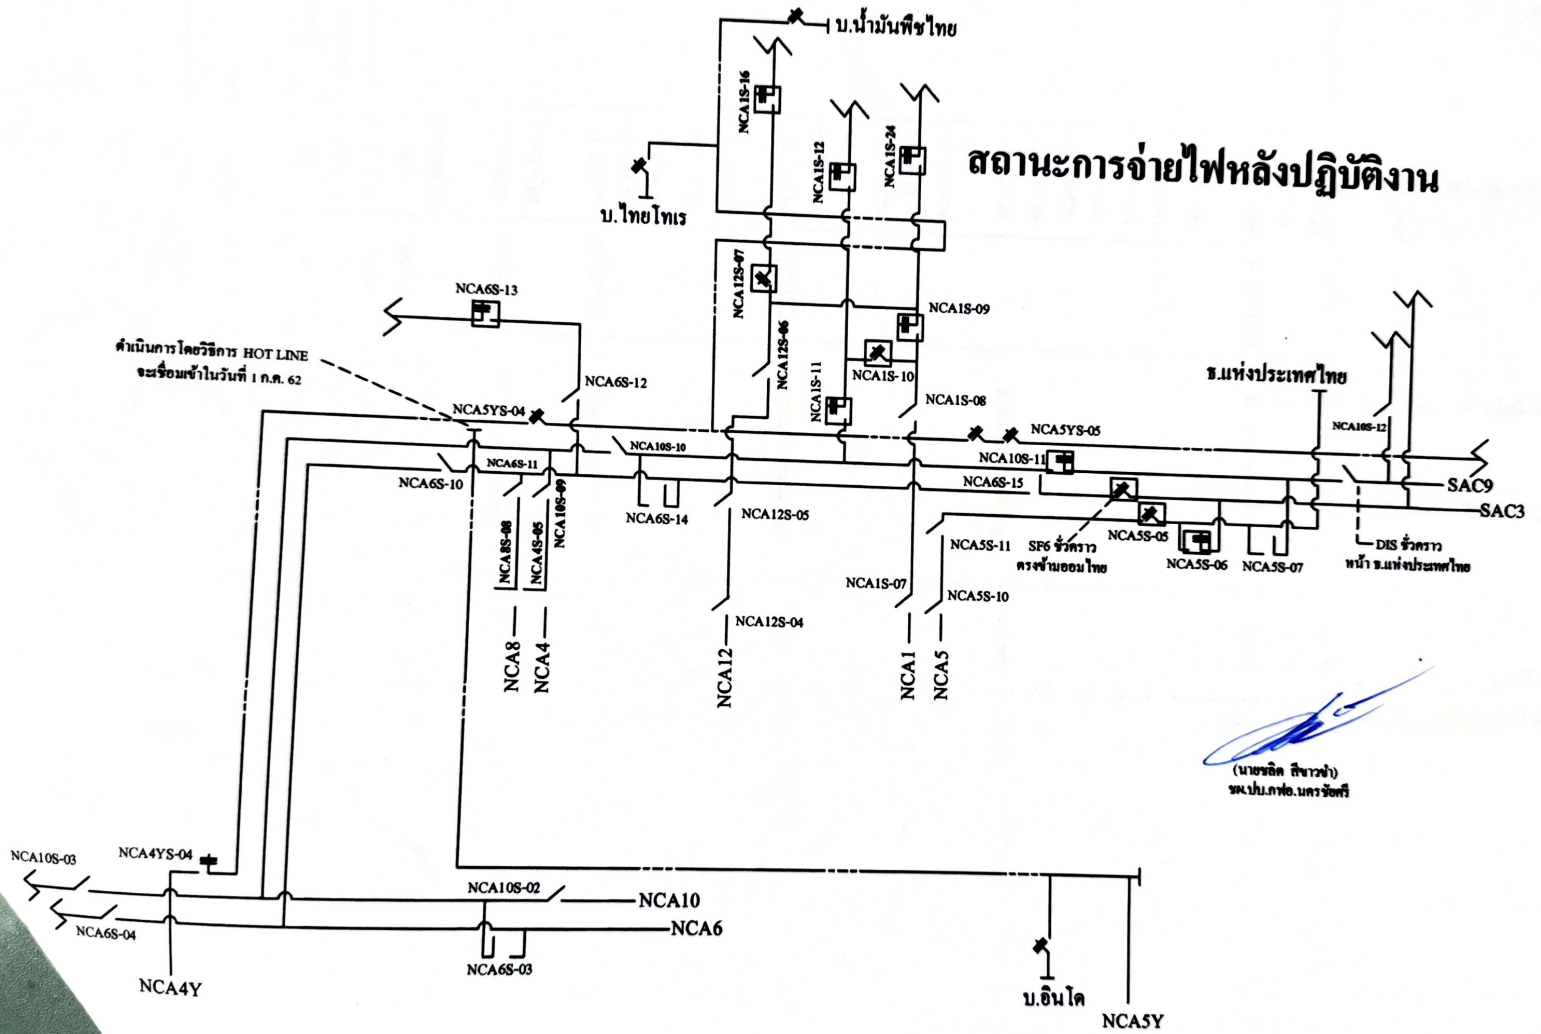

(นายชิต สีงามคำ)
ร.บ.กฟผ. นครราชสีมา
