



# วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)-๒๒๒๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อภ.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๓๑ ก.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบ สายส่ง ๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS ชด.ช้าง ปืมน้ำมัน หนองรี	SF๖ หนองไม้ เอี้ย BOP๐๔S- ๑๒	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชผ.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๔๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พชง.๑ (สข) โทร.๐๘๘-๒๑๓๒๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร.๐๔๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
(.....รจก.(ก.)ปฏิบัติงานแทน.....)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ BOP04 จาก Dis รั่วลงใบหม้อต้มเบอร์ ถึง BOP 45-12  
 ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1030/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิพงษ์ วัฒนะ ประสานงานขอดับไฟกับ นาย และ พลต.หญิง

ผด.ร.ท. อดิสรมาณี  
 ( อดิสรมาณี )

สำหรับผู้อนุมัติ

2057

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.อ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และ ผจก.ป.ที่ ๑๓ ทรงสอบความปลอดภัย  
 ของระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดัน ๒๒๕ กิโลโวลต์ พ.พ. ๒๐๒๒

  
 (นายเอกชัย ทังสุวรรณ)  
 ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 2 แผ่น



สำเนาเรียน สฟฟ.

ผคฟ. (สภ.ฯ)  
 เพื่อทราบ และติดต่อพนักงานปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

ขอตรวจดู ตั้งแต่เวลา ... น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน

  
 ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ดิสชั่วคราวข้างปั้มน้ำมันหนองรี-หนองไม้เอื้อย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31-ก.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1030/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing+Alt		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing+Alt		บพล.	SCADA	R บ.ยางสูง
4	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนรับไฟจาก BOP05						
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
6	BOP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS ข้างปั้มน้ำมันหนองรี
9	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บพล.ทราบ						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
12	BOP05R-03	Nonreclosing+Alt	Normal		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
13	BOP04R-01	Nonreclosing+Alt	Normal		บพล.	SCADA	R บ.ยางสูง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing+Alt		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
16	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing+Alt		บพล.	SCADA	R บ.ยางสูง
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		หปร.		DIS ข้างปั้มน้ำมันหนองรี
20	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก BOP05						
21	BOP04S-12	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
22	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
23	BOP05R-03	Nonreclosing+Alt	Normal		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BOP04R-01	Nonreclosing+Alt	Normal		บพล.	SCADA	R บ.ยางสูง
สิ้นสุด Switching							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

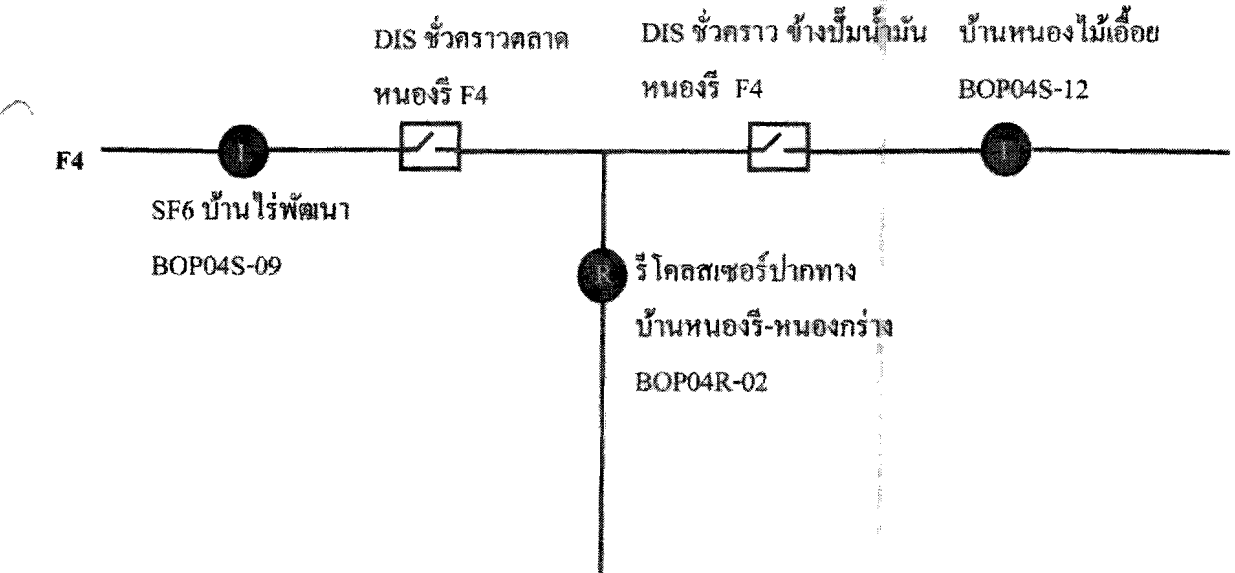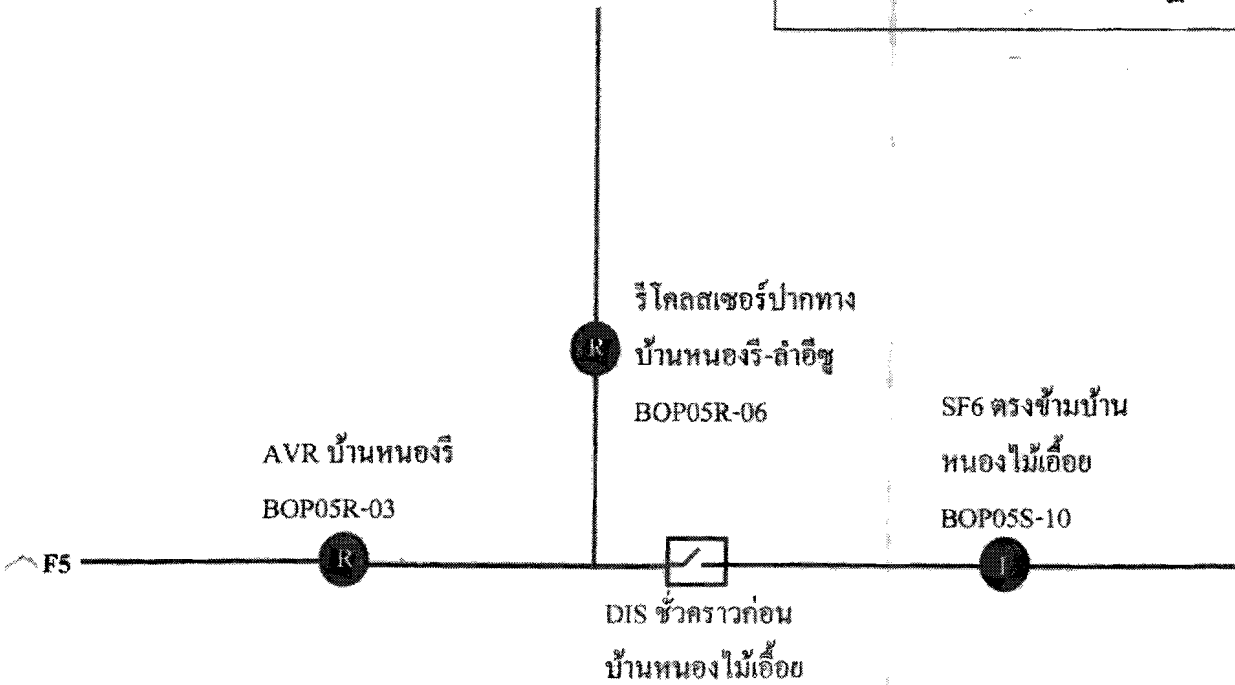

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

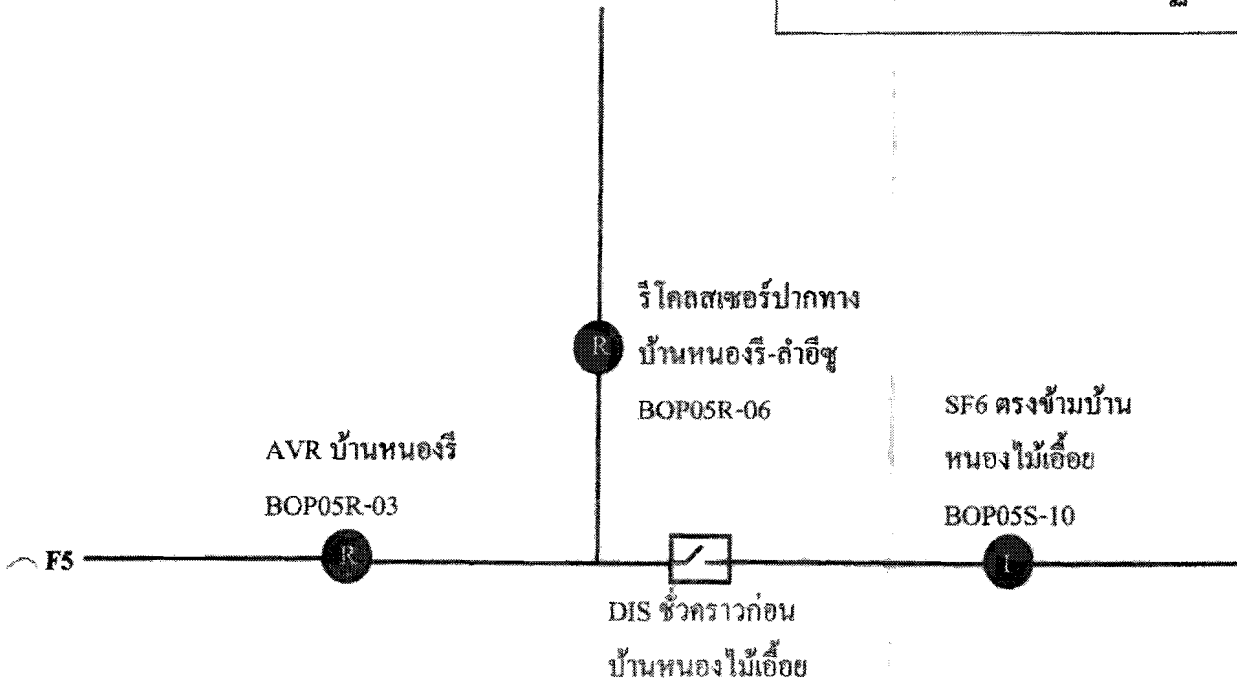

จุดที่ปฏิบัติงาน

