

9



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA Public Electricity Authority

เลขที่ กสท ๓๗๖๓

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ สนธิปัญญาน

ตำแหน่ง ผอ.ก.๑๕.๑๗

ส่งแล้ว
[Signature]

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขอุปกรณ์แรงดันบริเวณหลังวัดโคกสเชอร์ห้วยเกาะ สถานีไฟฟ้าชุมชนบุรี
...ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สท	28/07/62	09.00	15.00	แก้ไขอุปกรณ์ในไลน์แรงสูง หน้าโรงงานไทยเจนเนอร์รี่	Dis ชื่อพวก ที่โรงงาน ไทยเจน	SP4825-07 ประปา	โทร ๐๘๙๐๐๐๗๕๕๓ นายอภิพงษ์ เอี่ยมสกุล

Dis รัตนบุรี 11 ต.สามัคคี อ.รัตนบุรี
SP4825-07

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พว.๑ (สช.) โทร ๐๘๙๐๐๐๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดุง ทรุด(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง)
ตำแหน่ง ผอ.ก.๑๕.๑๗

สำเนาแผนควบคุมการจ่ายไฟ (แนบ) กสท.๓
เวียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ขอแจ้งให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พีดเตอร์ SP4825-07 จาก Dis ต.รัตนบุรี ถึง SP4825-07 25/2/62
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1034 SP4825-07 รัตนบุรี 11 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเองที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ สนธิปัญญาน ประธานแผนการขอตัดไฟกับ รศ. อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

วิฑูรย์ สนธิปัญญาน
[Signature]

ส่งรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กป.บ.(ก.๓) 2052
เวียน ผอ.ก.๑๕.๑๗
ขอ ก.๑๕.๑๗/อก.๑๖ (ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการวิจัย / แผน
แผนผังแนบ / แผน
ผอ.ก.๑๕.๑๗
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

22 ก.ค. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติประจำแทน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ก.ค. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟฉ.สพ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวสิน | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1034 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | [Signature] | | วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | [Signature] | | วันที่ 23 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | 2. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	ตรวจสอบ SF6 รหัส SPA2S-05 ฐานพอเพียง อยู่สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
3	ตรวจสอบ SF6 รหัส SPA2S-20 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา อยู่สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
4	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
5	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
6	-ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA04						
7	SPA02S-20	ปลด	ล๊อค		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
8	SPA02S-21	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ฐานคาร์แคร์สะพานลอย
9	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
10	Dis ชั่วคราว SPA02	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดโพธิ์เจริญ(รง.ไทยเอนฯ)
11	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
15	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
16	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
17	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
18	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
19	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
20	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
24	Dis ชั่วคราว SPA02	ปลด	ล๊อค		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดโพธิ์เจริญ(รง.ไทยเอนฯ)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	-ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน กลับคืนจาก SPA04						
26	SPA02S-21	ปลด	สับ		สพ.		DIS รั้วนครินทร์สะพานลอย
27	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
28	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA R	หัวเกาะ
29	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง ผอ.กฟอ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.๒๒๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผอ.กฟอ.สพ./รช.สทอ.สพ.

ด้วยในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กฟอ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้าโรงงานไทยเอสเอชอี-เทศบาลโพธิ์พระยา เพื่อแก้ไขปัญหาการแผ่รังสีสูงที่วัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ต.ล.๓ สถานี สุพรรณบุรี ตั้งตำบลโพธิ์ หน้าโรงงานไทยเอสเอชอี-เทศบาลโพธิ์พระยา

ทั้งนี้ กฟอ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพร เบื้องศิลป์ ตำแหน่ง ผอ.กฟอ.สพ.เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ ๐๙๐-๐๙๐๖๖๖๖๖ เป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้ นายธนัท มาลัยวงศ์ ตำแหน่ง ชล.ร.๒ กฟอ.สพ.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๖-๐๙๐๖๖๖๖๖ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

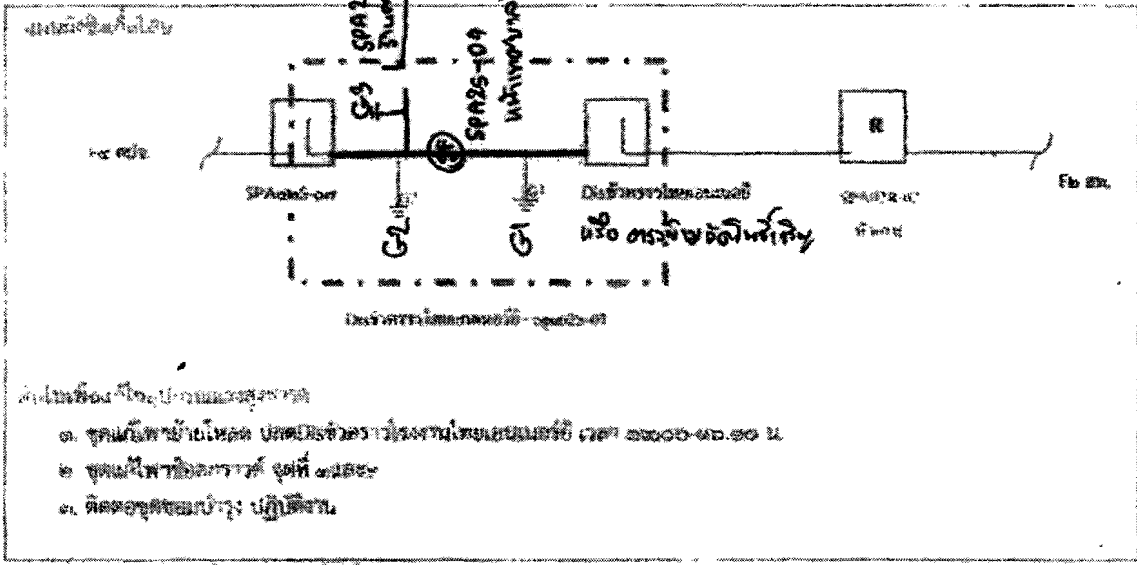

- ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
๑. จุดติดตั้งป้ายบอกเขต เขตเมืองชั่วคราว หน้าโรงงานไทยเอสเอชอี เวลา ๒๐๐๐-๒๑.๐๐ น.
 ๒. จุดติดตั้งป้ายบอกการวัด จุดที่ ๑ และ ๒
 ๓. ติดตั้งชุดขมบ่าสูง ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดขออนุมัติให้ทราบด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณบรรณสิทธิ์)
พว.๒(สท.) ผอ.กฟอ.สพ.
