



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ท.ค. ๗๖๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา

ชื่อผู้ส่ง นายมนัส ไทศวลย์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทอ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	-ส/ป เสาชำรุด -แก๊งเสาเออนเอียง	-VLA ๐๕S-1/6 ป้องตำวง สนมแยกค่านงคีย์ -VLA๕S-๑๗ แยกค่านงคีย์สามองค้	สุระระบบจำหน่าย พระยาทองชู	นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๙๙-๒๐๙๙๗๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบ ม.๘, ม.๙ ๒.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และพระยาทองชู รวมจำนวน ๖๖๑.๖๖๑ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย รื่นประเสริฐ ตำแหน่ง ท.บ.ก.ป.ท.ท. โทร ๐๙๙-๕๕๗-๒๗๗๕ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยแคว้นำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีเคเบิลโยแคว้นำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีเคเบิลโยแคว้นำแสง

ลงชื่อ
(นายมนัส ไทศวลย์)

ตำแหน่ง ท.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทอ.ทองผาภูมิ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ PS จาก VLA ๐๕S-1/6 ป้องตำวง สนมแยกค่านงคีย์ ถึง ๑๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1038
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ นาย ประธานกรรมการดับไฟกับ กฟล. กฟส.ทอ. รื่นประเสริฐ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2328

เรียน ผจก. กฟล. ท.บ.ท.ท. กฟล. สว.

อ.ก.ร.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย ทิ้งสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

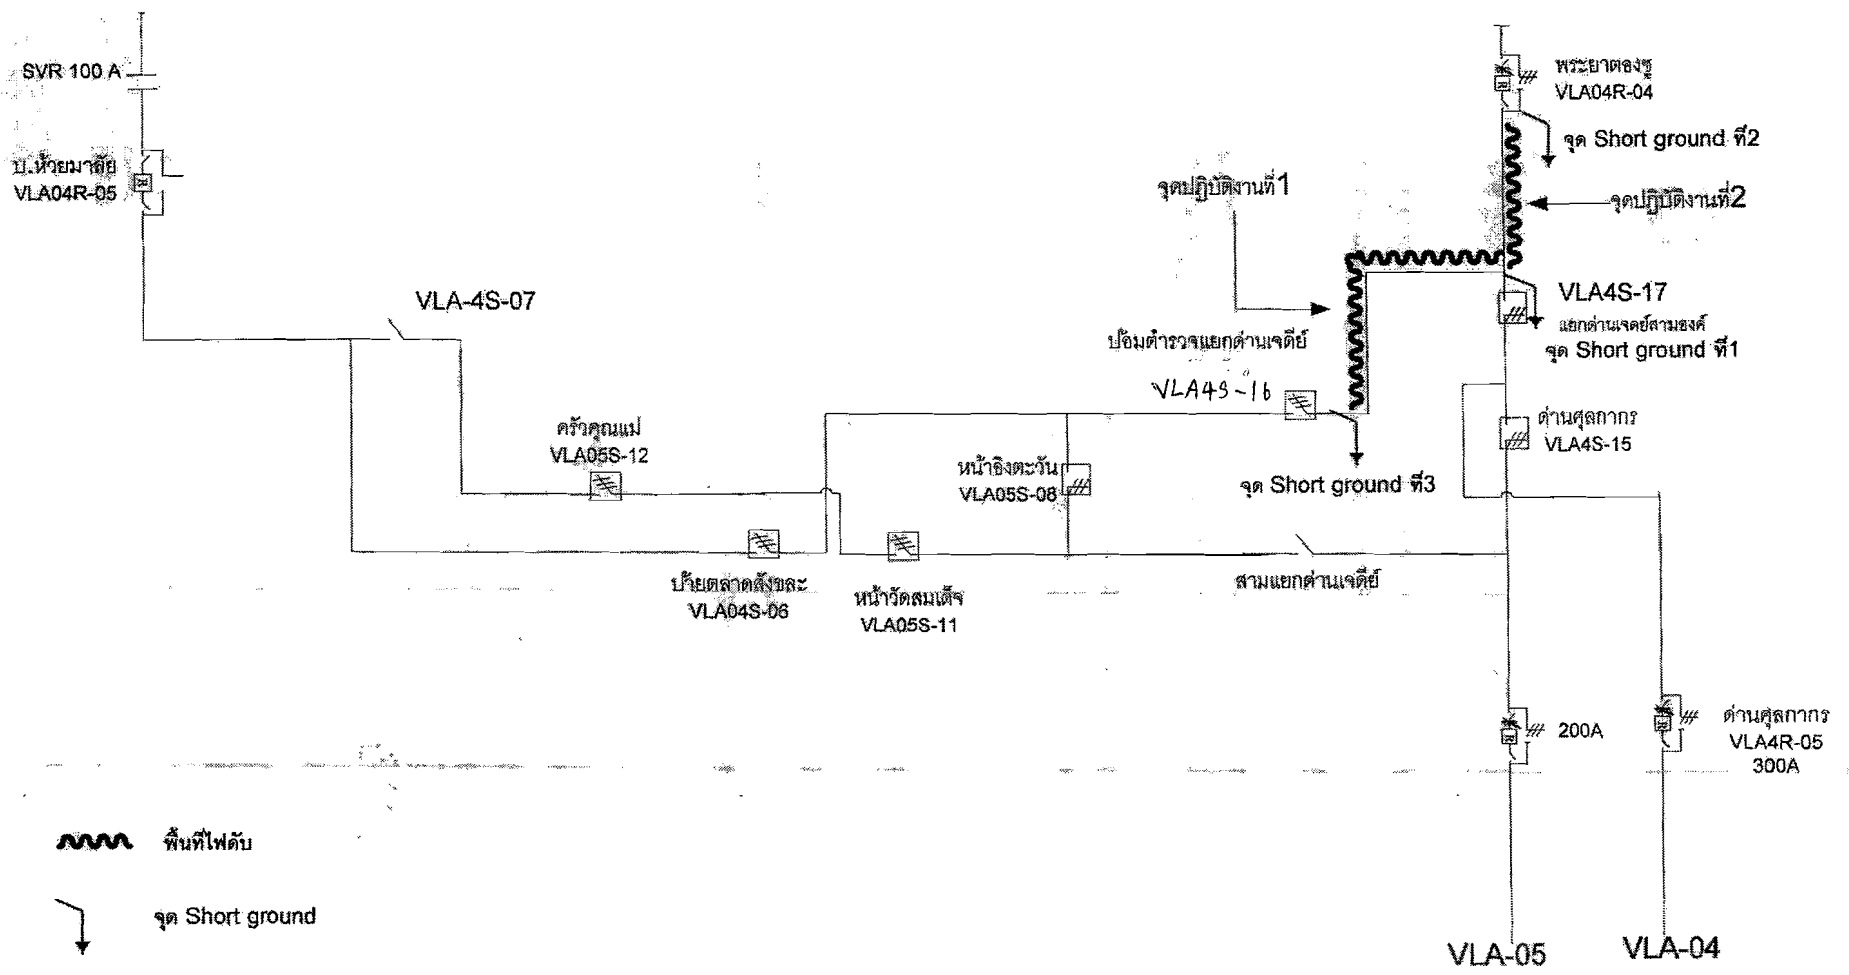
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VLA4S-16 ,VLA4S-17 - ชุดระบบจำหน่ายพระยาตองชู				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทภ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1038/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	17 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	แจ้ง กฟส.ทภ.ตรวจสอบ SF6 VLA05S-10 , SF6 VLA05S-08 ให้อยู่สถานะ OPEN ล็อคคาน						
2	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
3	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
4	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
5	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
6	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA05						
7	VLA05S-08	ปลด	ล๊اب		ทภ.		SF6 หน้าอิงตะวัน
8	VLA04-16	ล๊اب	ปลด,ล็อคคาน		ทภ.		SF6 ป้อม ตร.แยกด้านเจดีย์ 3 องค์
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
10	VLA04-17	ล๊اب	ปลด,ล็อคคาน		ทภ.		SF6 แยกด้านเจดีย์ 3 องค์
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
14	แจ้ง กฟส.ทภ.ปฏิบัติงานได้						
15	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
16	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
17	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
18	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
19	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
20	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
21	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลกากร
22	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
23	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	SCADA	R ด้านตุลกากร
24	เมื่อชุด กฟส.ทภ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	VLA04-17	ปลด	สับ		ทภ.		SF6	แยกด้านเจดีย์ 3 องค์
29	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05							
30	VLA04-16	ปลด	สับ		ทภ.		SF6	ป้อม ตร.แยกด้านเจดีย์ 3 องค์
31	VLA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6	หน้าอิงตวัน
32	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R	ด้านตุลกากร
33	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	SCADA	R	ด้านตุลกากร
34	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R	ตรงข้ามด้านตุลกากร
35	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	SCADA	R	ตรงข้ามด้านตุลกากร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังระดับไฟเชื่อมระบบจำหน่าย 22 เควี ตามแยกด้านเจดีย์สามองค์ กฟอ.สขบ. วันที่ 28 สิงหาคม 2562



Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานซ่อมแซมระบบจำหน่ายบริเวณสามแยกด้านเจดีย์สามองค์.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....บริเวณแยกด้านเจดีย์สามองค์.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผกป.กฟส.ทก.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขได้ทุกได้) ชื่อ.....นายสมชาย รื่นประเสริฐ.....
ตำแหน่ง..... ผกป.กฟส.ทก..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๕๔๗๒๗๙๕.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร.....
ตำแหน่ง..... พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓๐๒๘๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อนายสมชาย รื่นประเสริฐ.....ตำแหน่ง..... ผ.ท.กฟส.ทก...เบอร์โทรศัพท์..... ๐๘๙-๕๔๗๒๗๙๕.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้ากฟย.สังขละบุรี.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... หลัง VLA๔S-๑๗..... ผู้รับผิดชอบ.....นายสุราษฎร์ มีเดช.....
จุดที่๒ หลัง VLA๔S-๐๘..... ผู้รับผิดชอบ..... นายธีรยุทธ สังข์ทอง.....
จุดที่๓..... ก่อน VLA๔R-๐๘..... ผู้รับผิดชอบ..... นายสุราษฎร์ มีเดช.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ความบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน.....๒๕๐.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....จัดประชุมหน้างาน.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....Safety talk หน้างาน.....
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ
เลขที่ ก.๓ ทภ.- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง

เรียน ผจก./หน.กป.กฟส.ทองผาภูมิ
ตามแผนบำรุงรักษาระบบจำหน่าย Patrol man ได้พบจุดเสี่ยง ๒ จุด บริเวณสามแยกตำบลเจดีย์สามองค์เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑.เปลี่ยนเสาขั้วรถบริเวณหลัง VLA๕S-๑๗ แยกตำบลเจดีย์สามองค์.....
๒.แก้ไขเสาเอนเอียงบริเวณตรงข้าม PTT สามแยกตำบล.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒.....

ตั้งแต่ เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๐๐.....น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน

กำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้
ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

- ดำเนินการ
๑. แจ้งศูนย์จ่ายไฟฟ้าแผนสวิทซ์
 ๒. ชีตกราวด์จุดที่ ๑ หลัง VLA๕S-๑๗ แยกตำบลเจดีย์สามองค์
 ๓. ชีตกราวด์จุดที่ ๒ ก่อน VLA๕S สามแยกตำบลเจดีย์
 ๔. ชีตกราวด์จุดที่ ๔ ก่อน VLA๕R-๐๔พระยาต้องชู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(...นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร...)

พชง.๕ ผจก.กฟส.ทภ.

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมนัส ไพศาลย์)

ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทภ.

16 ส.ค. ๖๒

16 ส.ค. ๖๒
