

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP4 จาก BOP4S-07 ถึง 15 ถึงเวลา 16:00 น.
ในวันที่ 8 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1056/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิทธิ ทวีชัย ประสานงานขอดับไฟกับ หน่วยงาน ผคฟ.๓

มนตรี วัฒนธำ
(๖๖๖.4 กกน. นย.๐๗)

ผู้อนุมัติ 2107
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, ผคฟ., กฟผ.๓, นย.๐๗,
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



30 ก.ค. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

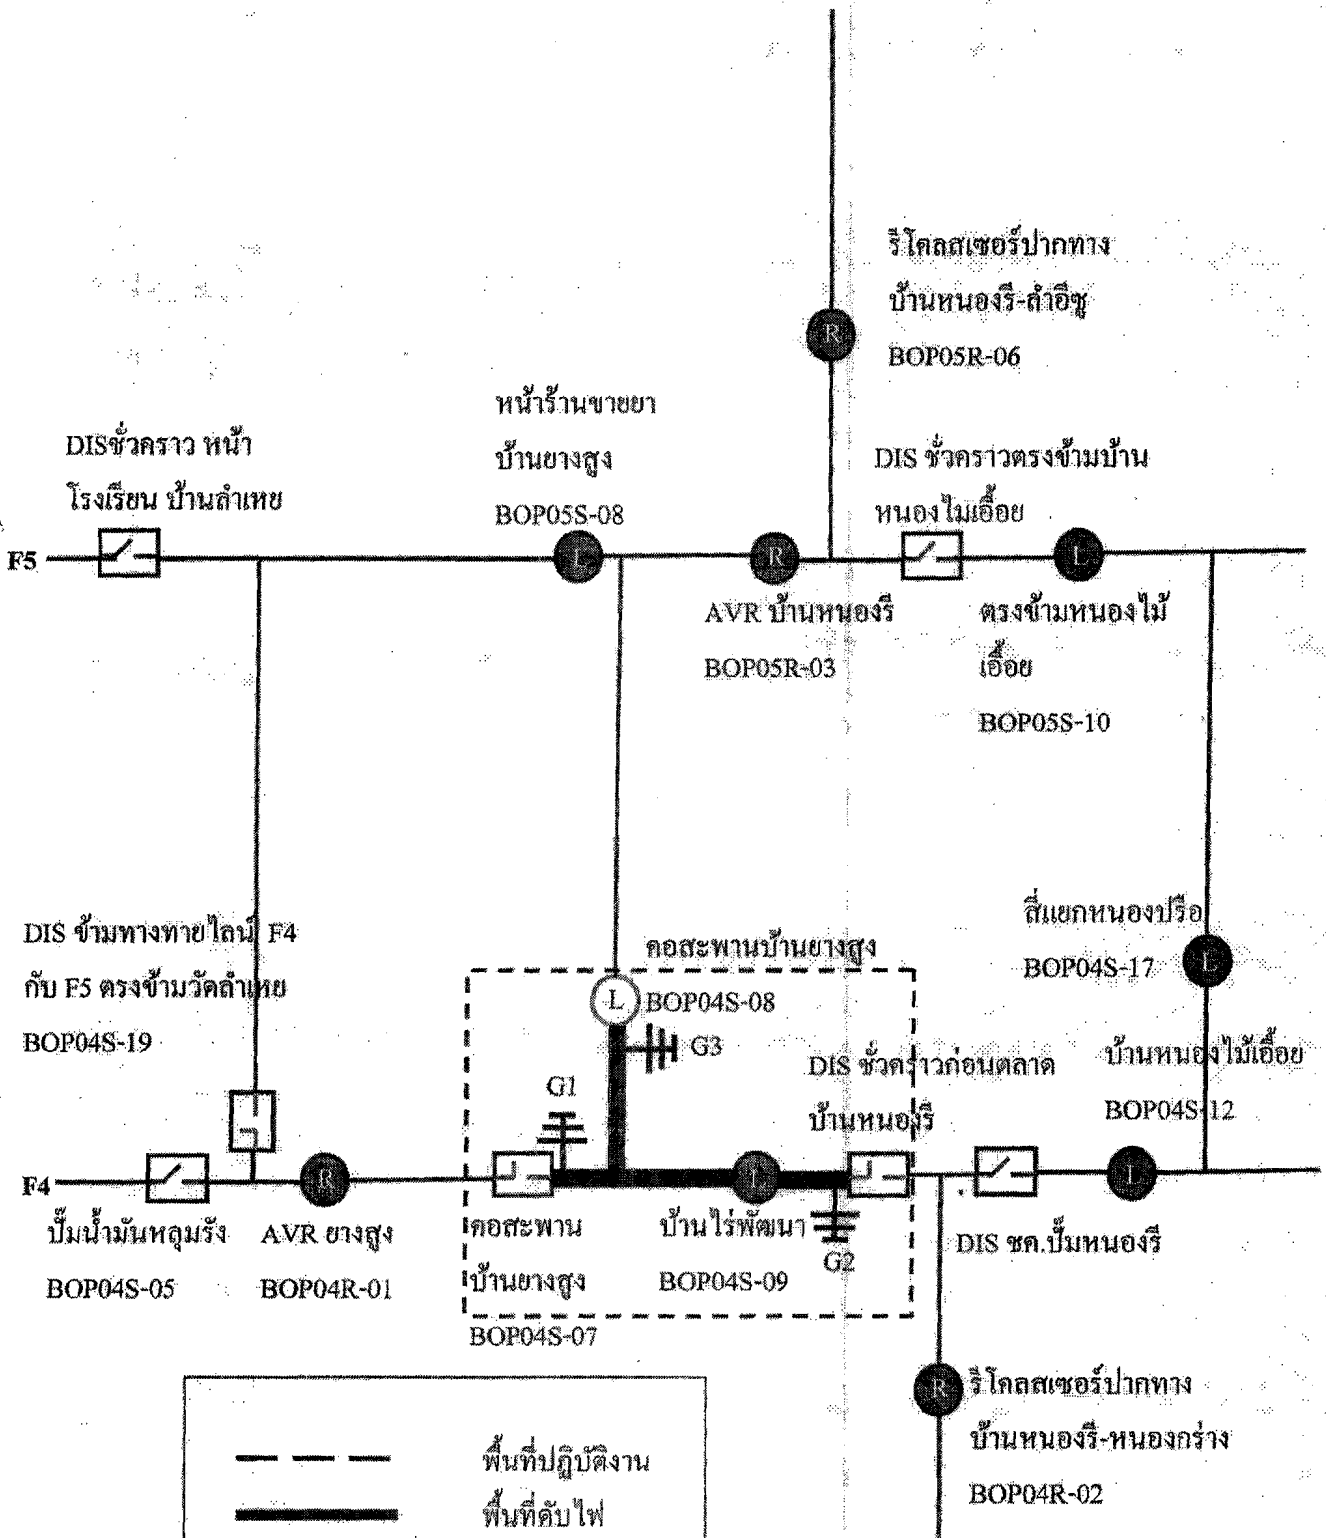
หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน สะพานบ้านยางสูง - ตลาดหนองรี
- กำหนดวันที่ทำงาน 8 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1056/62
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนช ทอญ้อย วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 ก.ค. 62
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 ก.ค. 62
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
2	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทปร.		AVR หนองรี
4	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		R หนองรี
5	**ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP05**						
6	BOP04S-17	ปลด	สับ		ทปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
7	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทปร.		DIS ตลาดหนองรี
เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. (ตรวจก่อน SF6 ไลน์ BOP4S-08 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมปลดงาน)							
8	BOP04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
14	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
15	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
16	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทปร.		AVR หนองรี
17	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทปร.		R หนองรี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
20	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
21	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทปร.		AVR หนองรี
22	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		R หนองรี
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	BOP04S-07	ปลด	ล๊ับ		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
28	**ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนจาก BOP05**						
29	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP04	ปลด	ล๊ับ		หปร.		DIS ตลาดหนองรี
30	BOP04S-17	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		สี่แยกหนองปรือ
31	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		บ้านยางสูง
32	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		บ้านยางสูง
33	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		หนองรี
34	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		หนองรี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖
