



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 12 ก.ค. ๖๒

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.) **3765**  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พิงพา  
ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา กุญชร

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง น.ท.๙ ปฏิบัติงานแทนผลก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๕๐ SAC ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๑๐	๑๕ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนทรอ์ฟไลน์แยกเป็นDIS และ เปลี่ยนสายเป็น ๕๐SAC	SAB๒F-๐๑	ปลายสาย	นายพิสิทธิ์ หลงสมบูรณ์ ๐๙๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนสายปล่องเหลี่ยม - วัดท่ากระโบ้ ม.๑ ต.แม่ไม้

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงศ โทร ๐๙๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอนุชา กุญชร)

ตำแหน่ง น.ท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผลก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ OYL10 จาก SAB๒F-01 (D/R) ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ 15-08-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1101/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนุชา กุญชร ประสานงานการขอตัดไฟกลับ ม.อ.๑๑๑ กฟท.๓  
30 ก.ค. ๖๒

1705 กุญชร  
(20๘/กฟท.๓ อ.บ.)  
๐๘๐๓ ม.ล.ว.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

2127

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน ผลก. กฟอ. กฟท. กฟอ. กทอ.  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์จึง 1 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. (สถานี )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๕/๒๕๖๑)

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)  
ช.ก.บ.บ.(ก.๓)


31 ก.ค. ๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนปล่องเหลี่ยม วัดท่ากระเปือ ม1ต.ท่าไม้				
กำหนดวันที่ทำงาน	15/08/2562	เวลา 08.30 น.	ถึง	15/08/2562	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย OY110	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1101/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	30 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ OYL							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R บางประแดง
2	SAB02F-09	ลับ	ปลด(ใช้ไหลคัปสเตอร์)		สพร.		D/F ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ
3	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดจุดจัมเมนไลน์ช่วงลิตเข้าหัว D/F SAB02F-09 ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ (โดยวิธีชอทไลน์ ตามผังแนบ)						
4	หลังจากทำการปลดจุดจัมเมนไลน์ช่วงลิตเข้าหัว D/F SAB02F-09 ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ แล้วเสร็จ (โดยวิธีชอทไลน์ ตามผังแนบ)						
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สพร.		
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สพร.		
7	OYL10R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
8	KTE07R-01 (BMP10R-02)	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ	R	ตรวจเช็คบาง
งานที่ทำ 1.เปลี่ยน D/F (SAB02F-09) เป็น DIS , 2. เปลี่ยนสายเป็น 50SAC, 3.ติดตั้ง DIS บริเวณบ้านก้านนอิทธิพล (โดยวิธีชอทไลน์ )							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
9	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R บางประแดง
10	ตรวจสอบ DIS ติดตั้งใหม่ทั้ง 2 ชุด ให้อยู่ตำแหน่งเปิดวงจร						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพร.		
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพร.		
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัมจุดจัมเมนไลน์ช่วงลิตเข้าหัว DIS ที่ติดตั้งแทน D/F ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ (โดยวิธีชอทไลน์ ตามผังแนบ)						
14	หลังจากทำการจัมจุดจัมเมนไลน์ช่วงลิตเข้าหัว DIS ที่ติดตั้งแทน D/F ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ แล้วเสร็จ (โดยวิธีชอทไลน์ ตามผังแนบ)						
15	DIS ติดตั้งใหม่	ปลด	ลับ		สพร.		DIS ปล่องเหลี่ยม-วัดท่ากระเปือ
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ เช็คเฟสโรเตชั่น ที่ DIS.ติดตั้งใหม่บริเวณหน้าบ้านก้านนอิทธิพล						
17	KTE07R-01 (BMP10R-02)	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ	R	ตรวจเช็คบาง
18	OYL10R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น							

Handwritten title: *Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.*

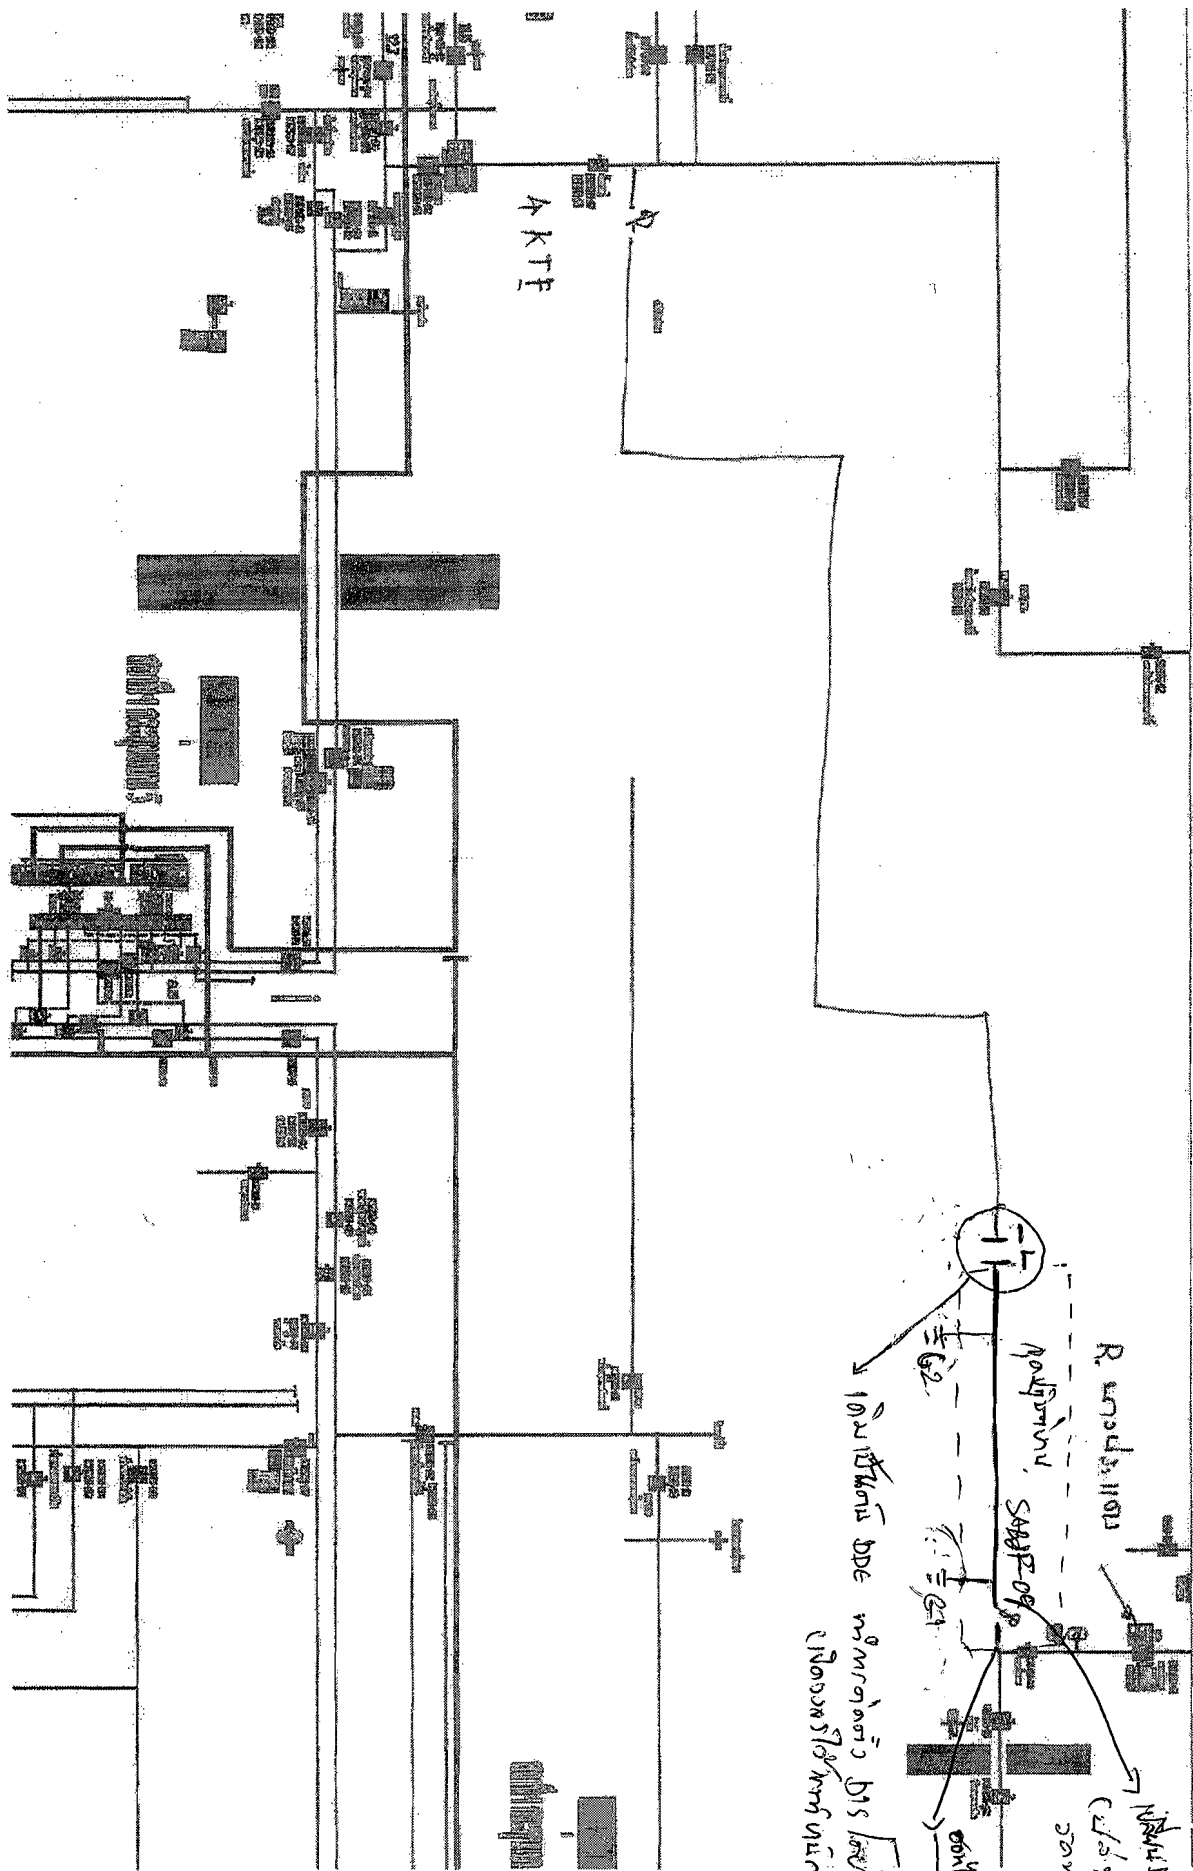

Handwritten notes in Indonesian:

- R. KODOLANON
- SABP DP
- MUDA DP (Lampiran 2)
- MUDA DP (Sampuran)
- Pondokan BDE
