



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY ADMINISTRATION

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) 96'๓ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB7	๓ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยบางกระบือ	NCB7S-08	NCA10S-07	นายอนันต์ หนูอินทร์ โทร.๐๘๑-๙๙๑๙๘๑๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขุมชนซอยบางกระบือ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ข.ม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Namsri

(นายสมเกียรติ อ.สงวน)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ NCB7 จาก NCB 7S-08 ถึง NCA 10S-07
ในวันที่ 3 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 111
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นิต ราชวงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชลิต สีขาวซ่า

17/2562
(นายชลิต สีขาวซ่า)
๐๖-๖ ๓๓๓๓-๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 227
เรียน ผจก. กฟอ. นครชัยศรี
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กพม
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า) ๒27
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ปรับปรุงระบบจำหน่ายชอยบางกระเบา.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ปรับปรุงระบบจำหน่าย.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๓ ก.พ. ๖๒..... เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น...... จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม คัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ..... นายสมเกียรติ อ.สงวน..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี.....
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๓-๕๙๗๙๕๕๕..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายอนันต์ หนูอินทร์.....
 ตำแหน่ง..... ชม.กส.กฟอ.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๙๑๙๘๑๔..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟอ.นครชัยศรี, ผู้รับเหมาเอกชน.....

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวชา ชม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖).....

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่..... ตรงข้ามโรงเหล้า..... ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง.....
 จุดที่ ๒ ปากชอยบางกระเบา ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง..... จุดที่ ๓..... -..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๔..... -..... ผู้รับผิดชอบ..... -..... จุดที่ ๕..... -..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ)..... /๒๕๖๒..... พร้อมแผนผัง Switching.....

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมา หงษ์ลิ้น.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๓ ม.ค. ๖๒..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท), ผ.ปบ., ผ.กส., จป. กฟอ.นช., ผู้รับเหมาเอกชน.....
 ผู้รับเหมาเอกชน.....


๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๓ ม.ค. ๖๒.....

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

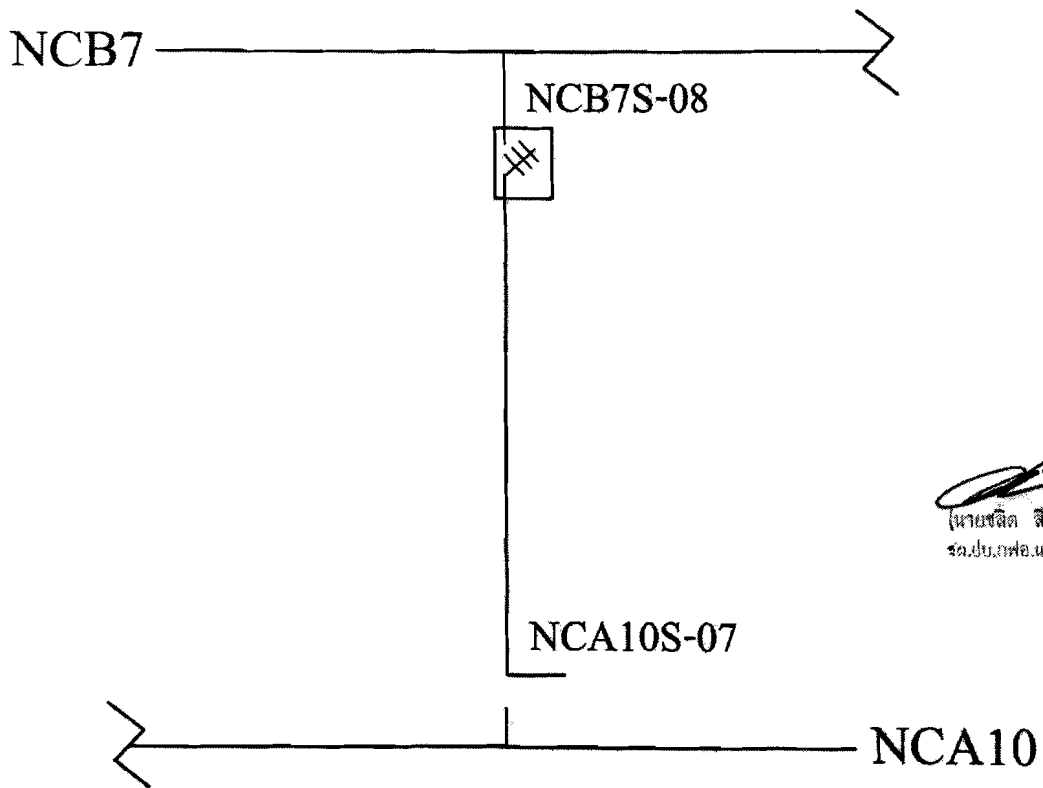


(นายชิต สิวารักษ์)
จ.ป.บ.ก.พ.อ.นครชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

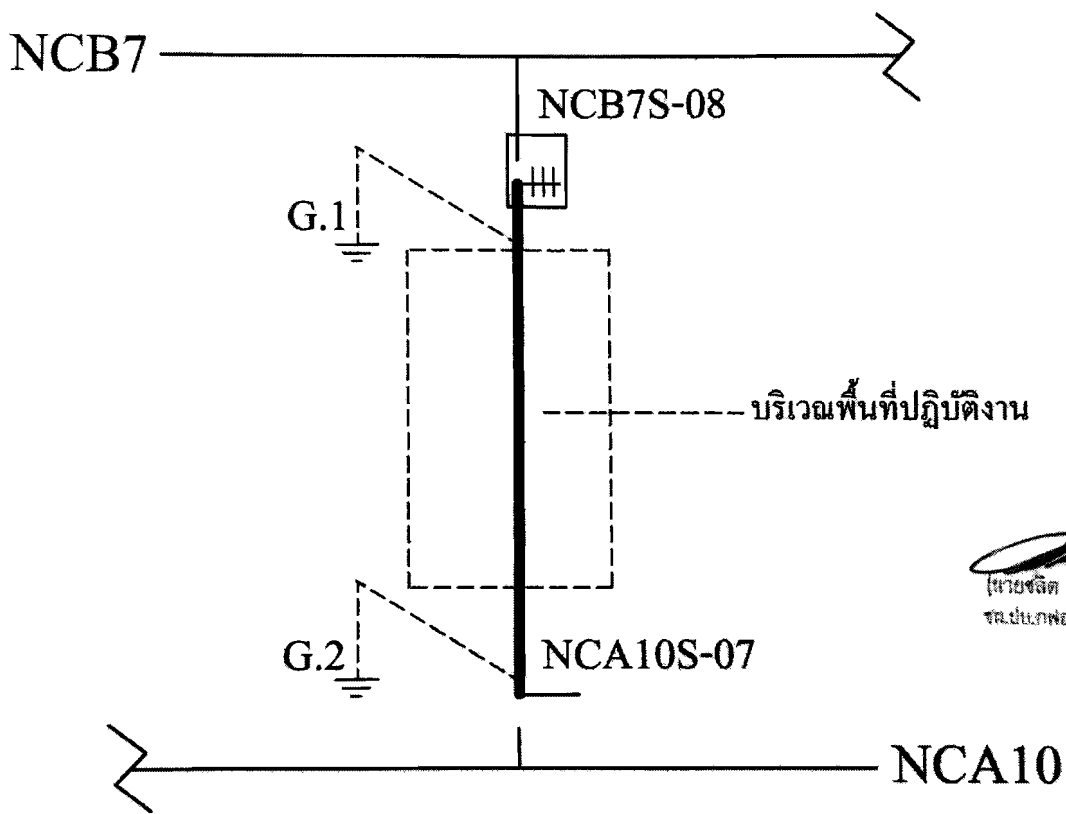

(ลายเซ็นต์ สีขาว)
 ควบคุมภาคเหนือ

..... ๑

ชก..... ๑๖

ผส..... ๑๖

เทก..... ๑๖ ๒๑.๖๒

..... ๑๖

