



# วิทยุขอดับไฟ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บ.บ.)- ๑๓๐๖ /๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
 ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.ปอพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า ปอพลอย ดังนี้

ที่	พิด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๕ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบ สายส่ง ๑๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS ชค.ข้าง บึงน้ำมัน หนองรี	SF๖ หนองไม้ เอื้อย BOP๐๔S- ๑๒	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.บ.บ.กฟอ.บพล. โทร.๐๔๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี พูลพันธ์ ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๘๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.บ.บ. โทร.๐๔๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป  
 ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.บพล.

๕๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ [พิดเตอร์ BOP04 จาก W-033] ถึง 9Fb บังคับเวลา 1000 BOPAS-12

ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1117

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กนก วัฒนศิริ ประสานงานขอดับไฟกับ โฉบ. ๔15๗ พคพ.๓

1 ธ.ค. 62

กนก วัฒนศิริ  
20 ธ.ค. 62  
ผคฟ. กฟผ.๓

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2146

เรียน ผจก. กฟผ. ๒๖๐. ๒๖๐. ๒๖๐. ๒๖๐.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

วอรวุษา-ศักดิ์พัฒนา



รณณรงค์(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน จาก Dis ชค. ปิ๋มน้ำมันหนองรี - SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย BOP4S-12
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 KV สถานีหนองปรือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1117/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 ส.ค. 62.
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
4	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP05						
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
6	BOP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ช้างปิ๋มน้ำมันหนองรี
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ						
12	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT
13	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อ กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
16	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพเดิม						
20	DIS ชค.	ปลด	สับ		บพล.		DIS ช้างปิ๋มน้ำมันหนองรี
21	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก BOP05						
22	BOP04S-12	ปลด	สับ		บพล.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
23	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
24	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT
25	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						


สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

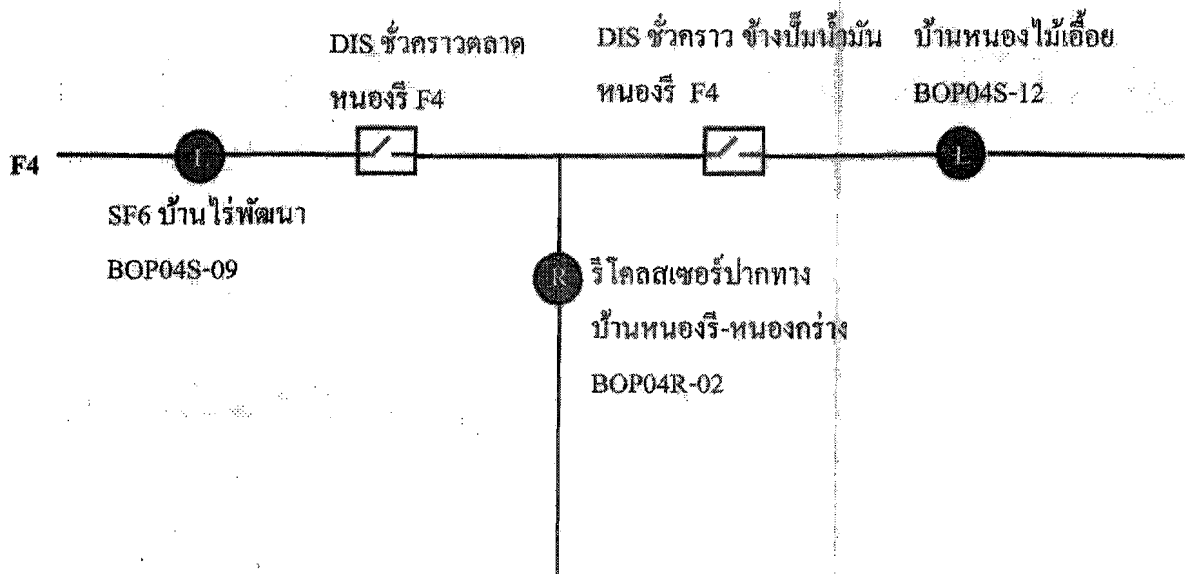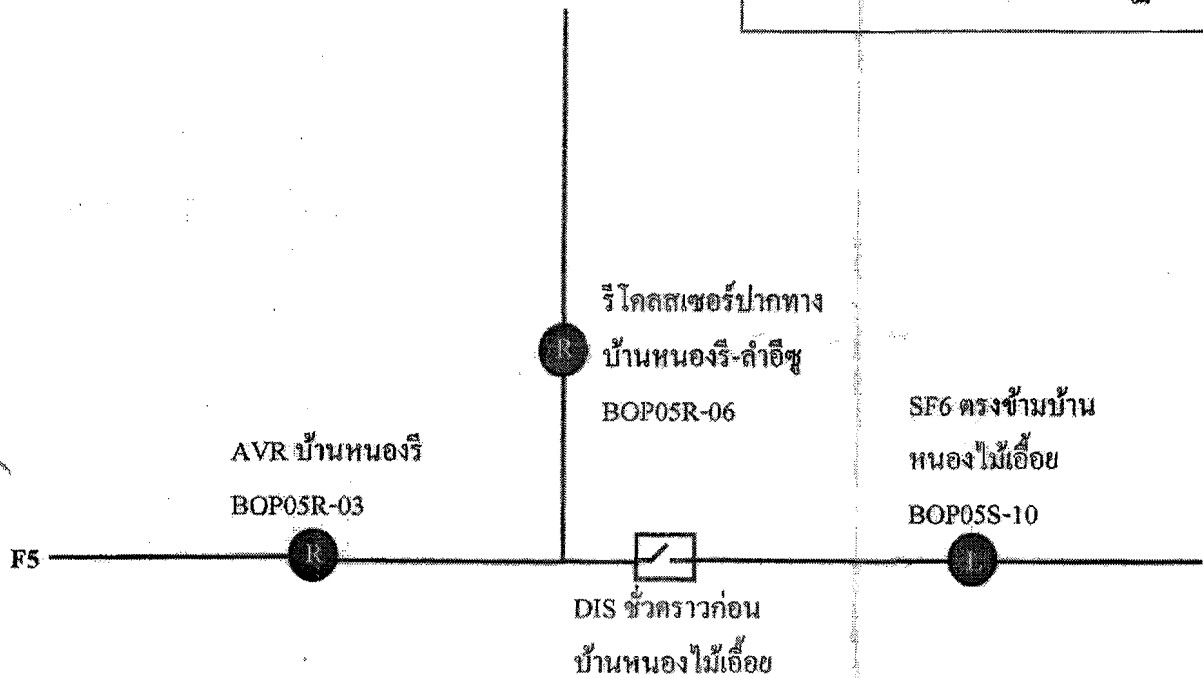

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

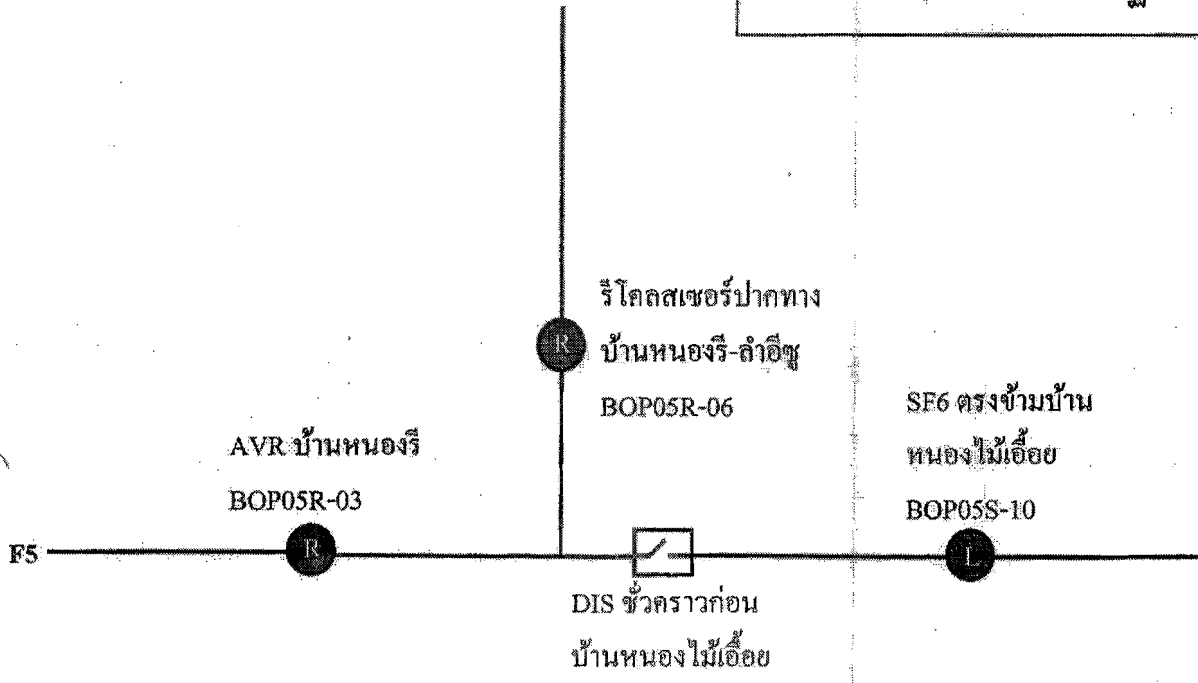

จุดที่ปฏิบัติงาน

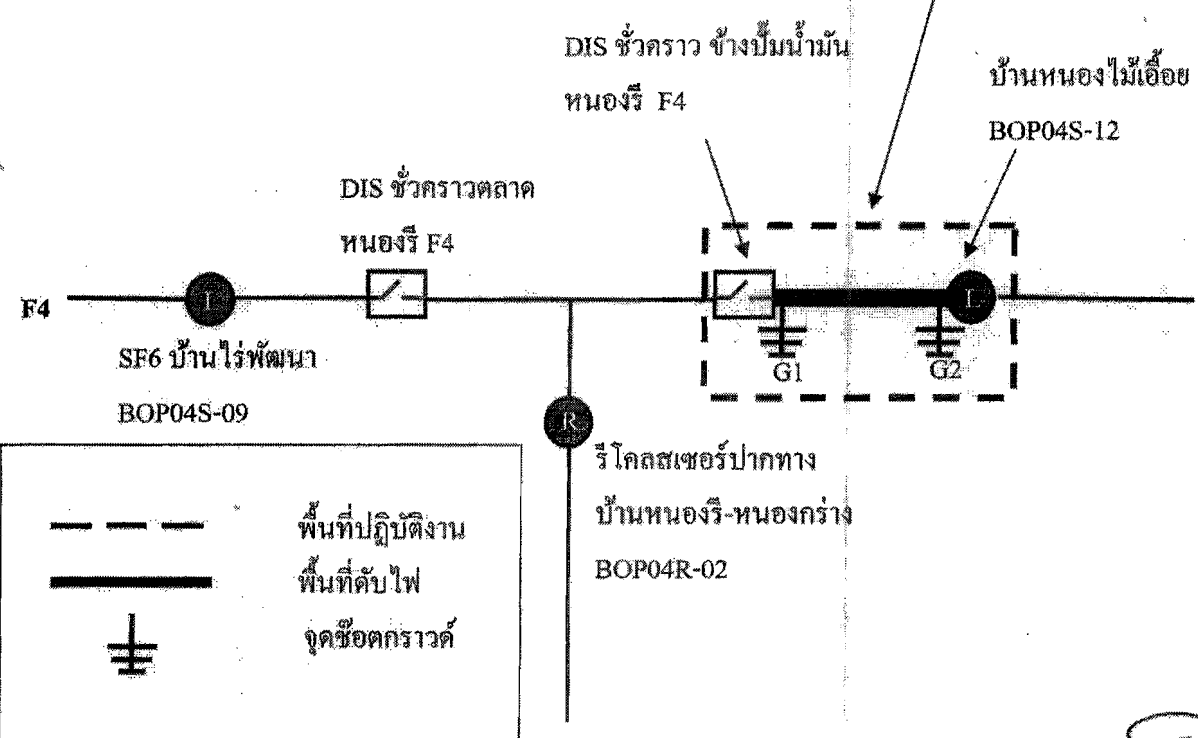

*(Handwritten signature)*
