



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2352

Switching Deadline

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.)1512/2562

วันที่ ๑ ส.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายธานิน พวงนวมมาก

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62	07.30	12.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	Dis ชั่วคราว หมู่บ้านทองวิลล่า	Dis ชั่วคราว บ. บีฟโปรา	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
			07.30	17.00		Dis ชั่วคราว บ. บีฟโปรา	Dis ชั่วคราว สถานีสูบน้ำบ้าน ท่าทางเรียง	
	DBA06		07.30	17.00		DBA06VB-01	DBA6S-03 หน้าสนง.ขนส่ง เดิมบางนางบวช	
2	DBA05	วันพุธที่ 28 ส.ค. 62	07.30	17.00	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	Dis ชั่วคราว อู่สายชล	DBA5S-02 สามแยกนางบวช	
	DBA06		07.30	17.00		DBA06VB-01	DBA6S-03 หน้าสนง.ขนส่ง เดิมบางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.๒,ม.๕,ต.ยางนอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วศด.ผบ. โทร 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งเดิมบาง - โรงกลึงนางบวช						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27,28 ส.ค. 2019	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1169/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	21 สิงหาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21-08-62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ส.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายฉันท,นายฉันทกัญญา,นายสามารถ 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06							
2.วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06							
งานที่ทำ 1.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06							
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 20 MW
3	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.85 MW
4	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.97 MW
5	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	Load 10.5 MW
7	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load -3.8 MW
8	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
9	DAA05S-03	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู
10	DBA05R-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
11	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
12	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
13	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบางฯ (บน)
14	-ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05 โดยอาศัย DBA06						
15	DBA05S-04	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบางฯ (ล่าง)
16	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	หมู่บ้านทองวิลล่า
17	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.						
18	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
19	DBA06S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.	DIS	Pot Haed F.6
20	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	หน้า บ.บีพีปรา
21	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	สถานีสูบน้ำท่านางเรียง
22	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
23	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
28	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
29	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
30	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานในไลน์ DBA05 ตั้งแต่ DIS ชค.หมู่บ้านทองวิลล่า - DIS ชค.หน้า บ.บีพีโปรา แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้							
32	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
33	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
34	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	หมู่บ้านทองวิลล่า
36	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
37	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ทั้งหมด							
38	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
39	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
40	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4							
41	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
42	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
43	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
44	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
45	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
46	DBA06S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Haed F.6
47	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
48	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	หน้า บ.บีพีโปรา
49	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
50	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบางฯ (บน)
51	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
52	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
53	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	สถานีสูบน้ำทำนางเรียง
54	DBA05S-04	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบางฯ (ล่าง)
55	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05							
56	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
57	DAA05S-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
58	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
59	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
60	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
61	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
62	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
63	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							
งานที่ท่า 2.วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06							
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 20 MW
3	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.8 MW
4	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.47 MW
5	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	Load 10 MW
7	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load -3.87 MW
8	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
9	DAA05S-03	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู
10	DBA05R-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
11	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
12	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
13	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบางฯ (บน)
14	-ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05 โดยอาศัย DBA06						
15	DBA05S-04	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบางฯ (ล่าง)
16	DBA05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.	SF6	แยกนางบวช
17	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.						
18	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
19	DBA06S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.	DIS	Pot Haed F.6
20	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	อู่สายชล
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
26	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
27	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
28	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
29	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ทั้งหมด						
32	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
33	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
34	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
35	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
36	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
37	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
38	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
39	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
40	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
41	DBA06S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Haed F.6
42	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
43	DIS ชด. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	อู่สายชล
44	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
45	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบางฯ (บน)
46	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
47	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
48	DBA05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	แยกนางบวช
49	DBA05S-04	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบางฯ (ล่าง)
50	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05							
51	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
52	DAA05S-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
53	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
54	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
55	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
56	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
57	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
58	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผนที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อการปรับปรุงระบบจำหน่าย
บริเวณ Dis ชั่วคราว อู่สายชล ถึง DBA55-02 ส่วนแยกนางบวช
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

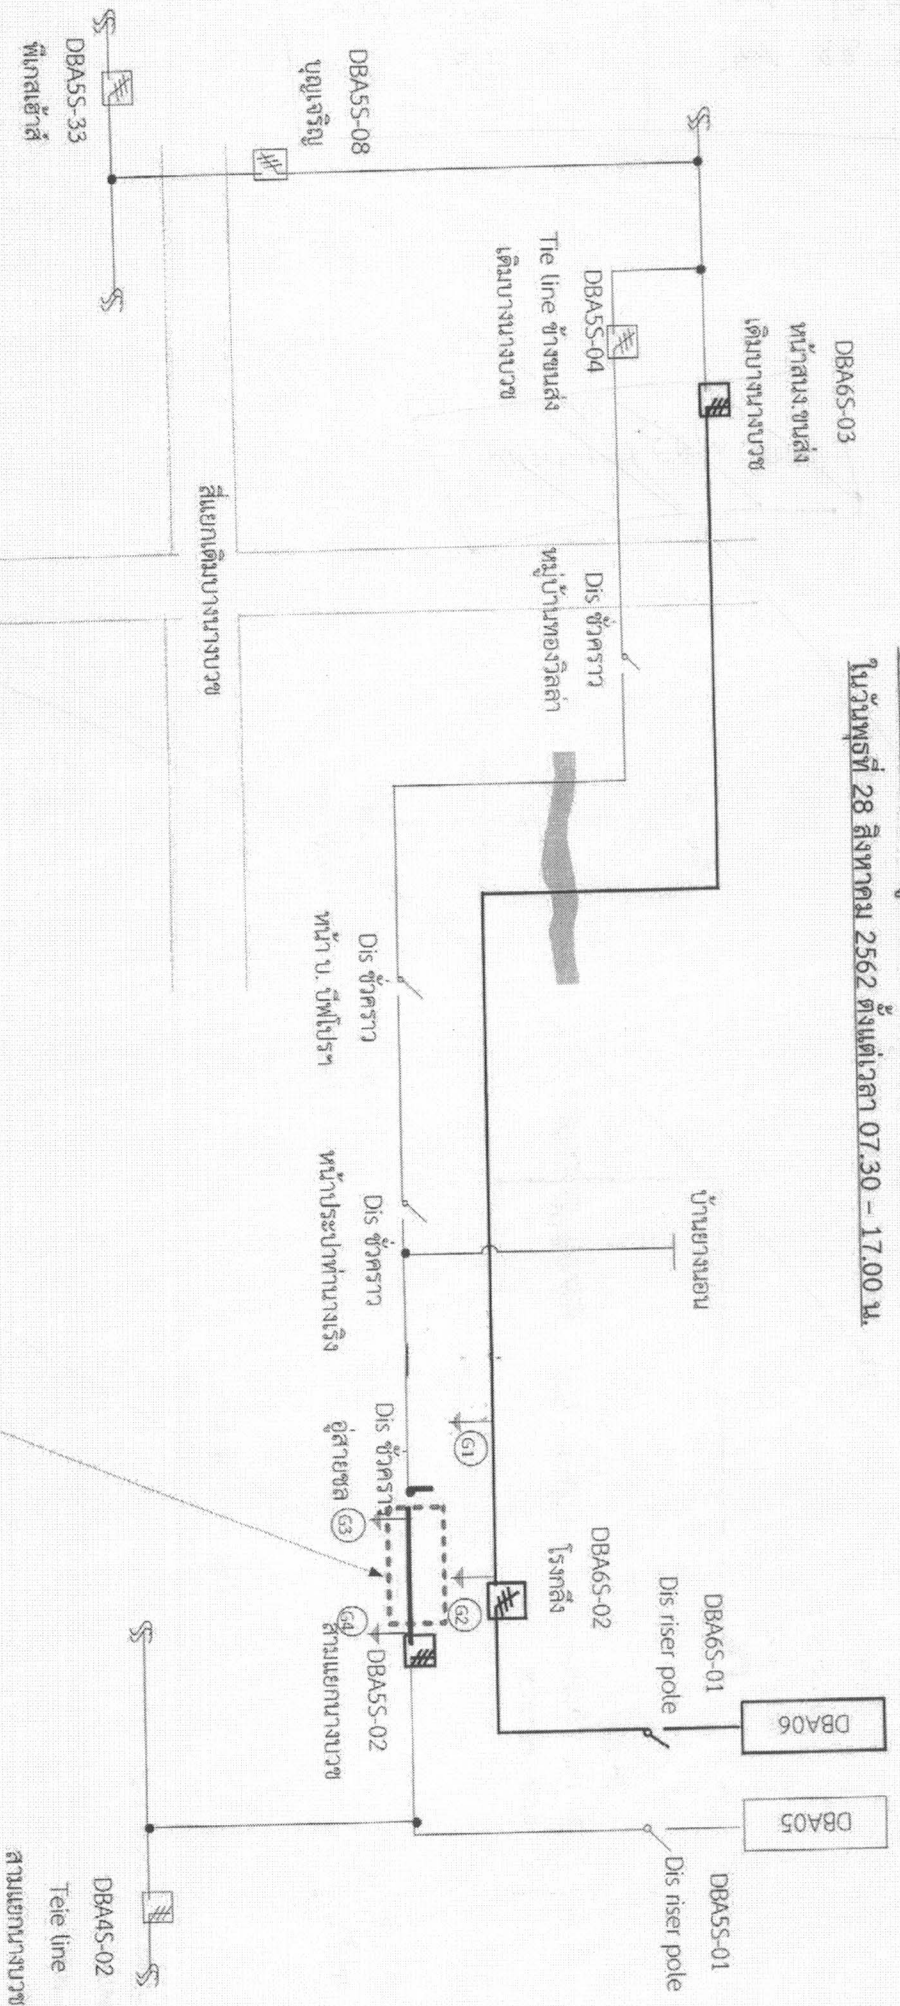

1. วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ปิดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)
