



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ป.บ.) ๔๐๘๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุหา
ชื่อผู้ส่ง นายอรร่วม ผ่องมณี

Switching Deadline

วันที่ 21 ส.ค. ๖๒

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๒

วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟช.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ระบายน้ำจำหน่าย ตามแผนผังสิ่งปลูกแบบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTBo๑	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ เลขสี่แยกบาง น้ำจืด ถึง ปากซอยประเสริฐ	จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๒	นายนิทัศน์ เตชะวันโต โทร ๐๙-๑๕๑๐-๕๕๕๕
๒	KTBo๑	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๔	ตรงข้ามร้านซื้อ ของเคาท์ทรวงพล
๓	KTBo๑	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๓	สกต. บางน้ำจืด วงจรบน
๔	KTBo๑	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTBo๕-๐๓	KTBo๕-๑๐	บ.ฮาร์วาด
๕	KTBo๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๒	
๖	KTBo๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๓	ตรงข้ามร้าน บ. MCJ AND SUN
๗	KTBo๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีชอทไลน์ กระเช้า	KTBo๕-๐๔	สกต. บางน้ำจืด วงจรล่าง
๘	KTBo๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTBo๕-๐๔	KTBo๕-๐๕	ปากซอย ประเสริฐ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่สี่แยกบางน้ำจืด ถึง ปากซอยประเสริฐ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรร่วม ผ่องมณี ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. โทร ๐๙-๑๕๑๐-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.จก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรร่วม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟช.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-4 ฟีดเตอร์ KTB 1 จาก DDE สำนักช่างหัวจิต ถึง KTB 1S-04, KTB 5S-10
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ // 88

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5-8 ฟีดเตอร์ KTB 5 จาก DDE สำนักช่างหัวจิต ถึง KTB 5S-03, KTB 5S-09
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ วัฒนเดชะ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย 019674 ๒๕๕๗๓๐๑
17 ส.ค. 62

พรวิมล ธีระ
(นางสาวพรวิมล ธีระ)
ว.ค. กทป. คพ. ๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 2330

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.ปช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ทัง สวรรณ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


19 ส.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสี่แยกบางน้ำจืด ถึง ปากซอยเงินประเสริฐ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.สค.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1188/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	18 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			นายศักดิ์สิทธิ์ เดิมยศ-ผาด	วันที่	18 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายภฤชณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
3	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
4	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
5	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU	-	-
6	ย้ายโหลด KTB 1 บางส่วนไปจ่ายจาก KTU 1						
7	KTU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTU	-	-
8	KTB01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามร้านซื้อของเก่าทรงพล
9	ให้ตรวจสอบ KTB5S-03 (SF6ตรงข้ามบ. MCJ AND SUN) ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล็อคคาน						
10	ให้ตรวจสอบ KTB5S-09 (SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ), KTB5S-10 (SF6 บริษัทฮาร์วาท) ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล็อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	KTB05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS สมท.บางน้ำจืด(วงจรล่าง)
13	KTB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS สมท.บางน้ำจืด(วงจรบน)
14	แจ้ง กฟภ.สค. ให้ทำการปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ ออกก่อนทำการปลด DDE						
15	หลังจาก กฟภ.สค. ทำการปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ ออกเสร็จ						
16	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 22 KV. ทำการปลด DDE บริเวณสี่แยกบางน้ำจืด ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 วงจรได้ (ตามแผนผังแนบ)						
17	เมื่อชุด Hotline กระเช้า 22 KV. ทำการปลด DDE บริเวณ สี่แยกบางน้ำจืด ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 วงจรเสร็จเรียบร้อย (ตามแผนผังแนบ)						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
23	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
24	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
25	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-

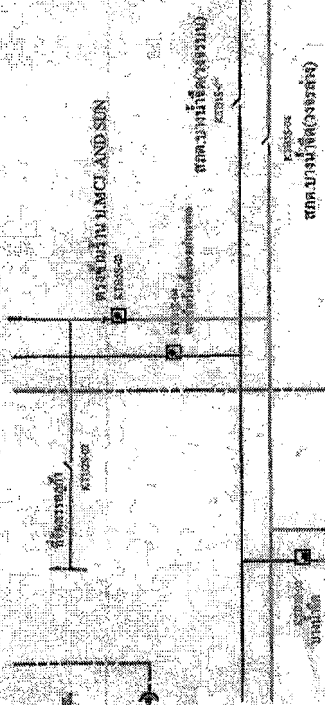

DIS ดึงตัวอาคารของร.พ.ทองหล่อ



หน้าดิน = ภาชนะที่ใส่ดินปลูก

KASSON 10
1.1.1.1.1.1

