



วิญญูขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๙๙๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๐ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕KV สถานี หนองปรือ	DIS ชค.หน้า บรรองคมีนิ มาร์ท	AVR.บ้าน ยางสูง BOP๕R- ๐๑	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ทพ.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์.....ตำแหน่ง พทง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๒๓๓๘๒๙๘...

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์.....ตำแหน่ง ทพ.ปบ.....โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
(.....รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน.....)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.บพล.....

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนบ่อพลอย - หนองปรือ (DIS ชดหน้าบรยงค์มินิมาร์ท - AVR บ้านยางสูง)						
กำหนดวันที่ทำงาน	10/09/2562	เวลา 08.30	น.	ถึง	10/09/2562	เวลา 17.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.บพล.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบ 115 KV สถานีหนองปรือ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1246/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	29 สิงหาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 ส.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 ส.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ BOP							
1	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP05						
2	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R ยางสูง พร้อม Manual TAP AVR
3	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R หนองรี พร้อม Manual TAP AVR
4	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
5	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านยางสูง
6	SW.load.BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านยางสูง
7	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R หนองรี พร้อม Auto TAP AVR
8	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
9	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS หน้าบรยงค์มินิมาร์ท
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
14	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3						
19	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS หน้าบรยงค์มินิมาร์ท
20	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนคืนจาก BOP05						
22	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุนย์ฯ		R หนองรี พร้อม Manual TAP AVR
23	SW.load.BOP04R-01	ปลด	สับ		บพล.		R บ้านยางสูง
24	ปรับ " TAP " AVR บ้านยางสูงลงมา "TAP1" พร้อม Manual TAP AVR				บพล.		AVR บ้านยางสูง
25	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.		R บ้านยางสูง
26	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 ลีแยกหนองปรือ
27	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศุนย์ฯ		R ยางสูง พร้อม Auto TAP AVR
28	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ศุนย์ฯ		R หนองรี พร้อม Auto TAP AVR
สิ้นสุด Switching							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

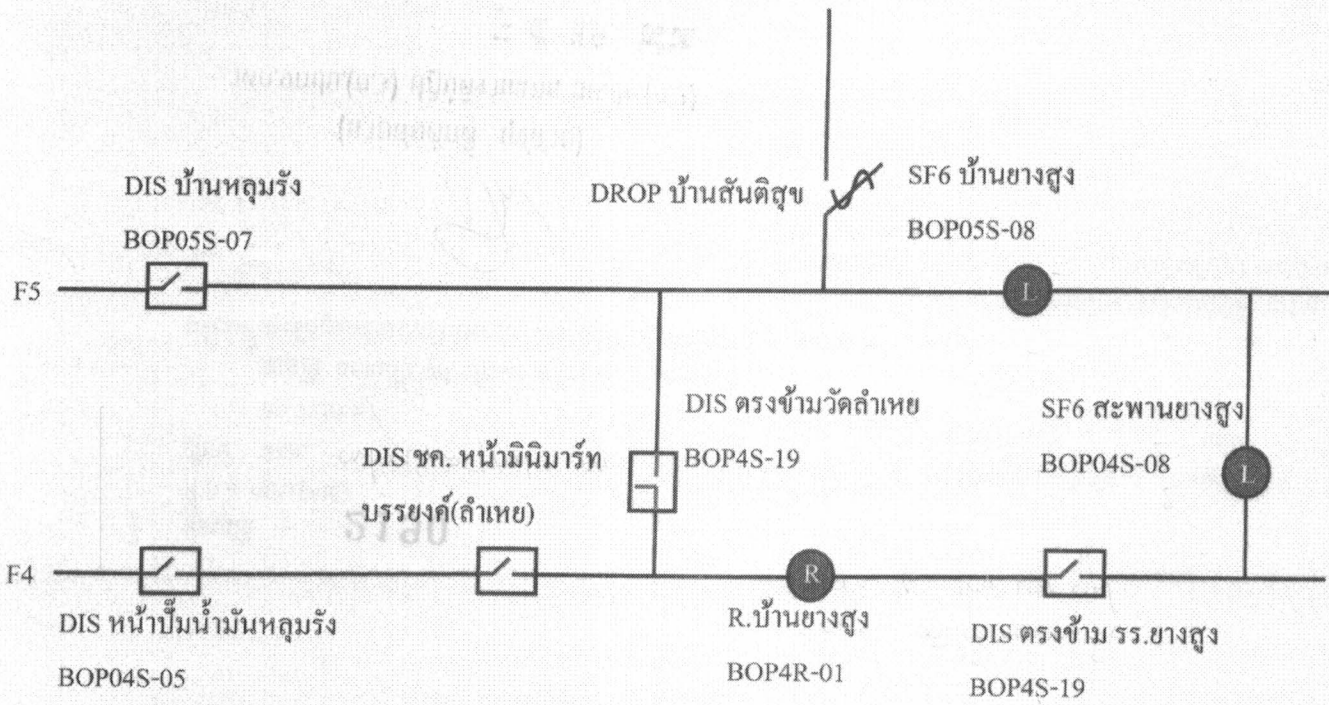

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

