






## ใบสั่งทำสวิตชิง


- |                        |  |          |   |                   |                |
|------------------------|--|----------|---|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หน้าคู้งทอง - หน้าวัดใหม่  |          |   |                   |                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 10 ก.ย. 62   | ระหว่าง  | 08.30 น.  | ถึง               | 15.00 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | บปม.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย   | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1262/62        |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |  |          | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง   | วันที่            | 2 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |  | วันที่            | ๙ ก.ย. ๖๒      |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |  | วันที่            | ๙ ก.ย. ๖๒      |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายณคค์กิติสิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |                   |                |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
4	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
5	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	Scada	R วัดขุนไกร
6	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPN10						
7	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
8	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
9	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ BAM07R-01 R.วัดขุนไกร ออกทั้ง 3 เฟส						
10	เมื่อช่างหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
11	BAM07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS โรงงานน้ำปลา
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตัด DDE บริเวณหน้าคู้งทอง						
15	เมื่อชุดทำงานให้ทำการตัด DDE บริเวณหน้าคู้งทองแล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตัด DDE บริเวณหน้าวัดใหม่						
17	เมื่อชุดทำงานให้ทำการตัด DDE บริเวณหน้าวัดใหม่แล้วเสร็จ พร้อมรับทั้งสองด้าน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
20	BAM07S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS โรงงานน้ำปลา
21	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ BAM07R-01 R.วัดขุนไกร เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปม.		R วัดขุนไกร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
27	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
28	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
29	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R ประตุน้ำบางสาม
30	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R วัดขุนไกร
31	%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%						
32	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
34	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
35	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R ประตุน้ำบางสาม
36	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R วัดขุนไกร
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
39	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.		R วัดขุนไกร
40	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ BAM07R-01 R.วัดขุนไกร ออกทั้ง 3 เฟส						
41	BAM07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS โรงงานน้ำปลา
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าคังทอง						
45	เมื่อชุดทำงานให้ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าคังทองแล้วเสร็จ						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าวัดใหม่						
47	เมื่อชุดทำงานให้ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าวัดใหม่แล้วเสร็จ						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
50	BAM07S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS โรงงานน้ำปลา
51	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน กลับจาก SPN10						
52	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์ของ BAM07R-01 R.วัดขุนไกร เข้าทั้ง 3 เฟส						
53	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปม.		R วัดขุนไกร
54	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
55	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
57	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R ประตูน้ำบางสาม
58	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R วัดขุนไกร
59	%%% สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด %%%						

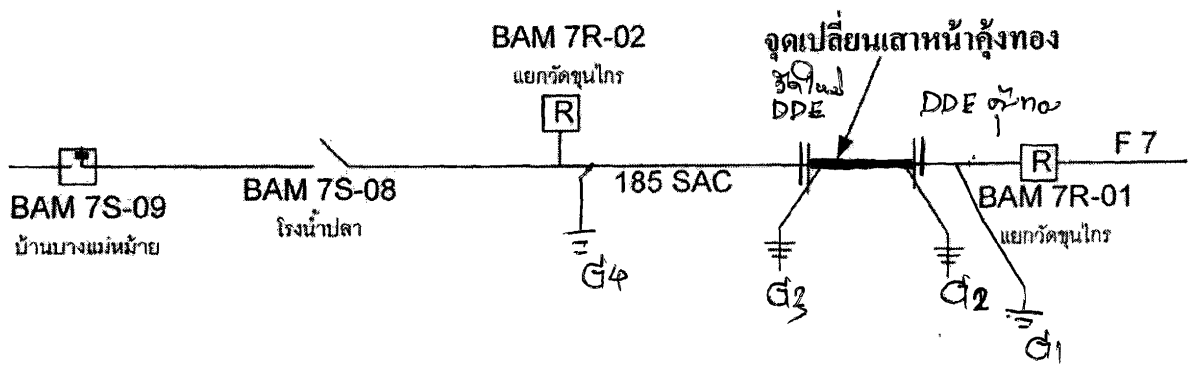

กฟส.อ.บปม. ภาค 3 เขต 3	 <h3 style="margin: 0;">การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</h3>	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... ผู้จัดทำ..... ผู้คำนวณการทอง..... ผู้คำนวณการเขต..... รองผู้ว่าการ.....	ผู้ว่าการ .....  <div style="text-align: center;"> <p>แผนผังระบบจำหน่าย</p> <p>กฟส.อ.บางปลาแก้ว บริเวณจุดเปลี่ยนเสาเสริมความมั่นคงหน้าคู้งทองตาษา</p> </div>	เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....เมตร..... มาตรฐาน.....:..... แบบเลขที่ RF27-01S/S100 แผ่นที่.....1.....ของจำนวน.....1.....แผ่น
