

2495



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๕๕๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นางกฤษณา อมรเทพ
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๑๒ ก.ย. ๖๒ ป	๑๐.๐๐น.	๑๒.๐๐น.	ก่อสร้าง ระบบ ๑๑๕ KV สถานี หนองปรือ	Recloser หน้า สำนักงาน หนองปรือ รหัส BOP&R-๐๔	DROP (ขค.) บ้าน ท่าลำไย	นายภักพงษ์ อินทสวาสดี ทพ.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๕๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๒ (สข) โทร.๐๕๕-๒๓๓๙๒๙๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภักพงษ์ อินทสวาสดี ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร.๐๕๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นางกฤษณา อมรเทพ)

(..... รจก.(บ)รักษาการแทน.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.บพล.....



๓ ก.ย. ๒๕๖๒

(นายบัญชา เขาวีไว)

พชง.๕ ผบ.กฟอ.บพล.

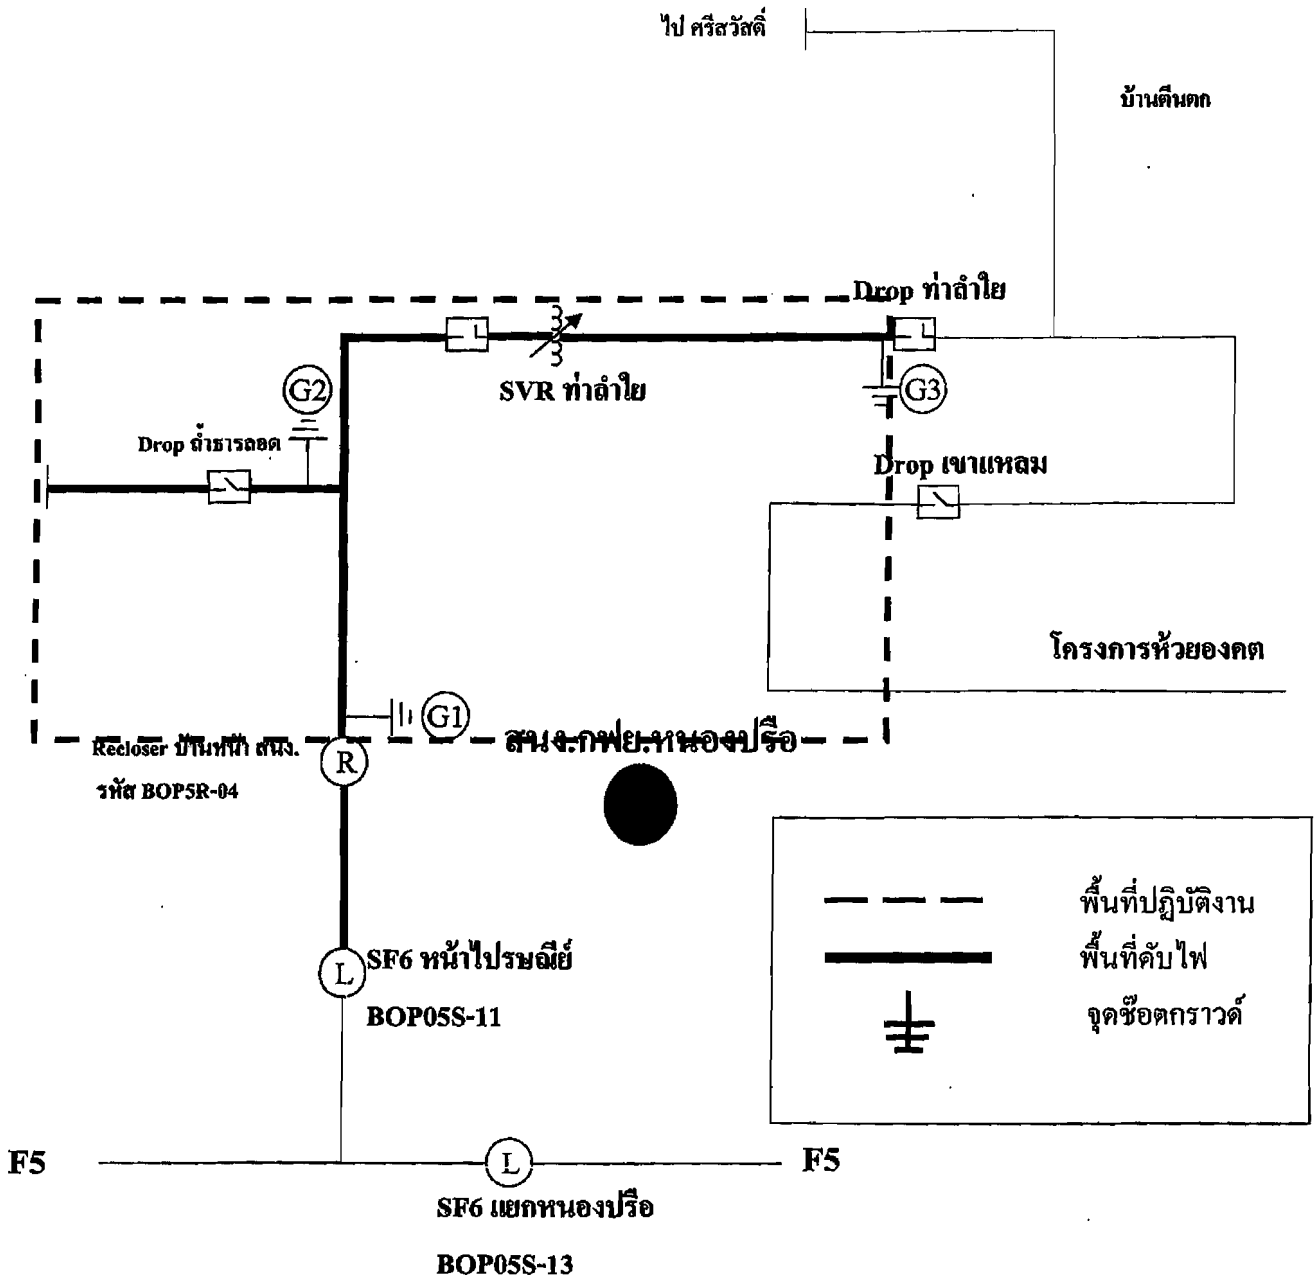
รักษาการแทน ผค. ปบ.กฟอ.บพล

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้า สนง.หนองปรือ - บ้านท่าลำไย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ก.ย. 62 ระหว่าง 10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1272/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 4 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	-แจ้ง กฟส.หนองปรือ ตรวจสอบครอปเอาท์ บ้านท่าลำไย ปลอดภัย พร้อมเก็บกระบอกเอาท์ฟิวส์						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.						
3	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	กฟอ.หนองปรือ
4	BOP05R-04	สับ	ปลด		หปร.	R	กฟอ.หนองปรือ
5	-ให้ปลดใบมีดด้านออกไลน์ BOP05R-04 ออก						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
9	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
10	เมื่อช่างหน้างาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
14	-ให้สับสวิตใบมีดด้านออกไลน์ BOP05R-04 เข้า						
15	BOP05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.	R	กฟอ.หนองปรือ
16	BOP05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.	R	กฟอ.หนองปรือ
-แจ้ง กฟส.หนองปรือ นำกระบอกเอาท์ฟิวส์ บ้านท่าลำไย ไปแขวนไว้ตามเดิม							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



(นายบัญชา เชาวใจ)
พงษ.๕ ผบ.กฟอ.บพล.

รักษาการผอ.แผน.ป.บ. กฟอ. ปทุมธานี
