



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. (นบ) ๒๐๘๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท

ชื่อผู้ส่ง นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. ๖2

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV04	15 กันยายน 2562	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณแยก รพช. - แยกศาลากลาง	Dis ชำคราว แยก รพช.	NPV4S-07 (ท้าย ซ.99) และ NPV4S-08 (ก่อนแยกเข้า ศาลากลาง)	นายพรมแดน สุทธิงาม ชผ. ปบ. กฟ๗.๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง วิศว.๑.๑.ผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๙-๖๖๘๕๕๓๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)

นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ
(นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV4 จาก Dis 110k SWR. ถึง NPV4S-07, NPV4S-08
ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1284

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ปบ. (นบ) ๒๐๘๕/๒๕๖๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศว.๑.๑.ผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม

6 ก.ย. 62
ก>2

(Handwritten signature)
๒๐๘๕/๒๕๖๒ (นบ)
๐๘๙ ๖๖๘ ๕๕๓ ๓๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 2530

เรียน ผจก. กฟ๗.๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Handwritten signature)
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)


ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยทหารเรือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	นร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1284/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกษพันธ์		วันที่ 9 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV	-	-
3	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV	-	-
4	ย้ายโหลด NPV04 ฝาก NPV02						
5	NPV04S-10	ปลด	สับ		นร.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
6	NPV04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นร.	SF6	ก่อนแยกเข้าศาลากลาง
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
	DIS ชั่วคราว ..	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.	DIS	แยก รพข.
9	ตรวจสอบสถานะ NPV04S-07 (SF6.ท้ายซอยโรงแรม 99) อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
13	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมไฟปฏิบัติได้						
14	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
15	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
16	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
20	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV	-	-
21	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV	-	-
22	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
23	DIS ชั่วคราว ..	ปลด	สับ		นรฐ.	DIS	แยก รพช.
24	ย้ายโหลด NPV04 ฝาก NPV02						
25	NPV04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นรฐ.	SF6	ก่อนแยกเข้าศาลากลาง
26	NPV04S-10	สับ	ปลด		นรฐ.	SCADA SF6	แยกเข้าศาลากลาง
27	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
28	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							


แยกศูนย์ราชการ

ท้าย ช.ร.ร. 99


Dis ชั่วคราว
แยก รพช.



NPV4S-08



NPT9S-10

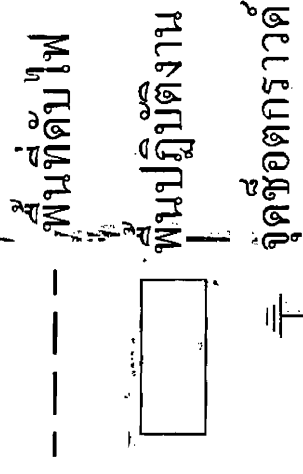

แยกศูนย์ราชการ

(นายชัยยศ โพธิ์รัตน์)
วศก.6 สนง.กฟผ.นครปฐม
