



Switching Deadline

วันที่ 13 ก.ย. 62

## วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๑๕๖๗ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่นวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.บป. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบ สายส่ง ๑๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS ชด.ข้าง บิมน้ำมัน หนองรี	SF๖ หนองไม้ เอื้อย BOP๐๔S- ๑๒	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชผ.บป.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เชาว์ใจ ตำแหน่ง พชง.๕ (สข) โทร.๐๙๘-๘๒๗๕๕๖๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน) ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำรุด ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)

รจก.(ท.)รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ จาก Disct. ฝั่งฝั่ง ถึง BOP 48-12  
 ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1289  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ช.วิ. ป.วิ. ประสานงานขอดับไฟกับ นาย กิจดา อินท...

ฉัตรนทร์ ผ่องทวสิน  
(ผค. 5 กท. นพ. ๓๗.)

ผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) **2541**  
เรียน ผจก. กฟอ. นอ.พ.ค.๐๗.  
อก.ว.ว.(ก.๓) ✓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. - (สถานี \_\_\_\_\_)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

11 ก.ย. 2562


### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านหนองไม้เอื้อย - ปิมน้ำมันหนองรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ~~ก.ย.~~ 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1289/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 10 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11/10/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายธนิศ, นายอนุสรณ์,, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		AVR บ้านยางสูง
2	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		AVR หนองรี
4	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทปร.		AVR หนองรี
5 ย้ายโหลด BOP04 ไปรับไฟจาก BOP05 บ้านหนองไม้เอื้อย							
6	BOP04S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.		SF6 สีแยกหนองปรือ
7	BOP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
8 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
9	ดิส ชค. BOP04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ปิมน้ำมันหนองรี
10 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
11 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
12 แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้							
13	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทปร.		AVR หนองรี
14	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทปร.		AVR หนองรี
15	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		AVR บ้านยางสูง
16	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
17 -เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
18 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
19 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
20	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		AVR บ้านยางสูง
21	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
22	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทปร.		AVR หนองรี
23	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทปร.		AVR หนองรี
24	ดิส ชค. BOP04	ปลด	สับ		บพล.		DIS ปิมน้ำมันหนองรี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP05 บ้านหนองไม้เอื้อย						
26	BOP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
27	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		สื่แยกหนองปรือ
28	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
29	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		AVR บ้านยางสูง
30	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		AVR หนองรี
31	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		AVR หนองรี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

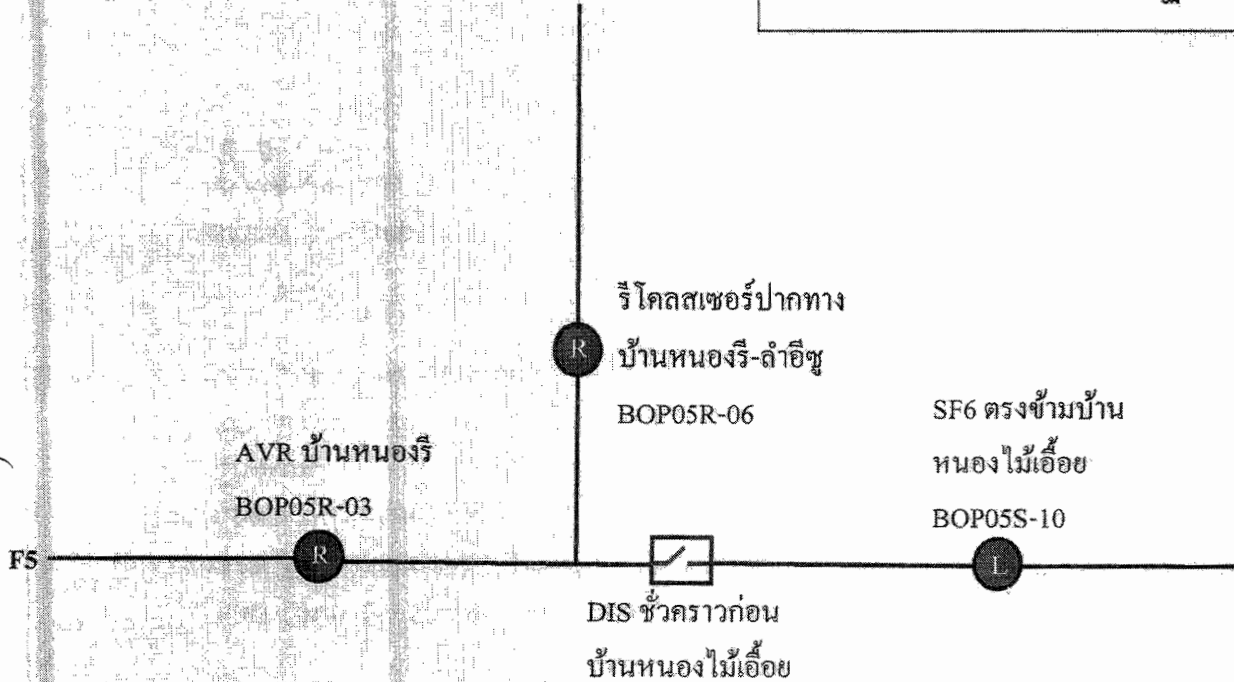


จุดที่ปฏิบัติงาน

DIS ชั่วคราว ข้างบึงน้ำมัน  
หนองรี F4

บ้านหนองไม้เอื้อย  
BOP04S-12

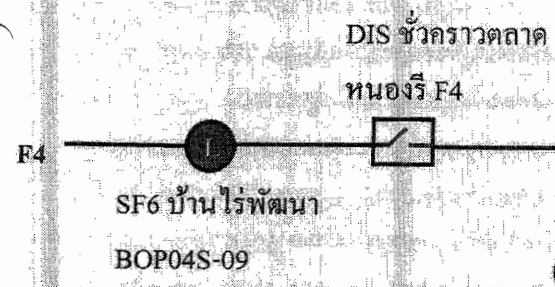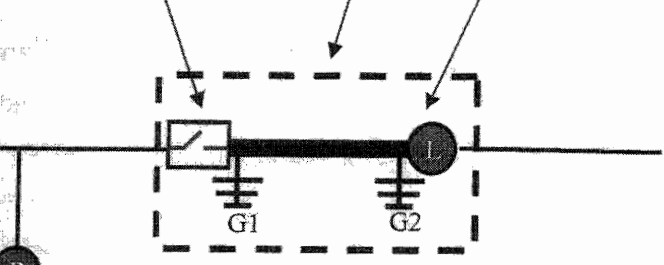

รีโกลสเซอร์ปากทาง  
บ้านหนองรี-หนองกร่าง  
BOP04R-02

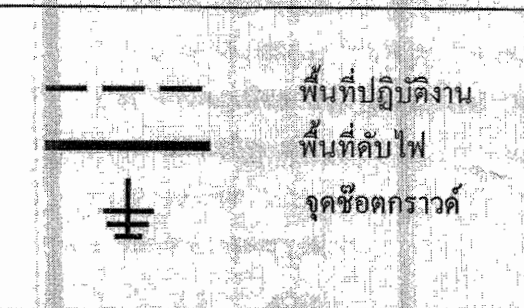

*(Handwritten signature)*
