



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ท.ร.(กบ.) 901/๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ น่วมตร

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้า
พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PTU03	8 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตระครี่ เอน	DIS (ชั่วคราว หน้าวิริยะ คอนกรีต)	PTU3S-12 (๑๔.๓๕๖๒)	นายศิริพงษ์ ทาเครือ ๐๘-๗๔๐๕๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้เข้าไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) นวนหมู่ที่ ๒ ต.ตระครี่เอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง หน.กบ. โทร ๐๘-๑๕๓๒๕๗๐๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ น่วมตร.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ PTU03 จาก DIS (ชั่วคราว) หน้าวิริยะ คอนกรีต ถึง PTU3S-12
ในวันที่ 8 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 134/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อ.ไพฑูริย์ ทองดี

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นครพนมพิทักษ์ เวชตรียานนท์

นครพนมพิทักษ์ เวชตรียานนท์
(๐๘-๑๕๓๒๕๗๐๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

305

เรียน ผจก. กฟส.ท่าเรือ

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๓๗ - 4 ก.พ. 2562


(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนโพรง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 134/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย		วันที่ 31 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กพ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 08.30 น.							
1	PTU03VB-01	Auto	Manual		PTU	SCADA	- -
2	ตรวจสอบ SF6 รหัส PTU03S-12(วัดตะคร้ำเอน) อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล๊อคคาน						
3	Dis ชั่วคราวไลน์ PTU03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ท่าเรือ		DIS หน้าวิริยะคอนกรีต
4	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กฟส.ท่าเรือ. ทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้ง กฟส.ท่าเรือ. ปฏิบัติงานได้						
8	PTU03VB-01	Manual	Auto		PTU	SCADA	- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	กฟส.ท่าเรือ.ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
10	PTU03VB-01	Auto	Manual		PTU	SCADA	- -
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	Dis ชั่วคราวไลน์ PTU03	ปลด	สับ		ท่าเรือ		DIS หน้าวิริยะคอนกรีต
14	ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส PTU03S-12(วัดตะคร้ำเอน)						
15	PTU03VB-01	Manual	Auto		PTU	SCADA	- -
สิ้นสุด Switching							

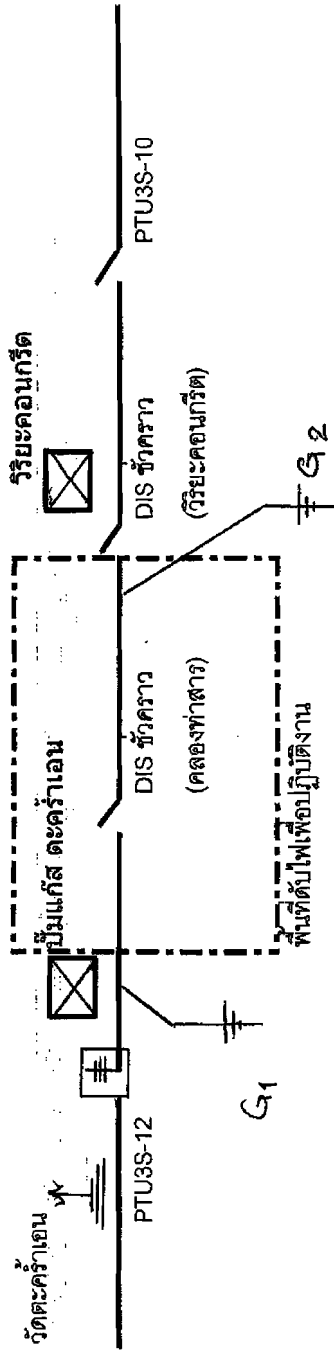

แผนผังดับไฟ วันที่ 8 กพ. 2562
 ช่างระบบจำหน่าย ช่างป้อมแก๊สตะคร้ำเอน ถึง วิริยะคอนกรีต

19 ม.ย. 61 30 ม.ย. 61
 O/S



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กบ)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กบ

ตามอนุมัติที่ ก.๓.กาว.(ปร.) ๒๑๐๔ /๒๕๖๐ ลว. ๒๘ ธค. ๖๐ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องานบริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หมายเลข
งาน I-614-ARNE.41.1M05 ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปีกเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๔ ต้น

๒. ปีกเสา ต่อม่อ ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ ม. จำนวน ๔ ต้น

๓. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๗ กพ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง วิริยะคอนกรีต

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

ผ.กบ. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศัพทภัทร์ บัณฑิต)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)

ผ.กบ.กฟส.ท่าเรือ

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

เริ่มต้น

กฟฟ. เจ้าของพื้นที่ กำหนดขอบเขตรายละเอียดงาน
/กรณี กกค.(ก๓)เป็นเจ้าของงาน ต้องร่วมกำหนดรายละเอียดงาน
กับ กฟฟ.หน้างาน

กฟฟ.เจ้าของพื้นที่ ขออนุมัติแผนดับไฟฟ้าทำงาน
พร้อมรายละเอียดแผน **Switching** จุดทำกราวด์และผู้รับผิดชอบทำกราวด์
พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบเพื่อร่วมตรวจสอบวันทำงาน

กฟฟ.เจ้าของพื้นที่ / กกค. (ก๓)
จัดประชุมชี้แจงแผนงานต่างๆให้ชุดงานที่ร่วมปฏิบัติงานทราบ
และชี้แจง ณ สถานที่ทำงานจริงให้ทุกชุดงานทราบ

กฟฟ.เจ้าของพื้นที่ ขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้า แบบระดมชุดงาน
โดยต้องแนบรายละเอียดงาน และ Check List (C3 Safety CAP 01)ทุกครั้ง

สิ้นสุด
