



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

๒๓.๑.๖๒

**ส่งแล้ว**

0 MS. / *hnt*

เลขที่ ก.๓ กทบ.(บ.) ๒๓๑๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักทพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นางนวลปราง ระงับพิศม์

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้าเพื่อกระทุ้มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณไลน์แยกหมู่น้ำวนเข้าหมู่บ้านพัฒนาชัย (ซอยต๋อยฯ) .....ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....=๒๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๖ KTA	๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิล จาก ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิล ขนาด ๑๘๕ ต.มม.	DIS KTA ๖5-๐๙ ไลน์แยก ม.พัฒนาชัย	ปลายสายสุดซอย	นายนพพร ชาวไชยศรี วทก.๖ ผกส. โทร. ๐๘๗-๖๗๑๕๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มานันต์พิศม์ ตำแหน่ง นพ.บป.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๘๙๔๔๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง     ๑.๑ มีโอกาสชำรุด     ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง

(...นางนวลปราง ระงับพิศม์...)

ตำแหน่ง ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTA6 จาก KTA 65-09 ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1๐49

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *พท. วา นวล ระงับพิศม์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ทายนนธ* *ชาวไชยศรี*

*สมพร ตันตังเกตรกิจ*  
(วทก. 6 แทน นพ.อภ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 2749

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ผจพ. (สถานี .....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถพงศ์ แก่นจันทร์)

- 1 ต.ค. 2562

ชก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.บป.(วว)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านพัฒนาชัย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1349/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชสุริยนิม		วันที่ 30 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		L=2.7MW.
3	KTA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หมู่บ้านพัฒนาชัย
4	เมื่อชุด Hotline กระจายพร้อมทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านพัฒนาชัย						
5	แจ้งชุด Hotline กระจายทำการปลดจุดจัมจุด A บริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านพัฒนาชัย						
6	เมื่อชุด Hotline กระจายทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านพัฒนาชัยแล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
10	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
15	แจ้งชุด Hotline กระจายทำการเชื่อมจุดจัมจุด A บริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านพัฒนาชัย						
16	เมื่อชุด Hotline กระจายทำการเชื่อมจุดจัม A บริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านพัฒนาชัยแล้วเสร็จ						
17	KTA06S-09	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หมู่บ้านพัฒนาชัย
18	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดัดแปลง บริเวณโคม์แยกเข้าหมู่บ้านพัฒนาชัย (ชื่อย่อภายในแผนผังเครือข่ายอื่น)

ปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิ้ลเมนได้ใหม่จากขนาด ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิ้ลขนาด ๑๕๕ ต.มม.

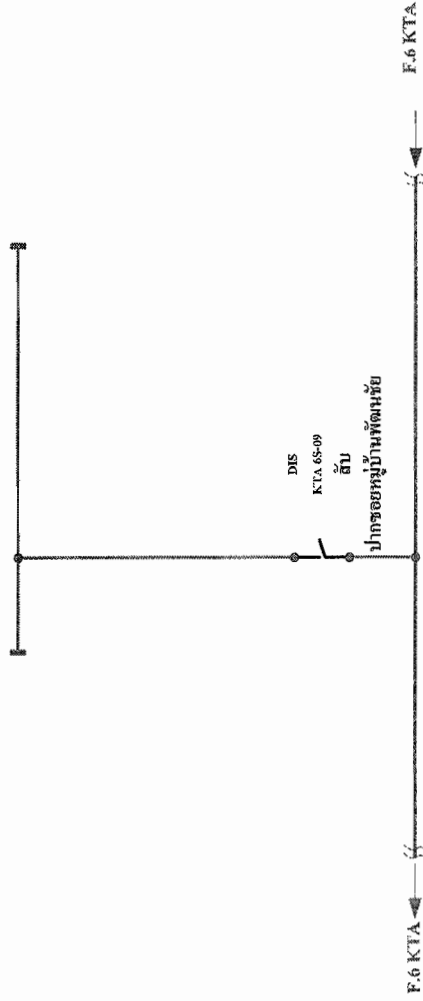


หมายเหตุ มิติไฟฟ้ารับผลกระทบประมาณ 500 ราช

แผนผังสถานะปัจจุบัน ขีดตั้งค้ำไป บริเวณโหนดแยกเข้าหมู่บ้านพัฒนาชัย (ชอยค้ำยก้าแพงเพชรอัครโยธิน)

ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิลเมนไลน์จากขนาด ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิลขนาด ๑๔๕ ต.มม.

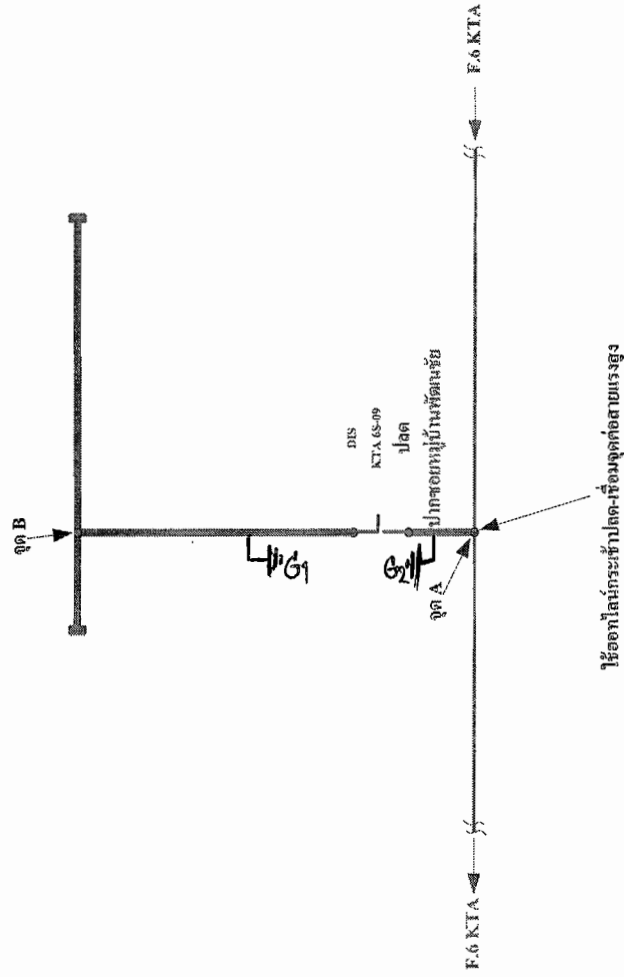

หมายเหตุ มีผู้เข้ามารับผลกระทบประมาณ 500 ราย

พื้นที่ตั้งไปปฏิบัติงานตั้งจุด A ถึง จุด B

เริ่มขี้นขี้น้ำจาลอไลไฟัดตงร์ 6 กทบ.1 ดับไฟนปฏิบัติงตงตั้งจุด A ถึงจุด B
