



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25/09/67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.)๑๓๓๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธรณ์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนือ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค.) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SLY๐๘	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณแยกห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.)	- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรมล	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายมานิช สารานูจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑
๒	SLY๐๔	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY04S-03	- BEU03S-04 - SLY04S-04	
๓	BEU๐๑	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้าสถานี	- BEU01S-07	
๔	BEU๐๒	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU02VB-01	- BEU02S-02 - Dis ชั่วคราว ร้านโอบอวอล	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ ปากซอยมะเกลือ ๑ ถึง ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (ชค.)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรมาโมทย์ เบลุจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๔๖๘๔๕ Long ๑๐๐.๒๘๖๓๕๒๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๙๖๘๗๒๗ Long ๑๐๐.๒๘๑๒๓๗๘

(นายมานิช แนนเนือ)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกห้วยพลู แนวนถนนศาลายา - บางภาษี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 67	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1384/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม		วันที่ 21 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
4	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
5	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
6	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
7	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
8	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดบางพระ
9	ย้ายโหลด SLY 4 ไปจ่ายจาก NCB 10 (NCB 3 ผ่ากโหลดไว้กับ NCB 10 อยู่)						
10	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
11	SLY04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SCADA	SF6 วัดมะเกลือ
12	ตรวจสอบ BEU2VB-01 สถานะ OPEN ไว้อยู่						
13	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.2
14	ให้ กฟส.บล.ตรวจสอบ BEU2S-02 SF6 ตรงข้ามสถานีฯบางเลน 2 สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
15	ให้ กฟส.พทท.ตรวจสอบ BEU3S-04 SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พาณิชย์ สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
16	ให้ กฟส.พทท.ตรวจสอบ SLY4S-05 SF6 คลองขอยบน สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
18	DIS ชั่วคราว SLY 8	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ชั่วคราวปากซอยศรีกรมล
19	DIS ชั่วคราว BEU 2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ชั่วคราวร้านโอบอล
20	SLY04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS คลองขอยบน
21	DIS ชั่วคราว BEU 1	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามสถานีฯบางเลน 2
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
23	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
24	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
25	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
26	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
27	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G5						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G6						
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G7						
30	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
32	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
33	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
34	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
35	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
36	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
37	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
38	NCB10R-01	Nonreclosing	Normal		นช.		R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
40	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
41	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
42	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
43	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G5						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G6						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G7						
47	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
48	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
49	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
50	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
51	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
52	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
53	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดบางพระ
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
55	DIS ชั่วคราว SLY 8	ปลด	สับ		พทท.		DIS ชั่วคราวปากซอยศรีกรมล
56	DIS ชั่วคราว BEU 2	ปลด	สับ		พทท.		DIS ชั่วคราวร้านโอบอล
57	SLY04S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS คลองซอยบน
58	DIS ชั่วคราว BEU 1	ปลด	สับ		บล.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามสถานีบางเลน 2
59	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.2
60	ย้ายโหลด SLY 4 กลับจาก NCB 10 (NCB 3)						
61	SLY04S-03	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 วัดมะเกลือ
62	NCB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณ แยกหัวพุดู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท. - บล.)

**ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ป.ระบบจำหน่าย 22 เควี. ได้แนวสายส่ง 115 KV. **

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

จุดตัดคร่าวๆ / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2	หม้อแปลงหน้าร้านโอบอวล (วงรอบบน+ล่าง) 13.8847613,100.2862991
G3 G4	หม้อแปลงแก้มบึงนาคก่อสร้าง (วงรอบบน+ล่าง) 13.8930104,100.2826635
G5	จุดปอกสาย (วงรล่าง) 13.8853032,100.2849697
G6	จุดปอกสาย (วงรอบบน) 13.8854178,100.2852489
G7	หน้าร้านแม่ช่าคอน (วงรล่าง) 13.8835344,100.2873077

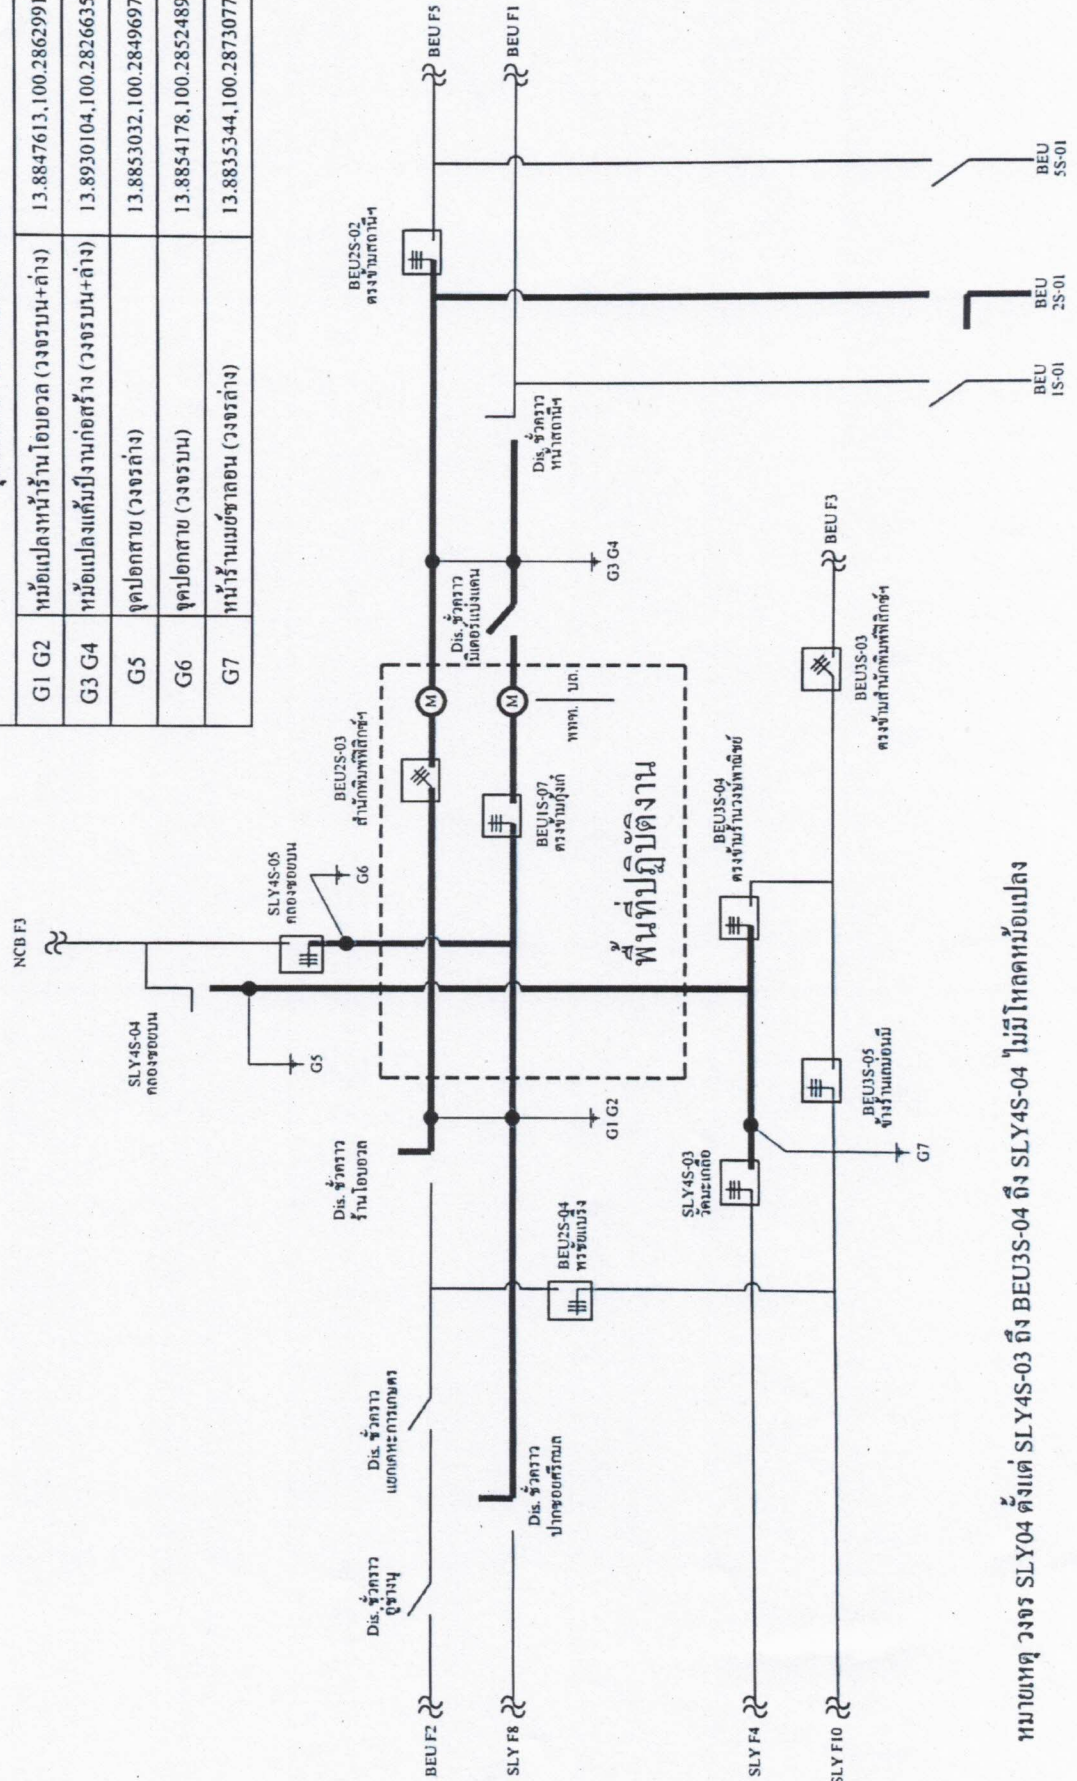

หมายเหตุ วงจร SLY 04 ตั้งแต่ SLY 4S-03 ถึง BEU 3S-04 ไม่มีโหลดหม้อแปลง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธรมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอติดตั้งกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟส.พุทธรมณฑล


วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พุทธรมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานติดตั้งกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณริมถนนศาลายา - บางภาษี (นร.๓๐๐๔) ผังขาออก ช่วงแยกเข้าห้วยพลู(ร้านเลม่อนมี) ถึง มิเตอร์แบ่งแดน หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๑๔ ต้น พร้อมปรับปรุงหัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ SAC ๒ วงจร ระยะทาง ๐.๘๐๐ วงจร-กม. เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ(ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟอ.พุทธรมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมายให้ นายมานพ สำราญจิตร พชง.๗ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย มั่งคิลป์)

ผ.ก.ส.กฟส.พุทธรมณฑล

ก.๓ พทท.(กส) ๑๒๕๖/๒๕๖๗

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป



(นายมานนช แนนเื้อ)

ผจก.กฟส.พุทธรมณฑล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พทุมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๗/๒๕๖๗


วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า


เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พทุมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ริมถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ แยกไฟแดงห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.) ซึ่งจะดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้า ๑๘๕SAC จำนวน ๒ วงจร ระยะทางประมาณ ๐.๘๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาพรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พทุมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์)
ชม.ปบ.กฟส.พทุมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ


(นายมานน นวนนือ)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พทุมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานบ.ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ริมถนนศาลายา-บางภาษี (ขาออก).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...บริเวณ แยกไฟแดงห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา...๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา...๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ
ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายมานพ...สำราญจิตร.....
ตำแหน่ง..... พชง.๗.ผกส.กฟอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
.....ชุดงาน ผกส. ผบ.กฟส.พุทธมณฑล และ ชุดงานระดมจาก กฟฟ.ข้างเคียง

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ ..นายปราโมทย์ เเบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดเฉพาะกิจ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 ผู้รับผิดชอบ...ชุดเฉพาะกิจ ผบ.ป.
จุดที่ ๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓.....
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) - /๒๕๖๗ , ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(สน.) ๑๒๔๙/๒๕๖๗ , ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๓/๒๕๖๗ , ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จตุวารณ ตนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน ๒๕๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , รจก.(ท) , ผบ.ปบ. , ผ.กส. , ชม.ปบ , จป.ว. , พชง.ควบคุมงาน

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
 จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

