



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.บส.(นบ.) ๑๐๒๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลมัย

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                  | จาก       | ถึง                           | ผู้ควบคุมงาน                                   |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------|-------------------------------|--|
| ๑.  | 08 SLY   | 13 ต.ค. 62   | 08.00 น.    | 17.00 น. | พาดสายแรงสูง ไปสถานี<br>บางเลนชั่วคราว บางเลน 2 | SLY08R-01 | Dis ชั่วคราว<br>สถานีหลักใหม่ | นายขวัญเมือง ศรีจันทร์<br>อินทร์<br>พชง. กฟผ.๓ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัทอาร์เอ็ก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หน.นบ. โทร ๐๘๙๙๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Handwritten signature)*

(นายสงวน นาคลมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY8 จาก SLY8R-01 ถึง Dis ชั่วคราวสถานีหลักใหม่

ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 19/6

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง  
2 ต.ค. 62

*(Handwritten signature)*  
(วศก. 6 แทน หน.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2780

เรียน ผจก. กฟผ. บล.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Handwritten signature)*

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 4 ต.ค. 62

อก.ปบ.(ก.๓)

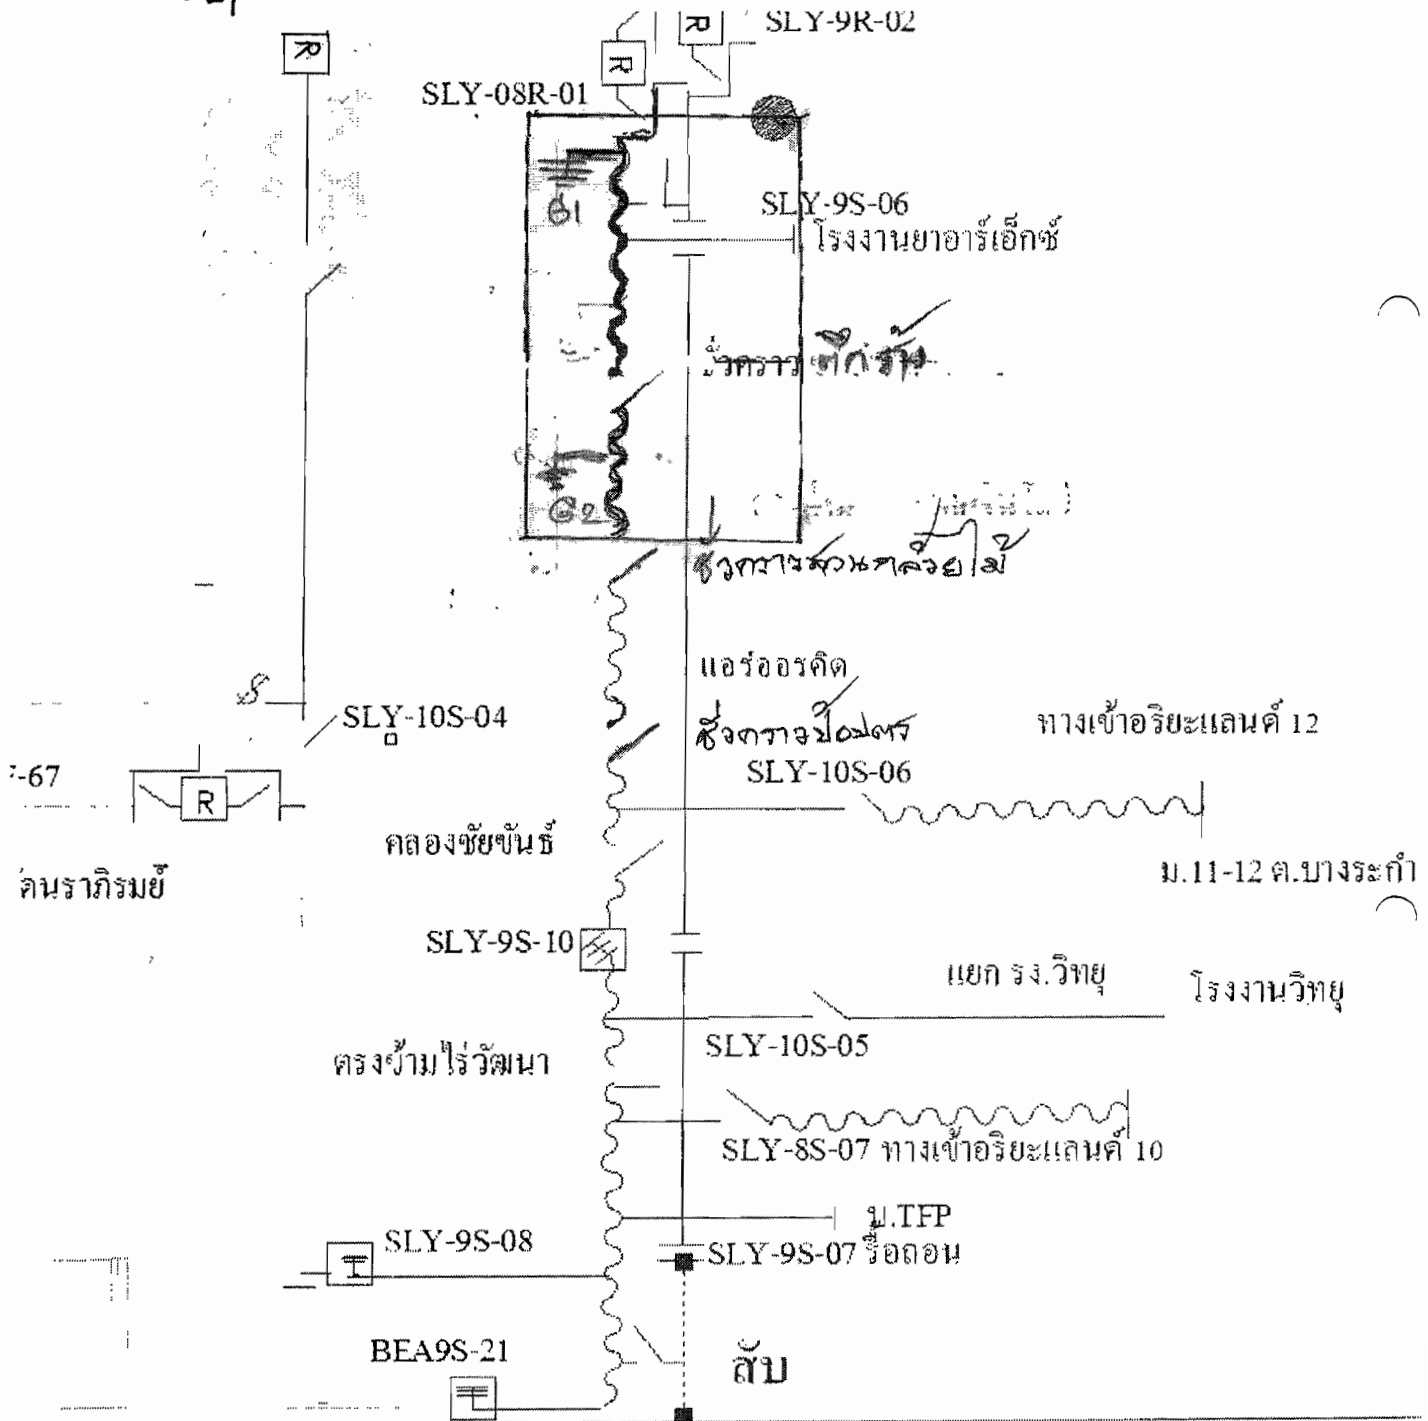
## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                |   |               |    |
|------------------------|--|----------|----------------|---|---------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณตรงข้ามร้านกึ่งเก้ - สวนกล้วยไม้   |          |                |   |               |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 13 ต.ค. 62   | ระหว่าง  | 08.00 น.       | ถึง   | 17.00         | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | บล.  | งานที่ทำ | ปักเสา, พาดสาย | ตามใบขอปฏิบัติงาน   | 1416/62       |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกข์พันธ์  |          |                | วันที่  | 3 ตุลาคม 2562 |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                | วันที่  | 3 ต.ค. 62     |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                | วันที่  | 4 ต.ค. 62     |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโษ<br>3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ |          |                | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |               |    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1   | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด                             |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 2   | BEA-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                    |
| 3   | BEA09R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |
| 4   | SLY-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                    |
| 5   | SLY08R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | พมท.         |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 6   | SLY10R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | พมท.         |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| 7   | ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06                               |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 8   | SLY09S-08  | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 9   | DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา  | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | บล.          |            | DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา  |
| 10  | DIS ชั่วคราว SLY08   | ล๊ับ                                 | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS สวนกล้วยไม้      |
| 11  | SLY09S-08  | ล๊ับ                                 | ปลด                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 12  | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.                             |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 13  | SLY08R-01  | ล๊ับ                                 | ปลด                  |      | พมท.         |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 14  | แจ้ง กฟอ.บล. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส    |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 15  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1                   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 16  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2                   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 17  | แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้ |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 18  | BEA-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                    |
| 19  | BEA09R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |

| ที่                               | รหัสอุปกรณ์                                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 20                                | SLY-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                    |
| 21                                | SLY10R-01                                       | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | พมท.         |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b> |   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 22                                | เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ      |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 23                                | BEA-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                    |
| 24                                | BEA09R-01                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |
| 25                                | SLY-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                    |
| 26                                | SLY10R-01                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | พมท.         |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| 27                                | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1         |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 28                                | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2         |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 29                                | จ่ายไฟคืนสู่ระบบ                                |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 30                                | สับไบมิตด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 31                                | SLY08R-01                                       | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing  | ALT  | พมท.         |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 32                                | ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06                |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 33                                | SLY09S-08                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 34                                | DIS ชั่วคราว SLY08                              | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          |            | DIS สวนกล้วยไม้      |
| 35                                | DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา                             | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา  |
| 36                                | SLY09S-08                                       | สับ                                  | ปลด                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 37                                | BEA-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                    |
| 38                                | BEA09R-01                                       | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |
| 39                                | SLY-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                    |
| 40                                | SLY08R-01                                       | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | พมท.         |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 41                                | SLY10R-01                                       | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | พมท.         |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| <b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>  |   |                                      |                      |      |              |            |                      |

SLY10R-01



SLY-9R-02

SLY-08R-01

SLY-9S-06

โรงงานยาอาร์เอ็กซ์

แอร์ออร์คิด

ตู้ควบคุมระบบควบคุม

ทางเข้าริยะแลนค์ 12

SLY-10S-04

SLY-10S-06

ม.11-12 ค.บางระกำ

7-67

คณกรณขัยขันซี

คณกรณขัยขันซี

SLY-9S-10

แยก รง. วิฑู

โรงงานวิฑู

ตรงข้ามไร่วัฒนา

SLY-10S-05

SLY-8S-07 ทางเข้าริยะแลนค์ 10

SLY-9S-08

ม. TFP

SLY-9S-07 รือถอน

BEA9S-21

สับ
