

2832



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(นบ) 1917/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่ม้อย

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน  
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ หน้า ม.พรมพิทักษ์ สาย ๔ จนถึง แยกสายสี่(ฝั่งถนนเพชรเกษม) ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY06 (วงจรบน)	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน พุทธมณฑลสาย ๔	HLตัด ODE สะพานลอย ม.พรมพิทักษ์	OND02S-07	นายเพ็ช พูนเพิ่ม พชง.๗ ๐๘ ๑๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	OND02 (วงจรบน)	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตั้งแต่ หน้า ม.พรม พิทักษ์ สาย ๔ จนถึง	- OND02S-07	OND02S-14	
๓.	OND02 (วงจรล่าง)	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แยกสายสี่(ฝั่งถนน เพชรเกษม)	DISชั่วคราวหน้า สะพานลอย ม.พรมพิทักษ์	OND02S-15	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.พรมพิทักษ์ ม.สุภาออร์คิด ร้านเจริญเจริญค้าไม้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๕.ผบ. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* ธีรพงษ์ สม. 1197 พ.พ.ท. กว.ก.ผ. ๙๙ \*

(นายสาโรจน์ แซ่ม้อย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ. ออมน้อย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SLY6 จาก DPE ๙.๙๕๖๗ พัดจักร์ ถึง OND ๙๕-๐๗  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1448/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 พัดเตอร์ OND ๒ จาก DTS ๒๕๘๗๕๗ พัดจักร์ ถึง OND ๙๕-14, OND ๙๕-15  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิจฉัตร กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ วิศวกร ๒ จิตินา วัฒนโพธิ์ทอง  
10 ต.ค. 62

สมพร ชันดี กอ.๓๐๓๑๖  
( ๒๗/๑๐.๖.๑๑๗๗.๑๗. )

สำหรับผู้อนุมัติ

2832

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. 1๗๗๑.๐๗๕๕

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเสถียรพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3)


11 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ ถึง แยกสายสี่ถนนเพชรเกษม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1448/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	10 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
3	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
4	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
5	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
6	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
7	ย้ายโหลด OND 2 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB 9						
8	OND02S-17	ปลด	สับ		อมน.		SF6 โรงเหล็กทรัพย์เจริญ
9	OND02S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสติล
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
11	OND02S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ม.พงษ์ศิริชัย 2
12	OND02S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ม.พงษ์ศิริชัย 2
13	DIS ชั่วคราวไลน์ SLY 6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้า บ.สุภาออร์คิดส์
14	DIS ชั่วคราวไลน์ OND 2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวสะพานลอย ม.พรหมพิทักษ์
15	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในไลน์ SLY 6 ออกก่อนทำการตัด DDE						
16	หลังจาก กฟภ.อมน. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกเสร็จ						
17	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 22 KV. ตัด DDE ไลน์ SLY 6 บริเวณ สะพานลอย ม.พรหมพิทักษ์ วงจรขน ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
18	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 22 KV. ตัด DDE ไลน์ SLY 6 บริเวณ สะพานลอย ม.พรหมพิทักษ์ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4						
24	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
25	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
26	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-



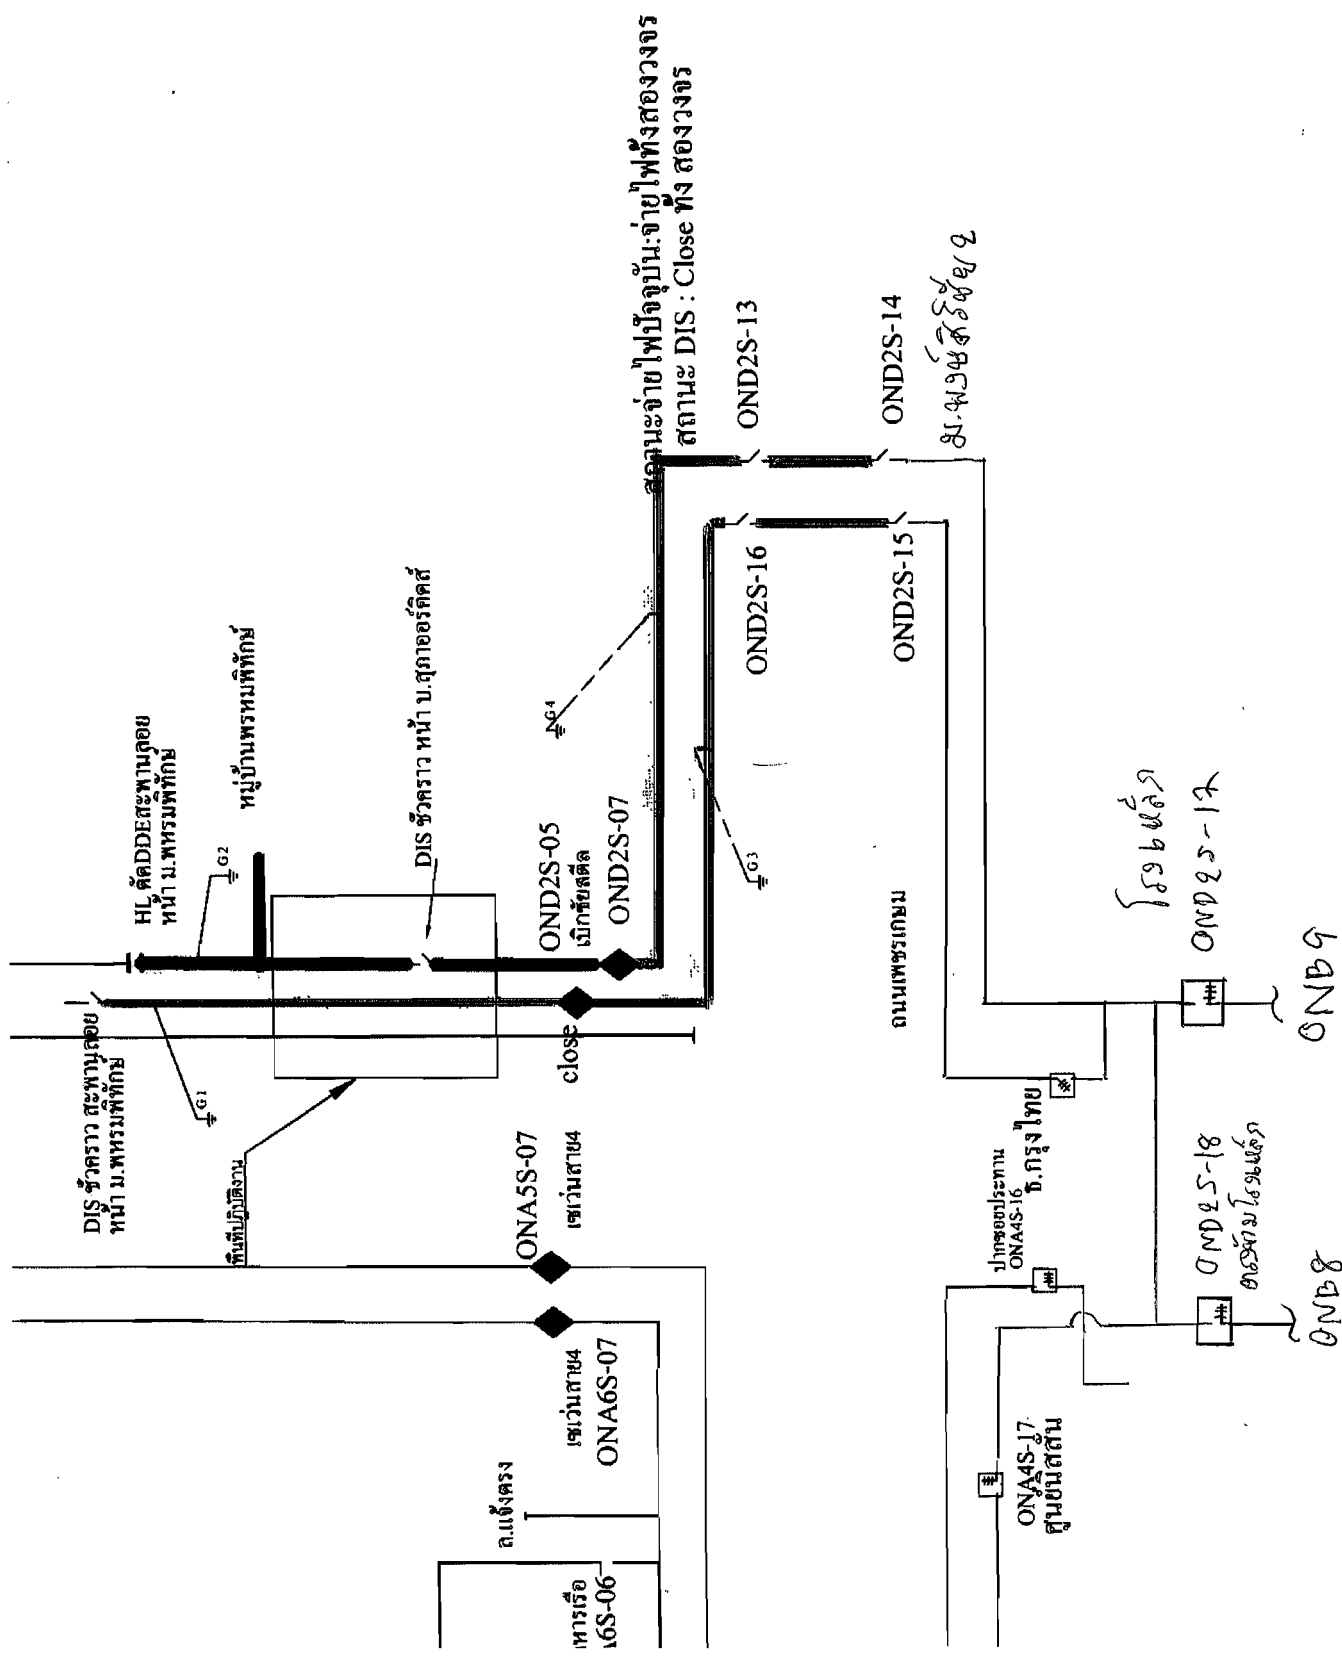

ณ.พทรมพิทักษ์ ๒

โรงเรียนต่าง

ONB8

ONB9
