



การไฟฟ้านครหลวง
METRO ELECTRICITY PUBLIC CORPORATION

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงศ์สินธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	29/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๒๓๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7,8 สท.	30/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	โทร.๐๘๖-๓๓๘๒๓๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	31/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-09	ODEปิ่นเขลย	โทร.๐๘๖-๓๓๘๒๓๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7,9 สท.	2/11/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	ODEข้ามถนน บ้านจมนบุรี	SPA07S-08	โทร.๐๘๖-๓๓๘๒๓๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๕๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผอ.ก.๓ กฟภ.๓

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓
เรียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ ทึจาวมาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ SPA7 จาก DDEP0A ถึง DDEP0B
ในวันที่ ๒๓.๑๐.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 16.50 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 184/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ วงศ์สินธุ์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(Signature)
(รจก.๕ แทน นว.๓ท.)

สำเนาผู้อนุมัติ 2965
ที่ ก.๓ กปบ.(ทพ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

อก.บช.(ก.๓) อก.กว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
Pee naco

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์)
(ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SPA07 บริเวณ SPA07S-04 SF6 ขนส่ง,DDE จุด A ถึง SPA07S-06 DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง,DDE จุด B
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.10 น. ถึง 16.50 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ก่อสร้างไลน์ 115 kv.สถานีฯสพ.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1484/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกานูจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี,บางปลาหม้า						
2	SP-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ		
3	SPA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
4	SPA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
5	SPA10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
6	BAM-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		BAM		
7	BAM07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BAM		
8	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก SPA09						
9	DIS ชค.ไลน์ SPA07	ปลด	สับ		รตสพ-		DIS สนามกีฬาากลางแห่งที่2
10	SPA07S-06	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รตสพ-		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
11	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก SPA10						
12	SPA07S-05	ปลด	สับ		รตสพ-		SF6 ลานจอดรถโรงพยาบาล
13	DIS ชค.ไลน์ SPA07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รตสพ-		DIS วัดท่าโขลง
14	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก BAM07						
15	BAM07S-05	ปลด	สับ		รตสพ-	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
16	DIS TIL SPA07-BAM07	ปลด	สับ		รตสพ-		DIS วัดโพธิ์ค้อย(ถนน340)
17	DIS ชค.ไลน์ SPA07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รตสพ-		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
18	SPA07S-04	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รตสพ-		SF6 ขนส่ง
19	- ตับไฟไลน์ SPA07 เวลา 08.10 น.						
20	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 ออกก่อนทำการตัด DDE.จุด B (ดูตามแผนผังแนบ)						
21	หลังจากกฟจ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 เสร็จเรียบร้อย (ก่อนทำการตัด DDE.จุด B)						
22	แจ้ง Hot Line 22 kv.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA07 จุด B บริเวณตึ๊งข้ามถนนวัดโพธิ์นางเทราได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA07 จุด B บริเวณตึงข้ามถนนวัดโพธิ์นางเทราเสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 ออกก่อนทำการตัด DDE.จุด A (ดูตามแผนผังแนบ)						
25	หลังจากกฟจ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 เสร็จเรียบร้อย (ก่อนทำการตัด DDE.จุด A)						
26	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA07 จุด A บริเวณแยกถนนเลี้ยวเมืองใต้						
27	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA07 จุด A บริเวณแยกถนนเลี้ยวเมืองเสร็จเรียบร้อย						
28	DIS ชด.ไลน์ SPA07	ปลด	สับ		รตสพ-		DIS วัดโพธิ์นางเทรา*จ่ายถึงDDE.จุด B
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สุพรรณบุรีรับทราบ						
30	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
31	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G1						
32	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G2						
33	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G3						
34	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G4						
35	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
36	SP-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ		
37	SPA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
38	SPA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
39	SPA10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
40	BAM-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		BAM		
41	BAM07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BAM		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
42	หลังจากกฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
43	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
44	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
45	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
46	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
47	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี,บางปลาม้า						
48	SP-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ		
49	SPA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
50	SPA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
51	SPA10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		
52	BAM-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		BAM		
53	BAM07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BAM		
54	- จ่ายไฟไลน์ SPA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	แจ้ง Hot Line 22 kv.ทำการจี้ DDE.ไลน์ SPA07 จุด A บริเวณแยกถนนเลี้ยวเมืองใต้						
56	หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการจี้ DDE.ไลน์ SPA07 จุด A บริเวณแยกถนนเลี้ยวเมืองเสร็จเรียบร้อย						
57	DIS ชค.ไลน์ SPA07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถสพ-		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
58	แจ้งกฟพ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 ออกก่อนทำการจี้ DDE.จุด B (ดูตามแผนผังแนบ)						
59	หลังจากกฟพ.สุพรรณบุรีปลดโหลดไลน์ SPA07 เสร็จเรียบร้อย (ก่อนทำการจี้ DDE.จุด B)						
60	แจ้ง Hot Line 22 kv.ทำการจี้ DDE.ไลน์ SPA07 จุด B บริเวณตี่งข้ามถนนวัดโพธิ์นางเทราได้						
61	หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการจี้ DDE.ไลน์ SPA07 จุด B บริเวณตี่งข้ามถนนวัดโพธิ์นางเทราเสร็จเรียบร้อย						
62	แจ้งกฟพ.สุพรรณบุรีนำโหลดไลน์ SPA07 เข้าได้ทั้งหมด						
63	- ย้ายโหลด SPA07 กลับคืนจาก BAM07						
64	SPA07S-04	ปลด	สับ		รถสพ-		SF6 ขนส่ง
65	DIS ชค.ไลน์ SPA07	ปลด	สับ		รถสพ-		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
66	DIS TIL SPA07-BAM07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถสพ-		DIS วัดโพธิ์ค้อย(ถนน340)
67	BAM07S-05	สับ	ปลด		รถสพ-	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
68	- ย้ายโหลด SPA07 กลับคืนจาก SPA10						
69	DIS ชค.ไลน์ SPA07	ปลด	สับ		รถสพ-		DIS วัดท่าโขลง
70	SPA07S-05	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถสพ-		SF6 ลานจอดรถโรงพยาบาล
71	- ย้ายโหลด SPA07 กลับคืนจาก SPA09						
72	SPA07S-06	ปลด	สับ		รถสพ-		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
73	DIS ชค.ไลน์ SPA07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถสพ-		DIS สนามกีฬาากลางแห่งที่2
74	SP-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ		
75	SPA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
76	SPA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
77	SPA10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		
78	BAM-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		BAM		
79	BAM07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BAM		
%%%%%%%%%% ลิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ททบ.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(บ.บ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.


ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disห้องเย็นสองพี่น้อง - SPA๐๗S-๐๔ เพื่อ ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง ๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒ โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ...๗... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ... Disห้องเย็นสองพี่น้อง-SPA๐๗S-๐๔

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้อนุญาตให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง...ชุดก่อสร้างเขต...เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๔๗๗๘๘๘...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง...ผจก.กฟภ.สพ.เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๓-๘๕๖๖๕๗๘...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

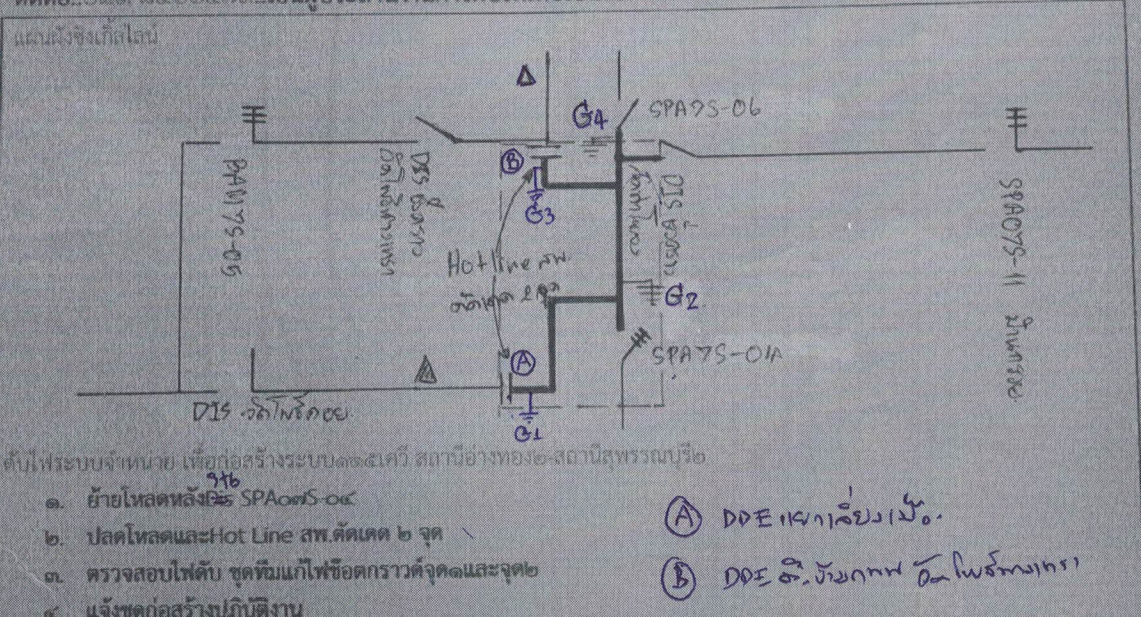

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

นายไพโรจน์ สวัสดิ์ขยายกร
(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ขยายกร)

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พงษ.๗ ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา รจก.(ท) รักษาการแทน
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๖๗๘, ๐๔๘๕๕, ๐๔๘๖๖ กฟภ.สพ.
