



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 114 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ชัยศรี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รวท.ท.ก.ท.ง.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี
๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	29/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๔๓๒๓๔๔ นายไอลาส บุตรบรรเทิง
๒.	7.1 สท.	30/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Dis.ชั่วคราว คือสายที่ใหม่ ซึ่ง Dis.ชั่วคราว จัดสายกริ่งมัดดี	SPA07S-06 SPA7S-08	โทร.๐๘๖-๓๓๔๓๒๓๔๔ นายไอลาส บุตรบรรเทิง
๓.	8 สท.	30/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DOE จันทาน บ้านจามบุรี	DOE จ.สุพรรณบุรี	โทร.๐๘๖-๓๓๔๓๒๓๔๔ นายไอลาส บุตรบรรเทิง
๔.	7,9 สท.	2/11/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DOE จันทาน บ้านจามบุรี	SPA07S-08	โทร.๐๘๖-๓๓๔๓๒๓๔๔ นายไอลาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงช.๗(สท.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ชัยศรี)
ตำแหน่ง รวท.ท.ก.ท.ง.สท.
สจล.สท.ท.ง.สท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศทพ.) กทล.๓
เรียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ศทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ SPA7 จาก DU ฝั่งขวา สถานี กทม.๒๖๒
ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 16.50 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1485/62
ถึง SPA7S-06, SPA7S-08

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 พิดเตอร์ SPA8 จาก DOE ก.๓ A ถึง DU ฝั่งขวา รั้วสายกริ่งมัดดี
ในวันที่ 3๐ ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 16.5๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ไพโรจน์ ทองชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไอลาส บุตรบรรเทิง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ชัยศรี)
ตำแหน่ง รวท.ท.ก.ท.ง.สท.

สำหรับข้อมูล

2964

ที่ ก.๓ กบ.บ.(ศทพ.)

เรียน ผจก. กฟล.สท.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นศ.ป.ร.บ.

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงศ์ เนกกันจันทร์)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน Dis ชั่วคราวสนามกีฬาแห่งชาติ 2(SPA07) -SPA7S-06(ห้องเย็นสองพี่น้อง)-Dis ชั่วคราววัดราษฎร์สามัคคี(SPA08) DDE จุด A
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30-ต.ค.-62 ระหว่าง 08.10 น. ถึง 16.50 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1485/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 23 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายฤชณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิช นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
6	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
7	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09							
9	SPA07S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
10	DIS ชั่วคราว โล้น SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สนามกีฬาแห่งชาติ 2
ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02							
12	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
13	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
14	DIS ชั่วคราว โล้น SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดราษฎร์สามัคคี
15	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
เมื่อพร้อมดับไฟและทำการตัด DDE เวลา 08.10 น.							
16	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
17 แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกทั้งหมด							
18 หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกทั้งหมดแล้วเสร็จ							
19 แจ้ง กฟจ.สพ.. ให้ขอทไลน์กระเช้า ทำการปลด DDE จุด A ตามผังแนบออกทั้งสามเฟส							
20 หลังจาก กฟจ.สพ.. ให้ขอทไลน์กระเช้า ทำการปลด DDE จุด A ตามผังแนบออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
21 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ							
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					สพ.	
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					สพ.	
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3					สพ.	
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4					สพ.	
26 แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
27	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
29	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
31	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
32	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
33	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
34	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
35	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
37	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
38	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
39	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
40	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
41	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				สพ.		
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				สพ.		
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3				สพ.		
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4				สพ.		
46	แจ้ง กฟพ.สพ.. ให้ขอทไลน์กระแสเข้า ทำการจัม DDE จุด A ตามผังแนบเข้าทั้งสามเฟส						
47	หลังจาก กฟพ.สพ.. ให้ขอทไลน์กระแสเข้า ทำการจัม DDE จุด A ตามผังแนบเข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
48	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ท่องเย็นสองพี่น้อง
49	**ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับคืนจาก SPA09**						
50	DIS ชั่วคราว โล้น SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS สนามกีฬาแห่งที่ 2
51	SPA07S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
52	**ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับคืนจาก BAM02**						
53	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
54	DIS ชั่วคราว โล้น SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดราษฎร์สามัคคี
55	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
56	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
57	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
58	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
59	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
60	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
61	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
62	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
63	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พต.บป.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.


ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖ เพื่อ สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒. โดยมีรายละเอียดที่ติดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ๗.๘. สถานี สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖ กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง...ผ.กส.กฟภ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบผังซึ่งเก็สไล่น

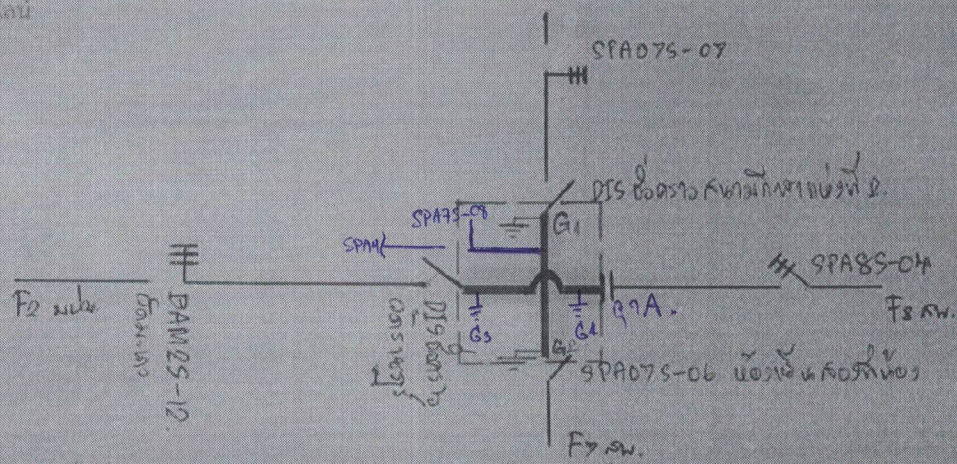

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดหลังDis SPA๐๗S-๐๖และDisชั่วคราววัดราษฎร์
๒. ปลดโหลดและHot Line สท.ตัดเคอร์ ๑ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ ผบ.กฟภ.สพ.

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์อักษร)
รจก.(ท) จักขการแทน
ผจก.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๘๘๕๕, ๑๘๘๖๐
