



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ รัชพันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ตากร

Building Deadline

30 ต.ค. 62

ส่งแล้ว

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ท.ฟ.ล.ส.ท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิกัดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------------|--------------|-------------|---------|---|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| ๑. | 7 สท. | 29/10/62 | 08.10 | 16.50 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S-06 | SPA07S-04 | โทร.๐๘๖-๓๓๘๑๓๑๔๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง |
| ๒. | 7,8 สท. | 30/10/62 | 08.10 | 16.50 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว พื้นที่ก่อสร้าง | SPA07S-06 | โทร.๐๘๖-๓๓๘๑๓๑๔๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง |
| ๓. | 7 สท. | 31/10/62 | 08.10 | 16.50 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S-09 | DDEบีเมเซลล์ | โทร.๐๘๖-๓๓๘๑๓๑๔๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง |
| ๔. | 9 สท. | 13/11/62 | 08.10 | 16.50 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | DDEข้ามถนน บ้านจามจรี | SPA07S-08 | โทร.๐๘๖-๓๓๘๑๓๑๔๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เวีสมสกุล ตำแหน่ง พ.ท.๗ (ส.ข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีเอกสารข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ตากร)
ร.จ.ก.(ท.) รักษาการแทน
ผจก.ท.ฟ.ล.ส.ท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิกัดเคอร์ SAA009 จาก DPE ทุ่งหญ้าหนองหญ้า ถึง SPA๐๗S-08
ในวันที่ 13 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 16.50 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 148๗/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ตากร และ ผจก.ท.ฟ.ล.ส.ท. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.เคอร์ฯ สท.จ.บ.ส.ท.

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ตากร)
ร.จ.ก.(ท.) รักษาการแทน
ผจก.ท.ฟ.ล.ส.ท.

สำหรับผู้ดูแล

3001

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ก.๓)

เรียน ผจก. ๑๓/๑-๓๗

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

25 ต.ค. 2562

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหมู่บ้านจามจรี (SPA09)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.10 น. ถึง 16.50 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานี สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1487/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 24 ต.ค. 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ต.ค. 12
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | SPA09R-01 | Normal | Nonreclosing | | รท สพ. | SCADA R | บางปลาหมอ |
| 3 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.10 น. | | | | | | |
| 4 | แจ้ง กฟจ.สพ. โหลด SPA09 บริเวณหน้าบ้านจามจรี | | | | | | |
| 5 | หลังจาก กฟจ.สพ. แจ้งโหลด SPA09 บริเวณหน้าบ้านจามจรี ออกแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 6 | แจ้ง กฟจ.สพ. แจ้งขอโหลดกระแส 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA09 ข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านจามจรี (ตามผังแนบ) ได้ | | | | | | |
| 7 | เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอโหลดกระแส 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA09 ข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านจามจรี (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 8 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 11 | SPA09R-01 | Nonreclosing | Normal | | รท สพ. | SCADA R | บางปลาหมอ |
| 12 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |
| 13 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 16 | SPA09R-01 | Normal | Nonreclosing | | รท สพ. | SCADA R | บางปลาหมอ |
| 17 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 18 | แจ้ง กฟจ.สพ. แจ้งขอโหลดกระแส 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA09 ข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านจามจรี (ตามผังแนบ) ได้ | | | | | | |
| 19 | เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอโหลดกระแส 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA09 ข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านจามจรี (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 20 | SPA09R-01 | Nonreclosing | Normal | | รท สพ. | SCADA R | บางปลาหมอ |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.ปบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

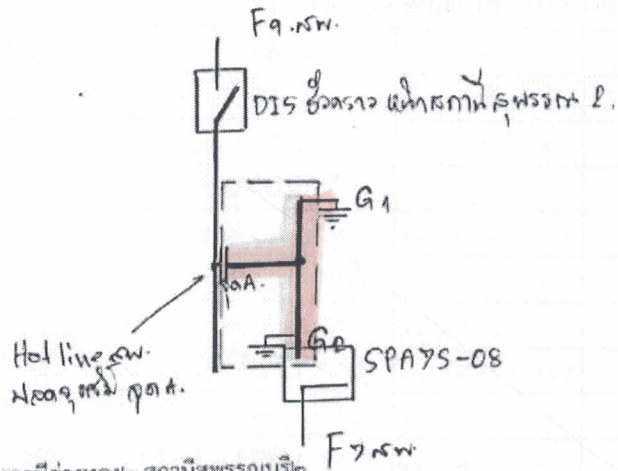
ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่ ๑๓...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-SPA๐๗S-๐๘...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕ควี สถานีอ่างทอง๒ -
สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ที่ต.๗,๙... สถานี...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ... DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-SPA๐๗S-๐๘
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕ควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดไหลออกจากระบบ
๒. ปลดไหลเตรียมพร้อม Hot Line สท. ปลดสายตั้งข้ามถนน
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างข้อตกกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขข้อตกกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(Signature)

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ดิยากร)

รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๙, ๑๕๘๕๕, ๑๕๘๖๐

(Signature)
(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
ทช.๗ ผบ.กฟจ.สพ.
