



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ป.บ.) ๕๕๑๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว

ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

3055

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

Switching Deadline

วันที่ 1 พ.ย. ๖๒

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.บ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ค.ก.พ.จ.ส.ค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC๑๐	๓ พ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	แกะไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วน ต้องการเปิด สวิทช์ขีบมัด (DIS)	SMC๑๐S-๐๘ ห้องเย็นชั้นวรุจน์	-	นายธีรพัฒน์ สุทธิสา โทร ๐๘-๙๑๑๐-๑๔๙๑
๒	SMC๑๐	๓ พ.ย. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๒	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอานาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.วัน โทร. ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ค.ก.พ.จ.ส.ค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.บ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SMC10 จาก SMC 1085-08 ถึง
ในวันที่ 03-11-62 ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง 1000 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1524

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ SMC10 จาก SMC 1085-02 ถึง
ในวันที่ 03-11-62 ตั้งแต่เวลา 1000 น. ถึง 1100 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสร ทรัพย์สุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จ.ค.ก.พ.จ.ส.ค.ชั้น๑

1 พ.ย. ๖๒

ร.ท.พร อภิชาติกรศรี
(๐๓๓.๖ หน.น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3055

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.๕๓., กฟล.๒๓๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... / แผ่น

แผนผังแนบ..... / แผ่น


ฉฉพ. — (สถานี..... —)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

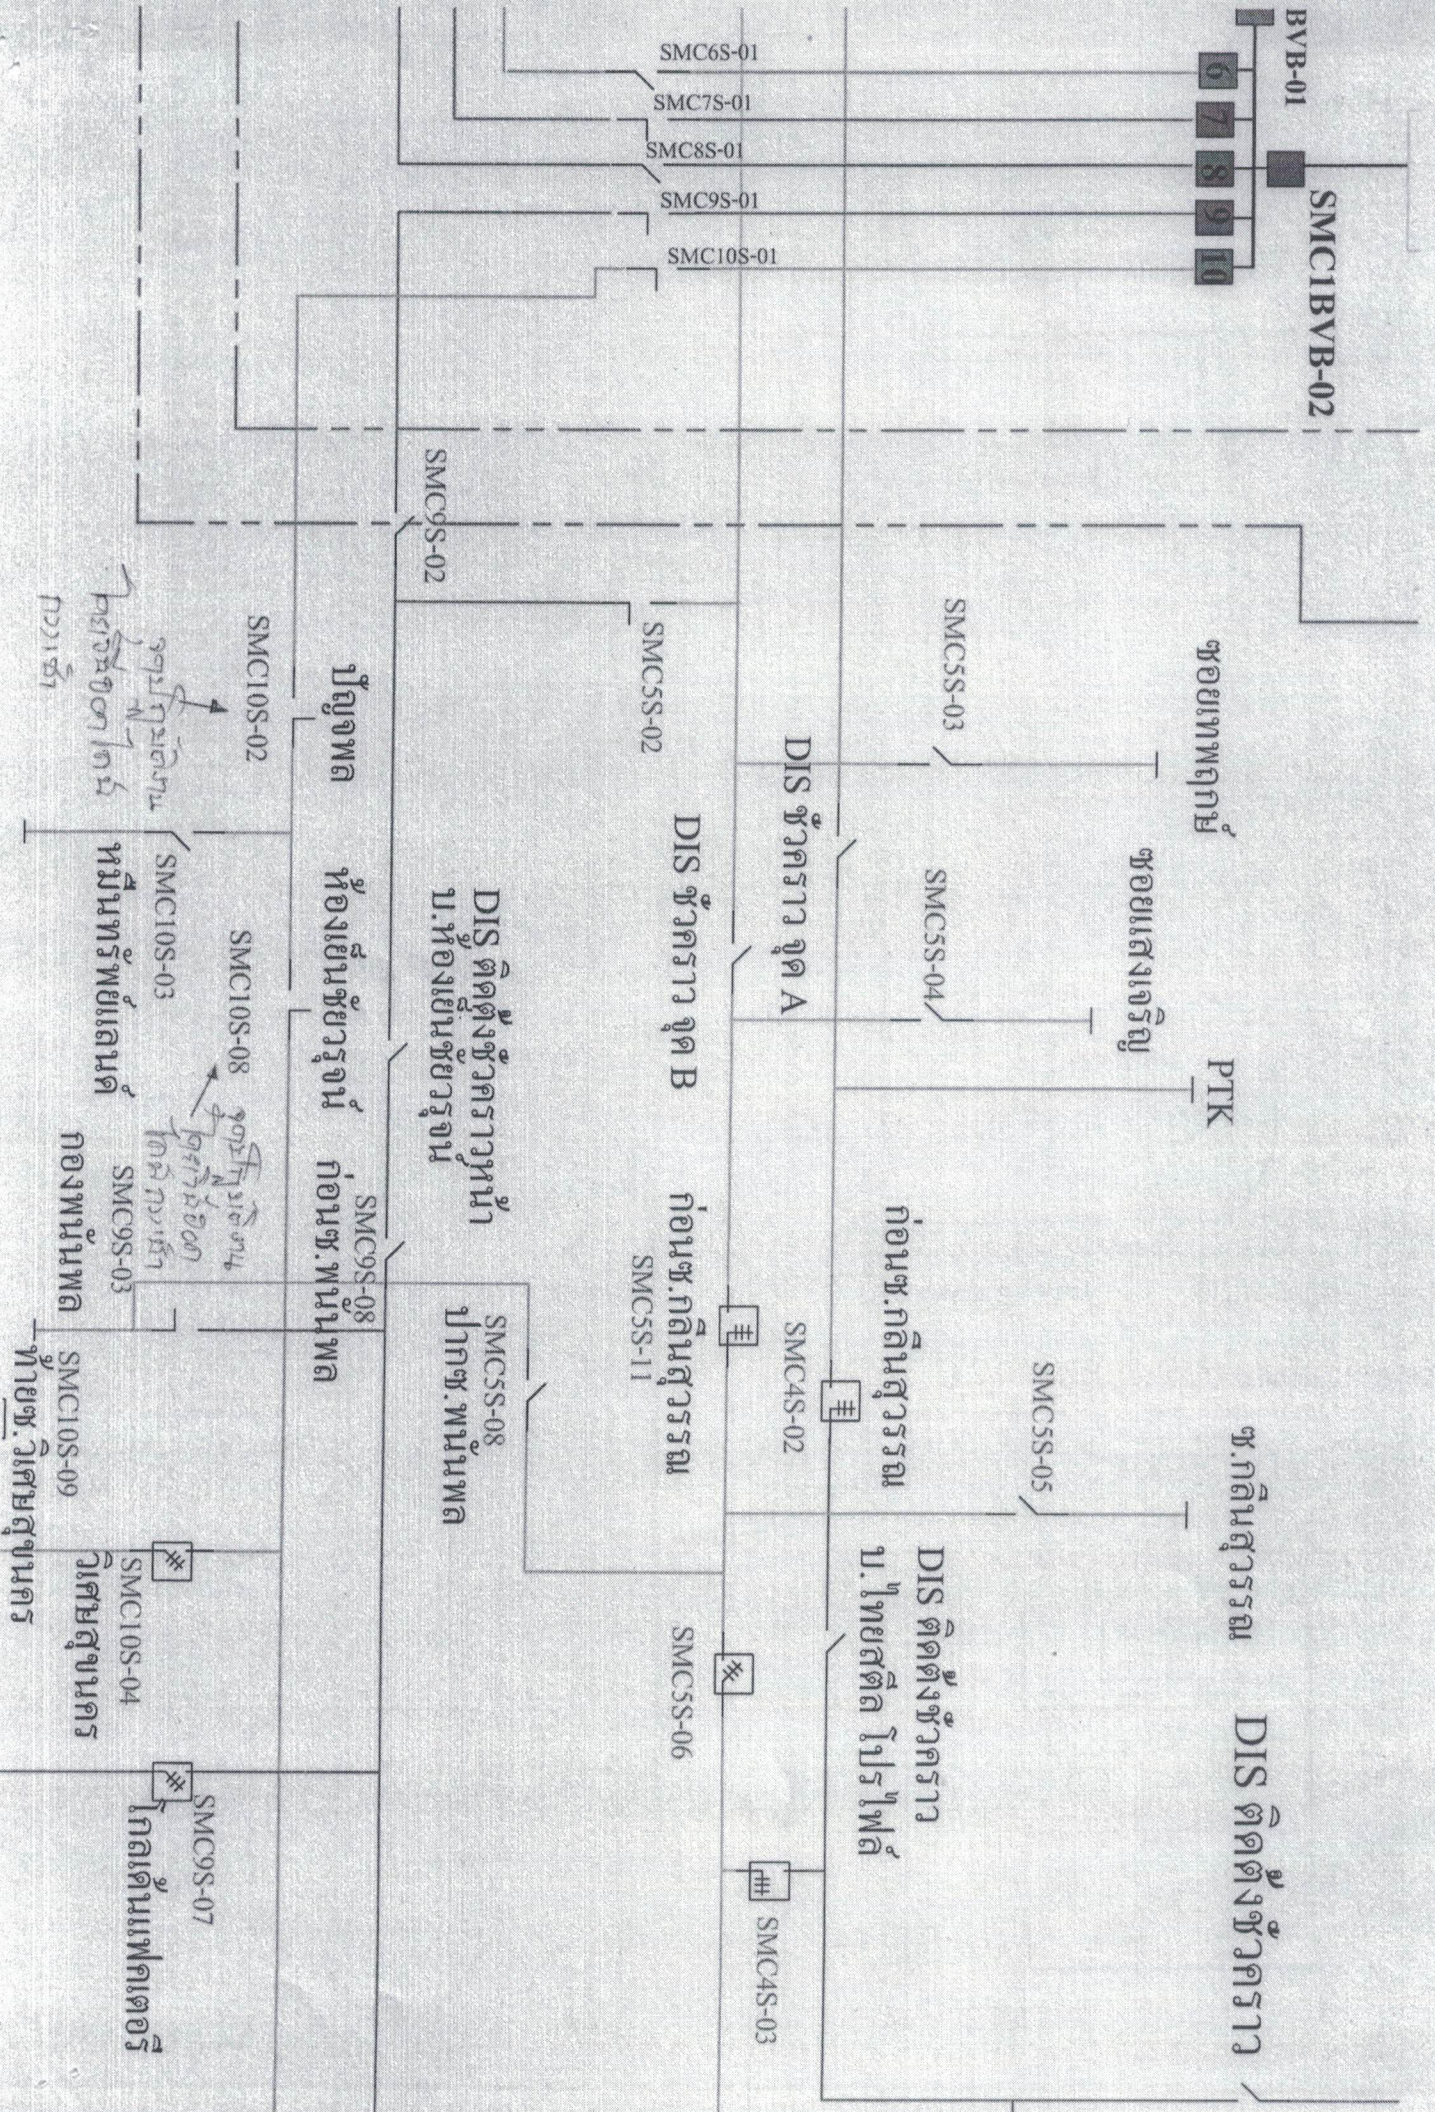

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
01 พ.ย. 2562



ใบสั่งทำสวิทชิง

สถานที่ทำงาน	แนวนอนนอกชาย						
กำหนดวันที่ทำงาน	03/11/2562	เวลา	09.00	น.	ถึง	03/11/2562	
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SMC10S-02, SMC10-08			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1524/62
เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข					วันที่	1 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบสวิทชิงโดย						วันที่	1 พ.ย. 62
อนุมัติสวิทชิงโดย						วันที่	1 พ.ย. 62
สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC							
1	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-08 (DISห้องเย็นชิวรุจน์)						
2	SMC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
3	SMC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
4	SMC10S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ท้ายชอยวิเศษสุนทร
5	SMC10S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ห้องเย็นชิวรุจน์
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-08 (DISห้องเย็นชิวรุจน์) ได้ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
7	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-08 (DISห้องเย็นชิวรุจน์) แล้วเสร็จ และพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-02 (DIS ปัญจพล) ต่อ						
8	SMC10S-08	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ห้องเย็นชิวรุจน์
9	SMC10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ปัญจพล
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-02 (DISปัญจพล) ได้ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
11	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SMC10S-02 (DISปัญจพล) แล้วเสร็จ						
12	SMC10S-02	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ปัญจพล
13	SMC10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ท้ายชอยวิเศษสุนทร
14	SMC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		
15	SMC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		
สิ้นสุด Switching							



BVB-01
SMC1BVB-02

ห้องแยกสัญญาณ

PTK

ตู้.กลิ้งตัวธรรม

DIS ติดตั้งตู้ควบคุม

ห้องแยกสัญญาณ

ก่อนซ.กลิ้งตัวธรรม

DIS ติดตั้งตู้ควบคุม บ.ไทยสตีล โปรดิวส์

DIS ตู้ควบคุม จุด A

DIS ตู้ควบคุม จุด B

ก่อนซ.กลิ้งตัวธรรม

DIS ติดตั้งตู้ควบคุมหน้า บ.ห้องแยกสัญญาณ

ปากซ.พินไฟ

ปัญหาพบ

ห้องแยกสัญญาณ

ก่อนซ.พินไฟ

SMC10S-02

SMC10S-03

SMC9S-03

SMC10S-09

SMC10S-04

SMC9S-07

หมั้นนัทพ์แยคเนต

กองพินไฟ

ท้ายซ.วิเศษตู้ขมคร

วิเศษตู้ขมคร

กลัดเนแพคเตอร์

จุดที่ติดตั้งตู้ควบคุม
จุดที่ติดตั้งตู้ควบคุม
จุดที่ติดตั้งตู้ควบคุม
