

Switching Deadline

วันที่ 12 พ.ย. 62

ส่งแล้ว

(Signature)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 0.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันจันทา

ชื่อผู้ส่ง นายวิทิตว. สมทิตพิชญญา

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	8/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	Disชั่วคราว สนามกีฬา2	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	14/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ๒	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	15,18/11/62 15,19	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEร้านขาย ทุเรียน	DDEตั้งข้าม ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	16/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEจุดA	DDEจุดB	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๘๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(Signature)
ตำแหน่ง ผจก. กฟภ. ก.๓

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาล้วนเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SPA07 จาก DDE รัชตะกรรมาโยน ถึง DDE กิ่งป่าด ต.ทพ.
ในวันที่ 18, 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1583/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สติติพิชญญา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

สำหรับผู้อนุมัติ 3162

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. กฟภ.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(Signature)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)


(Signature)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

11 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหน้าขายทุเรียน - ดิ่งข้ามถนนขนสง (SPA07)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18/11/2019 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1583/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 7 พ.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายฉัตร, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- Load 10.56 MW
3	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- Load 2.55 MW
4	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 25.45 MW
5	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- Load 2.9 MW
6	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM07						
7	BAM07S-05	ปลด	สับ		รถ สพ.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
8	DIS ชค. SPA07	ปลด	สับ		รถ สพ.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
9	DIS ชค. SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพ.		บัส ปตท.
10	BAM07S-05	สับ	ปลด		รถ สพ.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
12	แจ้ง กฟจ.สพ. โหลดโหลดจริง SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน และจุดจัมบริเวณดิ่งข้ามถนน						
13	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งโหลด SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน และบริเวณบัส ปตท. ออกแล้วเสร็จ						
14	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน (ตามผังแนบ) ได้						
15	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน แล้วเสร็จ						
16	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณจุดจัมบริเวณดิ่งข้ามถนน (ตามผังแนบ) ได้						
17	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ตัด DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณจุดจัมบริเวณดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
22	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
23	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
29	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
30	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
31	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
33	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ขอทลนกระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน ได้						
35	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอทลนกระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณหน้าร้านขายทุเรียน แล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ขอทลนกระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณจุดจัมบริเวณดิ่งข้ามถนน ได้						
37	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งขอทลนกระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE ในไลน์ SPA07 บริเวณจุดจัมบริเวณดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
38	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM07						
39	BAM07S-05	ปลด	สับ		รถ สพ.		SF6 วัดโพธิ์คอย
40	DIS ชค. SPA07	ปลด	สับ		รถ สพ.		DIS บีม ปตท.
41	DIS ชค. SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพ.		DIS วัดโพธิ์คอย
42	BAM07S-05	สับ	ปลด		รถ สพ.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์คอย
43	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
44	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
45	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕,๑๘...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.

สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗S-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
พิดเดอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๗๘๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร...ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

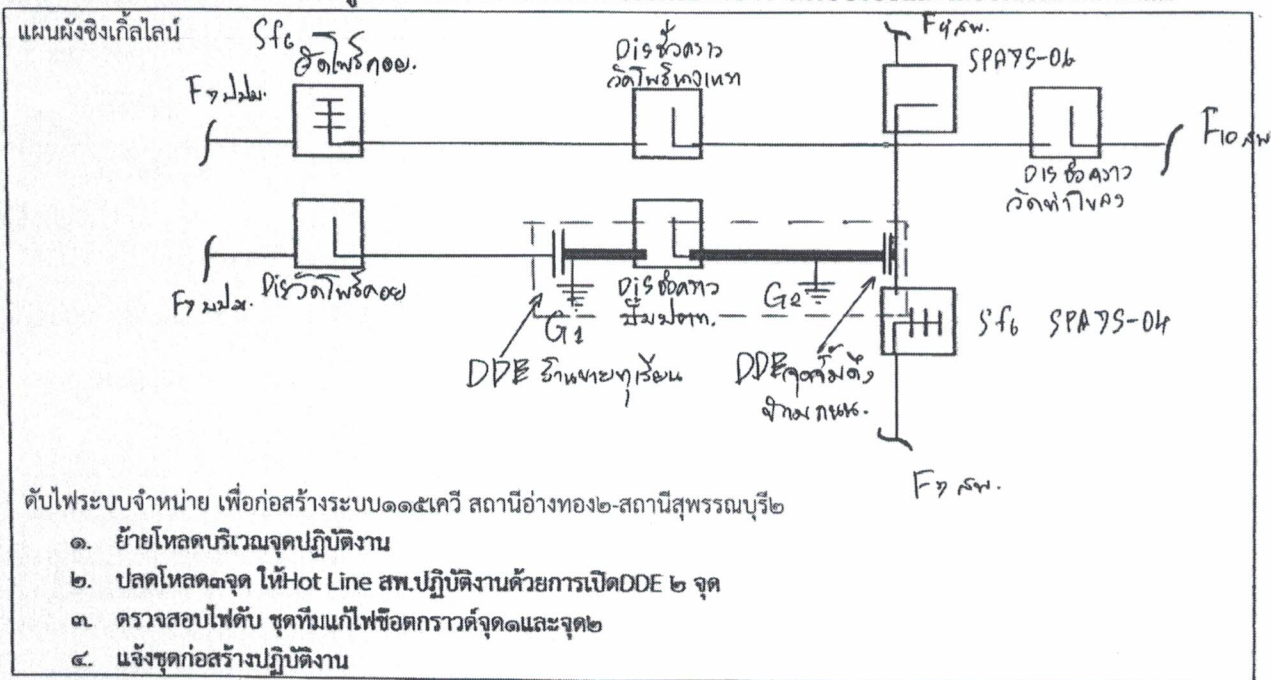

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
