

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์ตันจักษ์

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รวท.(ท.)กฟภ.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายหีดเคอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	หีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2,6 สท.	10/11/62	08.00	17.00	ปักเสาเคอร์.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบค่อม่อ จำนวน58คั่น	Dis ชำครว รร.กาญจนกา	DDEจก.๓	โทร.๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เฉลิมสกุล ตำแหน่ง พชช.๗ โทร ๐๙๕-๐๐๗๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดสร.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สท.๓) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคท. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 หีดเคอร์ SPA 2,6 จาก Dis ชำครว รร.กาญจนกา ถึง DDE จก.๓ (ได้วัดค่อม่อแล้ว)

ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1609/62

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ หีดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิพงษ์ ทองระย้า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชเชษฐ สุวรรณประทีป

สำหรับผู้อนุมัติ

3136

ที่ ก.๓ กปน.(คท.)

เรียน ผคท. กฟภ. สท.

อก.บช.(ก.๓) / อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



ผคท. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)
- 8 พ.ย. 2562

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ Dis ชั่วคราว รร.กาญจนา(SPA06)- DDE จุด A ไค้งวัดตอนกลาง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10-พ.ย.-62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1603/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนอ ทองย้อย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.							
1	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
2	DIS ชั่วคราว ไลน์ SPA06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS รร.กาญจนา
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
4	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ช็อต Short ground จุด G1				สพ.		
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ช็อต Short ground จุด G2				สพ.		
6	แจ้ง กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้						
7	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
8	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
9	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				สพ.		
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				สพ.		
12	DIS ชั่วคราว ไลน์ SPA06	ปลด	สับ		สพ.		DIS รร.กาญจนา
13	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
14	*หมายเหตุ* DDE จุด A บริเวณไค้งวัดตอนกลาง กฟจ.สพ. ไม่ได้จัมกลับ รอฮอทไลน์กระเช้าพร้อม กฟจ.สพ.แจ้งให้รับทราบ						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทม.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี
มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เส้นเสี้ยวเมืองแยกสถานพินิจ-โรงเรียนกาญจนา...เพื่อ...ปักเสาแรงสูง จำนวน ๕๕ ต้น...
โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ..๒,๖.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา - DDEจุดA

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..พชง.กส.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง พช.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังซึ่งเกิดไลน์

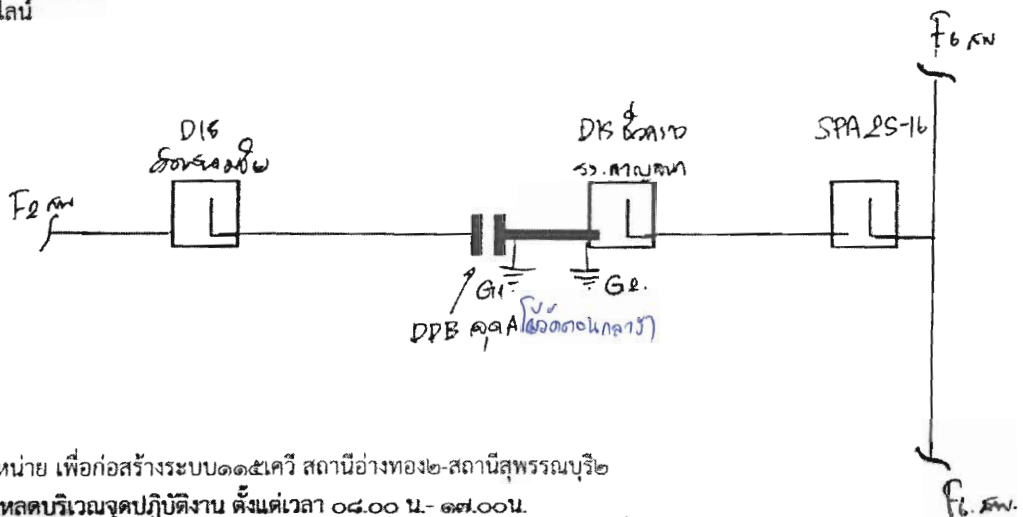

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๗.๐๐น.
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างชั่วคราว จุด๑ และชุดทีมแก้ไขชั่วคราวจุด๒
๓. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(Signature)

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผปบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

น.ค.๖๒

๗๗๐.๖๒
