



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ย. 62

# วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สท.ร.(บป.) 5700  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิษฐ์ เรืองจุ้ย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ติดตั้งโรตัสเซอร์ และเปลี่ยนเสาขั้วรถ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก      | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                 |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|----------------------------|----------|--|------------------------------|
| ๑   | SAC๐๕    | ๑๗ พย.๖๒     | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | ติดตั้งโรตัสเซอร์          | SAB๓F-๐๒ | Disชั่วคราวเลยแยกสะพานข้ามแม่น้ำวัดทรงคนอง | นายฉลก สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙ |
| ๒   | SAC๐๕    |              |             |         | เปลี่ยนเสาแรงสูงขั้วรถ     | SAC๕S-๐๒ | Disชั่วคราวเลยปากซอยทรงคนอง ๑๑ ประมาณ๕๐๐ม  |                              |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณวัดทรงคนอง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉลก สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขั้วรถ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขั้วรถ ๑.๒ ไม่มีโอกาสขั้วรถ

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายอดิษฐ์ เรืองจุ้ย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAC๐5 จาก SAB3F-02 ถึง Dis ชต. 1๗/๑๑๑ สะพานข้ามแม่น้ำวัดทรงคนอง  
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1612/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SAC๐5 จาก SAC5S-06 ถึง Dis ชต. เลยปากซอยทรงคนอง 11  
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล ทองช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายฉลก สุวรรณศรี

น.รินทร์ อธิสภานันท์  
(๐๘๖.๕๓๖๖.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ 3213

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กฟภ. 14 พ.ย. 2562  
(นายภัคพงษ์ วงศ์พันธ์)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

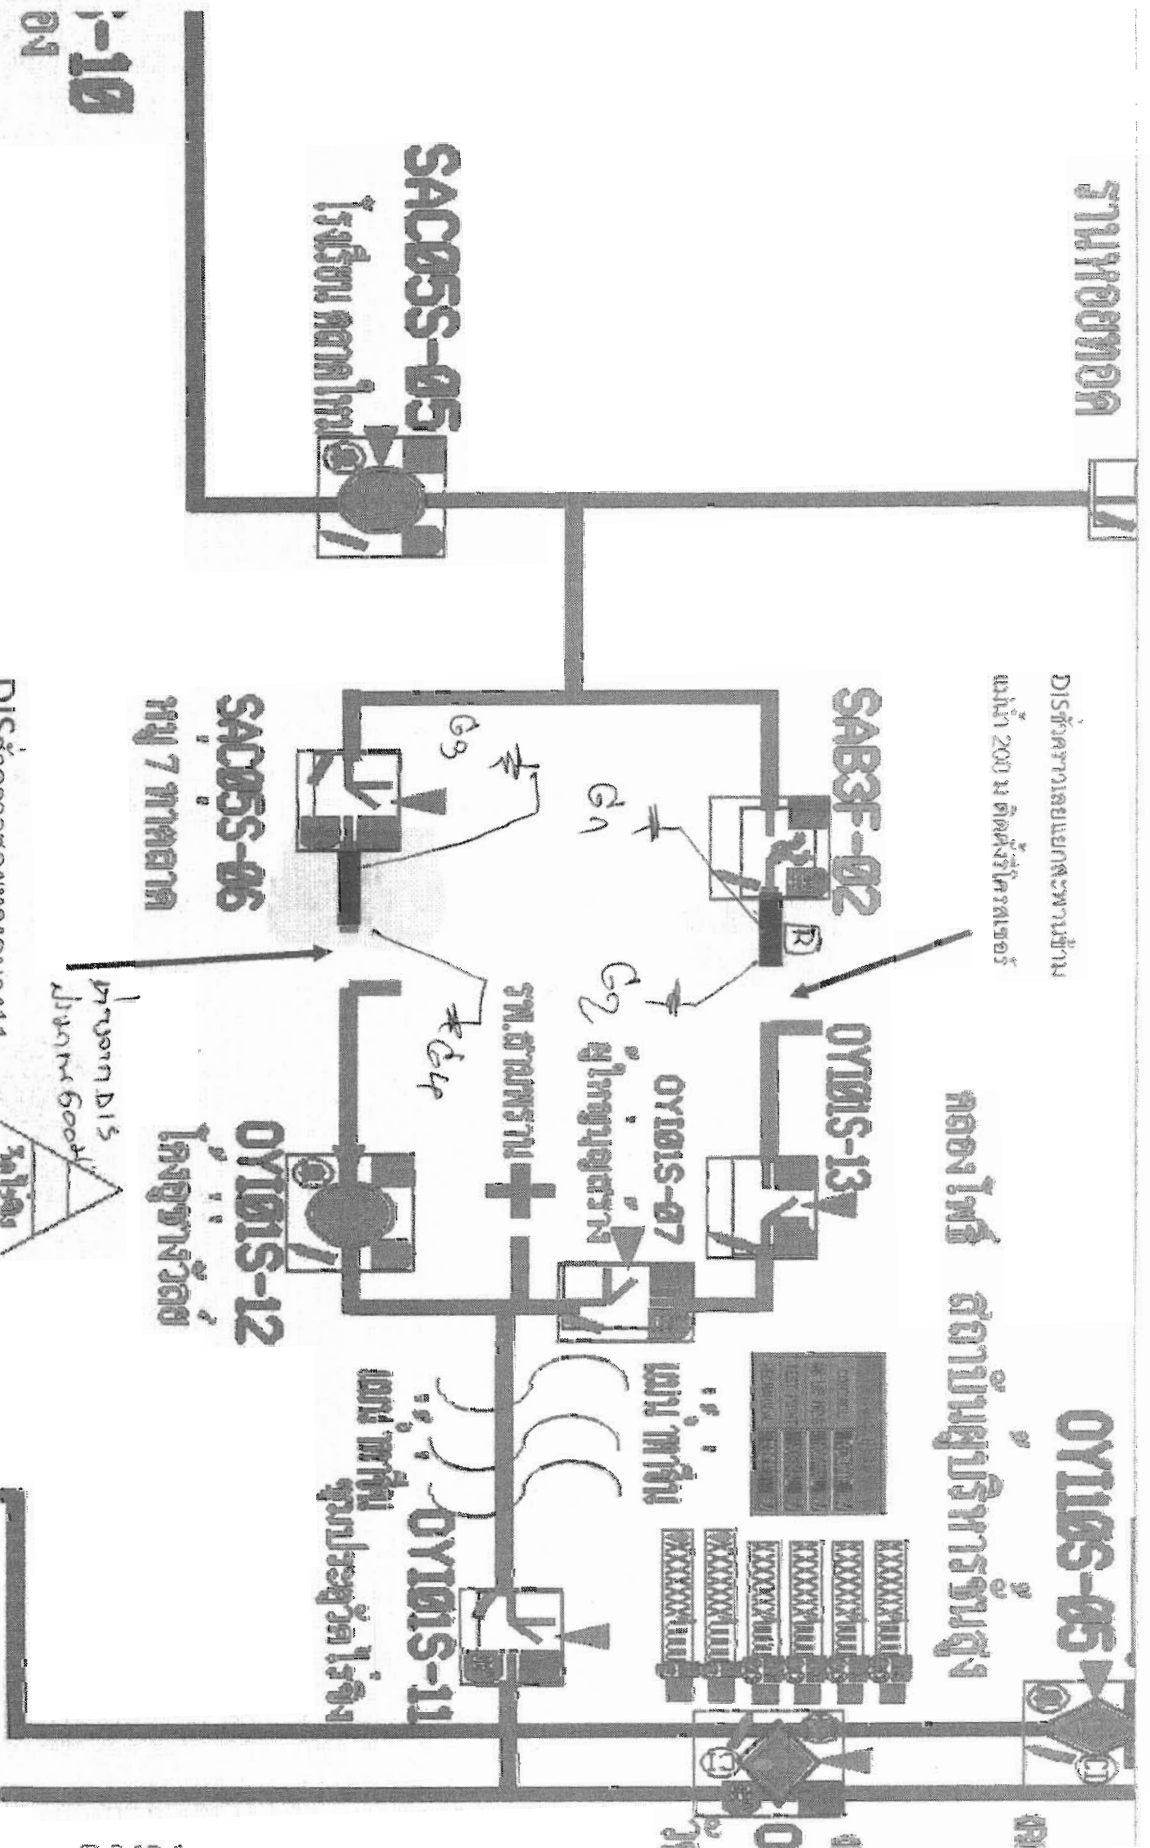
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน วัดทรงคนอง(ไลน์วงจร SAC05)ตั้ง SAB3F-02-Dis ชั่วคราวเลยแยกสะพานข้ามแม่น้ำวัดทรงคนอง,SAC05S-06-Dis ชั่วคราวเลยปากซอยทรงคนอง 1:
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ติดตั้งรีโคลสเซอร์และเปลี่ยนเสาแรงสูงที่ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1612/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนเฑียร ทองย้อย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่  | รหัสอุปกรณ์            | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                            |
|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------------------|
| <b>สวิตชิงวันที่ 16 พ.ย. 62 เวลา 24.00 น.(ดับไฟย้ายโหลด)</b> |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 1  | OYI01VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |            | -                                   |
| 2  | SAC05VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |            | -                                   |
| <b>**ย้ายโหลด SAC05 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI01**</b>            |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 4  | DIS ชั่วคราวไลน์ SAC05 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร          |            | DIS เลยแยกสะพานข้ามแม่น้ำวัดทรงคนอง |
| 5  | OYI01S-07              | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS ผญ.บุญสร้าง                     |
| 6  | OYI01VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |            | -                                   |
| 7  | SAC05VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |            | -                                   |
| <b>สิ้นสุดสวิตชิง วันที่ 16 พ.ย. 62</b>                      |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| <b>สวิตชิงวันที่ 17 พ.ย. 62</b>                              |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 8  | OYI-TP1                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | OYI          |            | -                                   |
| 9  | OYI01VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |            | -                                   |
| 10   | OYI09VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |            | -                                   |
| 11   | SA2-KT1A               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | -                                   |
| 12   | SAB03VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAB          |            | -                                   |
| 13   | SAC-TP1                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SAC          |            | -                                   |
| 14   | SAC05VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |            | -                                   |
| <b>**ย้ายโหลด SAB03 ไปรับไฟจาก SAC05**</b>                   |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 16   | SAC05S-05              | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | SF6 รร.ตลาดใหม่                     |
| 17   | SAB03VB-01             | สับ                                  | ปลด                  |      | SAB          |            | -                                   |
| <b>**ย้ายโหลด SAC05 ไปรับไฟจาก OYI01**</b>                   |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 19   | OYI09S-03              | ปลด,ล๊อคคาน                          | สับ                  |      | สพร.         |            | SF6 ปีม ปตท.                        |
| 20   | OYI01S-12              | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | SF6 โค้งอู่ช่างวัลย์                |
| 21   | DIS ชั่วคราวไลน์ SAC05 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร          |            | DIS เลยแยกปากซอยทรงคนอง 11          |
| 22   | OYI09S-03              | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | สพร.         |            | SF6 ปีม ปตท.                        |
| <b>**ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนไฟจาก SAC05**</b>                 |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 24   | SAB03VB-01             | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | SAB          |            | -                                   |
| 25   | SAC05S-05              | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | สพร.         |            | SF6 รร.ตลาดใหม่                     |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้ส่งการ | หมายเหตุ                      |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|-----------|-------------------------------|
| เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.                                   |  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 26   | SAC05S-06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |           | DIS หมู่ 7 ท้าตลาด            |
| 27   | SAB03F-02  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |           | DF ชุ่มประตุวัดทรงคนอง        |
| 28   | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร.รับทราบ  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 29   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 30   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 31   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 32   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 33   | แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 34   | OYI-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | OYI          |           | -                             |
| 35   | OYI01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |           | -                             |
| 36   | OYI09VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |           | -                             |
| 37   | SA2-KT1A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |           | -                             |
| 38   | SAB03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAB          |           | -                             |
| 39   | SAC-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SAC          |           | - -                           |
| 40   | SAC05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |           | - -                           |
| *หมายเหตุ* งานที่ท่า 1.ติดตั้งรีโคลสเซอร์ 2.เปลี่ยนเสาแรงสูงที่ชำรุด |  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 5 ส.ค. 62                                       |  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 41   | หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน   |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 42   | หลังจากชุดปฏิบัติงานติดตั้งรีโคลสเซอร์บริเวณท้าทรงคนองแล้วเสด็จตรวจสอบสวิตชิงใบมีดด้าน Source สับเข้าทั้งสามเฟส,สวิตชิงใบมีดด้านโหลดปลดทั้งสามเฟสและสวิตชิงบายพาสของรีโคลสเซอร์สับเข้าทั้งสามเฟส |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 42   | OYI-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | OYI          |           | -                             |
| 43   | OYI01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |           | -                             |
| 44   | OYI09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |           | -                             |
| 45   | SA2-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |           | -                             |
| 46   | SAB03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAB          |           | -                             |
| 47   | SAC-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SAC          |           | - -                           |
| 48   | SAC05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |           | - -                           |
| 49   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 50   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 51   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 52   | แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G4  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 53   | SAC05S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |           | DIS หมู่ 7 ท้าตลาด            |
| 54   | SAB03F-02  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |           | DF ชุ่มประตุวัดทรงคนอง        |
| 55   | **ย้ายโหลด SAB03 ไปรับไฟจาก SAC05**  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 56   | SAC05S-05  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |           | SF6 รร.ตลาดใหม่               |
| 57   | SAB03VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | SAB          |           | -                             |
| 58   | **ย้ายโหลด SAC05 ไปรับไฟจาก OYI01**  |                                      |                      |      |              |           |                               |
| 59   | OYI09S-03  | ปลด,สื่อคคาณ                         | สับ                  |      | สพร.         |           | SF6 บั้ม ปตท.                 |
| 60   | DIS ชั่วคราวไลน์ SAC05   | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |           | DIS เลยแยกปากขอยท้าทรงคนอง 11 |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์            | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                            |
|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 61  | OYI01S-12              | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | สพร.         |            | SF6 โค้งอยู่ข้างวัลย์               |
| 62  | OYI09S-03              | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | สพร.         |            | SF6 ปุ่ม ปดท.                       |
| <b>**ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนไฟจาก SAC05**</b>                    |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 64  | SAB03VB-01             | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | SAB          |            | - -                                 |
| 65  | SAC05S-05              | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | สพร.         |            | SF6 วรร.ตลาดใหม่                    |
| 66  | OYI-TP1                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | OYI          |            | - -                                 |
| 67  | OYI01VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |            | - -                                 |
| 68  | OYI09VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |            | - -                                 |
| 69  | SA2-KT1A               | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | - -                                 |
| 70  | SAB03VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAB          |            | - -                                 |
| 71  | SAC-TP1                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SAC          |            | - -                                 |
| 72  | SAC05VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |            | - -                                 |
| <b>สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 17 พ.ย. 62</b>                          |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| <b>73 สวิตชิงวันที่ 17 พ.ย. 62 เวลา 24.00 น.(ดับไฟย้ายโหลด)</b> |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 74  | OYI01VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYI          |            | - -                                 |
| 75  | SAC05VB-01             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |            | - -                                 |
| <b>76 **ย้ายโหลด SAC05 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI01**</b>            |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |
| 78  | OYI01S-07              | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ผญ.บุญสร้าง                     |
| 77  | DIS ขั้วคราวไลน์ SAC05 | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS เลยกแยกสะพานข้ามแม่น้ำวัดทรงทอง |
| 79  | OYI01VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OYI          |            | - -                                 |
| 80  | SAC05VB-01             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |            | - -                                 |
| <b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>                                    |                        |                                      |                      |      |              |            |                                     |



1-10  
04

DIS ตัวควบคุมขอยุทธคนอง 11 -  
วัดไร่ขิง เปิดแผนสถานตรงตึกชุด
