



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๖๕๖๐ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

02/12/67

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ EGAT ก่อสร้างปรับปรุงระบบภายใน บริเวณหน้าสถานี สากร ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๘	19 ม.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ EGAT ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบภายใน บริเวณหน้าสถานี สากร ๑	SMA๐๘S-๐๑	SMA๐๘S-๐๒	นายนิคม อิม กระจำง โทร. ๐๖๒๕๕๑๕๙๒๔
๒	๑๑๕ KV	19 ม.ค. 68	๐๘.๐๐ น. 07.30	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเข้า ๑๑๕ KV ตรงข้ามซอย ไยมะพร้าว	SAA๓YS-๐๗ คิงพิตเซอร์ หน้าศรีนนทา แบตเตอรี่	
๓	๑๑๕ KV	19 ม.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเข้า ๑๑๕ KV ตรงข้ามซอย ไยมะพร้าว	SAA๓YS-๐๖ นครหลวงเส้นไย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช้างสถานี สค.๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๒ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMA8 จาก SMA8S-01 ถึง SMA8S-02
ในวันที่ 19 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1626/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก SAA3YS-07 ถึง DDE 115 kv ต.บ.ห้วยข.โพนทราย
ในวันที่ 19 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1626/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก SAA3YS-06 ถึง DDE 115 kv ต.บ.ห้วยข.โพนทราย
ในวันที่ 19 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1626/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สุภาวณัน อ.ไพฑูริย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณวิวัฒน์ ยุกนโธ

วิ
(นาง ศิริรัตน์ ไพฑูริย์)
๑๓.๕ ๑๖๓๓ น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.คค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

คคฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	กฟส.สค.แจ้งว่าไม่มีกร Short ground เนื่องจาก กฟผ.จะทำงานภายในหน้าสถานีฯ						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
27	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
28	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
29	KTBO2VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
31	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
32	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
33	KTBO2VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
34	เมื่อชุด Hotline 115 kv						
35	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
36	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 kv
37	แจ้งชุด Hotline 115 kv (คุณศราวุธ) ให้ทำการจัม DDE 115 kv บริเวณตรงข้ามซอยโยมะพร้าวได้						
38	เมื่อชุด Hotline 115 kv (คุณศราวุธ) ทำการจัม DDE 115 kv บริเวณตรงข้ามซอยโยมะพร้าวแล้วเสร็จ						
39	ตรวจสอบ LBS 115 kv BAL03YS-07 (นครหลวงเส้นโย) ว่าไม่โชว์ LOWGAS						
40	BAL03YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		LBS นครหลวงเส้นโย
41	KTE02YB-01	ปลด	สับ		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
42	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
43	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
44	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 kv
45	ย้ายโหลด SMA08 กลับจาก KTB02						
46	SMA08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pothead SMA01
47	SMA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMA	SCADA CB	SMA01
48	KTBO2S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	กม.12
49	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
50	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
51	KTBO2VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
52	SMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

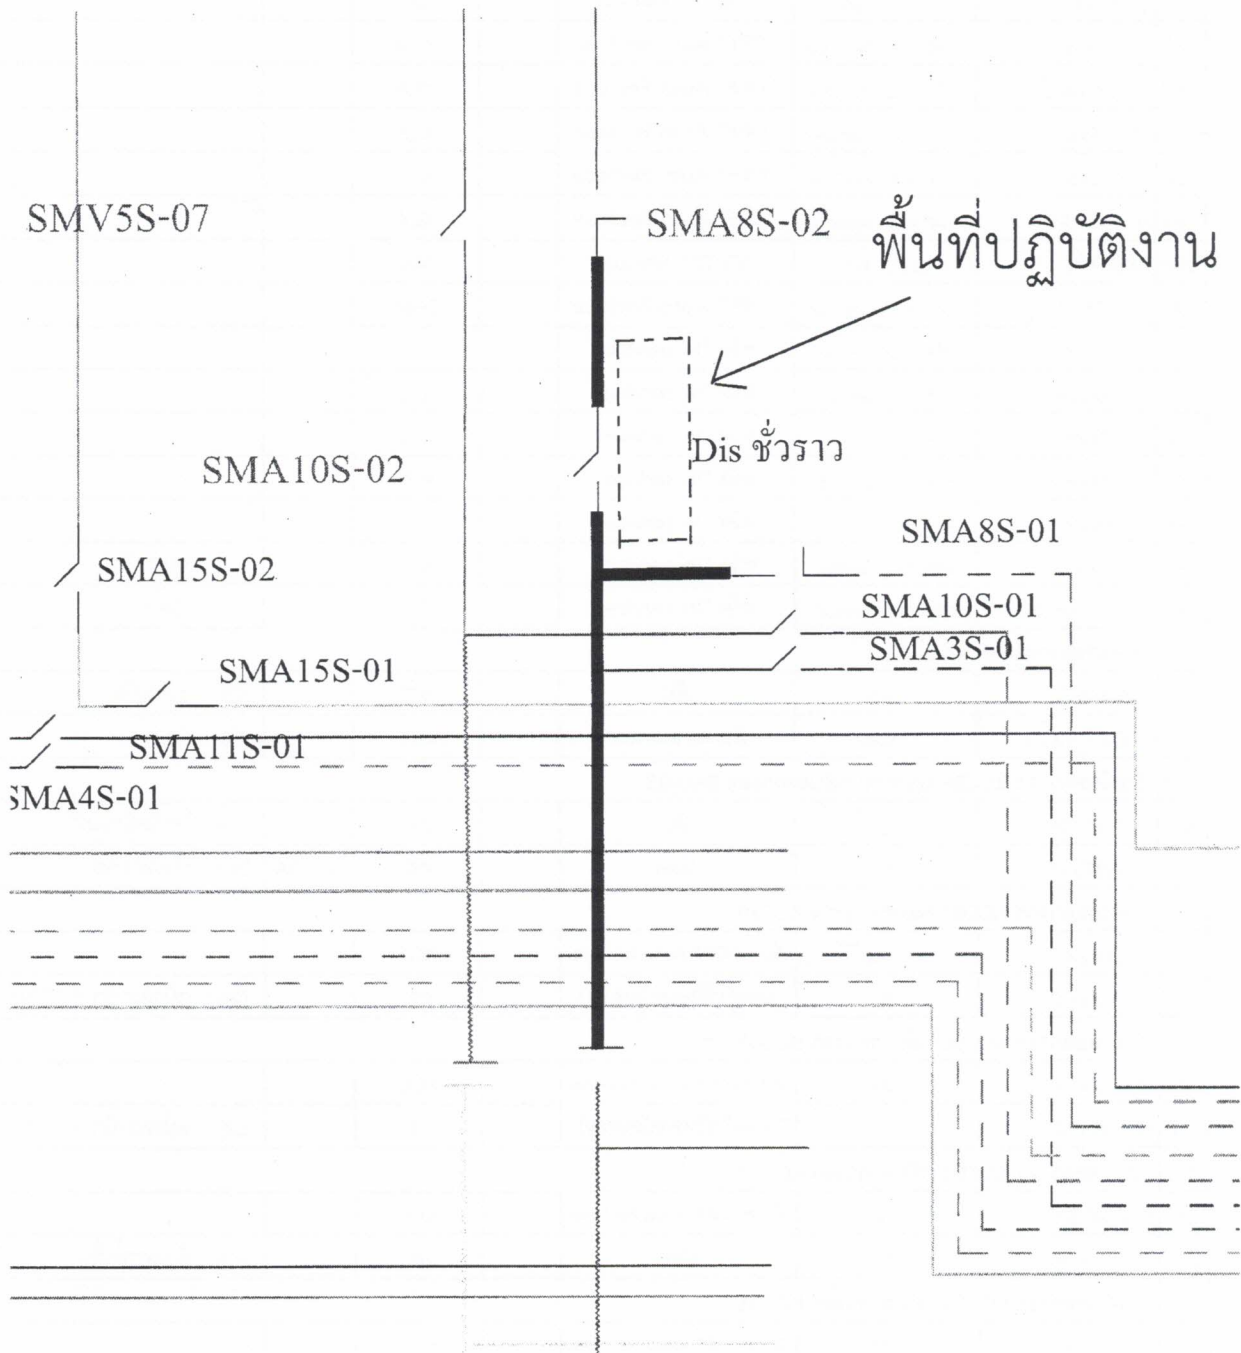

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

