



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สอนทิศปัญญา

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี... ความแอมป์สังเขปแบบ จำนวน ๔ แอมป์ ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วันเดือนปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------------|-------------|---------|--|-------------------------------------|--|--|
| ๑. | 7 สท. | 27/11/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08 | Dis.ชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าไชย, DDE จ.พ.บ. | โทร.๐๘๖-๓๐๔๖๓๕๕๕ นายไกรภส บุตรบรรเทิง |
| ๒. | 7 สท. | 29/11/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Dis.ชั่วคราว บึงพลา. | DDE จ.พ.บ. | โทร.๐๘๖-๓๐๔๖๓๕๕๕ นายไกรภส บุตรบรรเทิง |
| ๓. | 7 สท. | 30/10/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Dis.ชั่วคราว วัดโพธิ์นางพรา | DDE ต.ชัย ถนน | โทร.๐๘๖-๓๐๔๖๓๕๕๕ นายไกรภส บุตรบรรเทิง |
| ๔. | 7 สท. | 1/12/62 2/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Dis.ชั่วคราว สถานีขต.2 | DDE ต.ชัย ถนน | โทร.๐๘๖-๓๐๔๖๓๕๕๕ นายไกรภส บุตรบรรเทิง |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร ๐๘๔-๐๐๔๗๕๕๕๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิชา อินทร์พินิจาว)
ตำแหน่ง ผจก. กฟ.สพ.

*ตัด DDE จ.พ.บ.วันที่ 27 พ.ย. 62
ใช้ DDE จ.พ.บ. วันที่ 30 พ.ย. 62 *
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟ.บ.๓

เรียน อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ผศฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPA7 จาก SPA 75-04 ถึง DDE จ.พ.บ. A, B
ในวันที่ 27 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1669/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SPA7 จาก Dis.ชั่วคราวบึงพลา ถึง DDE จ.พ.บ. A.
ในวันที่ 29 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1669/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชา วงษ์พันธุ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล.
23 พ.ย. 62

(นายวิชา อินทร์พินิจาว)
ตำแหน่ง ผจก. กฟ.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

3325

ที่ ก.๓ กบ.ป.(ค.ฟ.)
เรียน ผจก. กฟ.ส.พ., กฟ.ส.บ.ย.ป.๑
อ.ก.บ.ป.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แอมป์
แผนผังแบบ 2 แอมป์
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

คำสั่ง

- สถานที่ทำงาน แนวถนนหลวง357
- กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ก่อสร้าง 115 เครื สถานีฯ อ่างทอง 2 - สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1669/62
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย พิจฉา วันที่ 25 พ.ย. 62
- อนุมัติสวิตชิงโดย ทพ.ธ วันที่ 26 พ.ย. 62
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจณ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 27 พ.ย. 62 | | | | | | |
| 2 | SP-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 3 | SPA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | L=2.04MW. |
| 4 | SPA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | L=5.3MW. |
| 5 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | L=5.6MW. |
| 6 | BAM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAM | - | - |
| 7 | BAM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | L=7.0MW. |
| 8 | BAM07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | L=3.0MW. |
| 9 | ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07 | | | | | | |
| 10 | SPA07S-11 | ปลด | สับ | | สพ. | | SF6 บ้านกรวย |
| 11 | Dis ชั่วคราว SPA07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS วัดท่าโขลง |
| 12 | ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07 | | | | | | |
| 13 | BAM07S-05 | ปลด | สับ | | บปม. | SCADA | SF6 วัดโพธิ์ค้อย |
| 14 | BAM02S-12 | ปลด | สับ | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 15 | Dis ชั่วคราว SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์ค้อย |
| 16 | Dis ชั่วคราว SPA07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS บั้ม ปตท. |
| 17 | Dis ชั่วคราว SPA07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 18 | BAM02S-12 | สับ | ปลด | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 19 | แจ้งกฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบั้ม ปตท. | | | | | | |
| 20 | เมื่อกฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบั้ม ปตท. แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 21 | แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และจุด B บริเวณตั้งข้ามถนนเลยบั้ม ปตท. (ตามผังแนบ) | | | | | | |
| 22 | เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และจุด B บริเวณตั้งข้ามถนนเลยบั้ม ปตท. แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 23 | จ่ายไฟถึง DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ จุด B บริเวณตั้งข้ามถนนเลยบั้ม ปตท. ตามลำดับ | | | | | | |
| 24 | Dis ชั่วคราว SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 25 | Dis ชั่วคราว SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS บั้ม ปตท. |
| 26 | แจ้งกฟจ.สพ.ทำการนำโหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบั้ม ปตท. กลับ | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 27 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 28 | SPA07S-04 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพ. | | SF6 ขนส่ง |
| 29 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ | | | | | | |
| 30 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1 | | | | | | |
| 31 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2 | | | | | | |
| 32 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3 | | | | | | |
| 33 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4 | | | | | | |
| 34 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G5 | | | | | | |
| 35 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G6 | | | | | | |
| 36 | SP-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 37 | SPA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 38 | SPA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 39 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 40 | BAM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAM | | - |
| 41 | BAM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | | - - |
| 42 | BAM07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | | - - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 43 | เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 44 | SPA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 45 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 46 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1 | | | | | | |
| 47 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2 | | | | | | |
| 48 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G3 | | | | | | |
| 49 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G4 | | | | | | |
| 50 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G5 | | | | | | |
| 51 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G6 | | | | | | |
| 52 | จ่ายไฟ SPA07 ถึง DDE จุด A,B (บางส่วนยังจ่ายจาก BAM07) | | | | | | |
| 53 | SPA07S-04 | ปลด | สับ | | สพ. | | SF6 ขนส่ง |
| 54 | ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM07 | | | | | | |
| 55 | Dis ชั่วคราว SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS วัดท่าโขลง |
| 56 | SPA07S-11 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพ. | | SF6 บ้านกรวย |
| 57 | SPA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 58 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| สิ้นสุด Switching วันที่ 27 พ.ย. 62 | | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง วันที่ 29 พ.ย. 62 | | | | | | |
| 2 | BAM07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | | - L=3.0MW. |
| 3 | Dis ชั่วคราว SPA07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS ปุ่ม ปตท. |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------|
| 4 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ | | | | | | |
| 5 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด G1 | | | | | | |
| 6 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด G2 | | | | | | |
| 7 | BAM07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | | - - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 8 | เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 9 | BAM07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | | - - |
| 10 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด G1 | | | | | | |
| 11 | แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด G2 | | | | | | |
| 12 | Dis ชั่วคราว SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS ปุ่ม ปตท. |
| 13 | BAM07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | | - - |
| สิ้นสุด Switching วันที่ 29 พ.ย. 62 | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๗...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี
มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานี
สุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ...๗... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

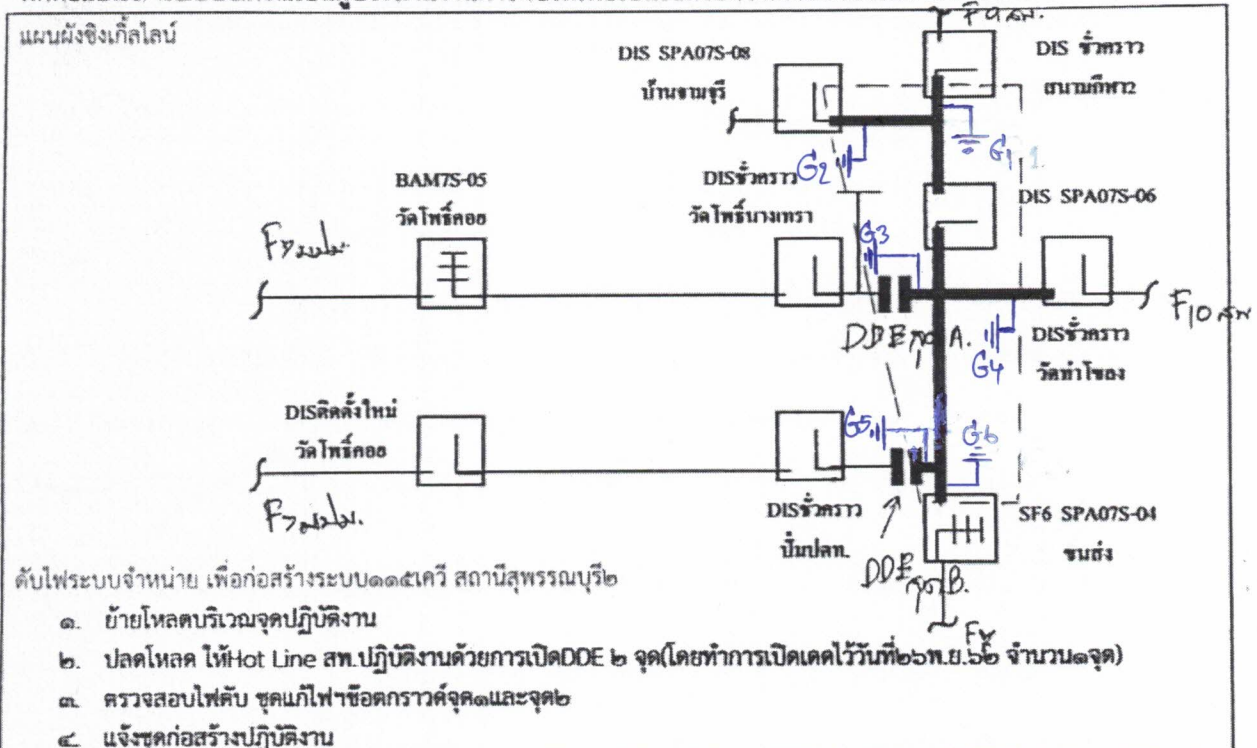

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
ทชง.๖(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๙...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๐75-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง...ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

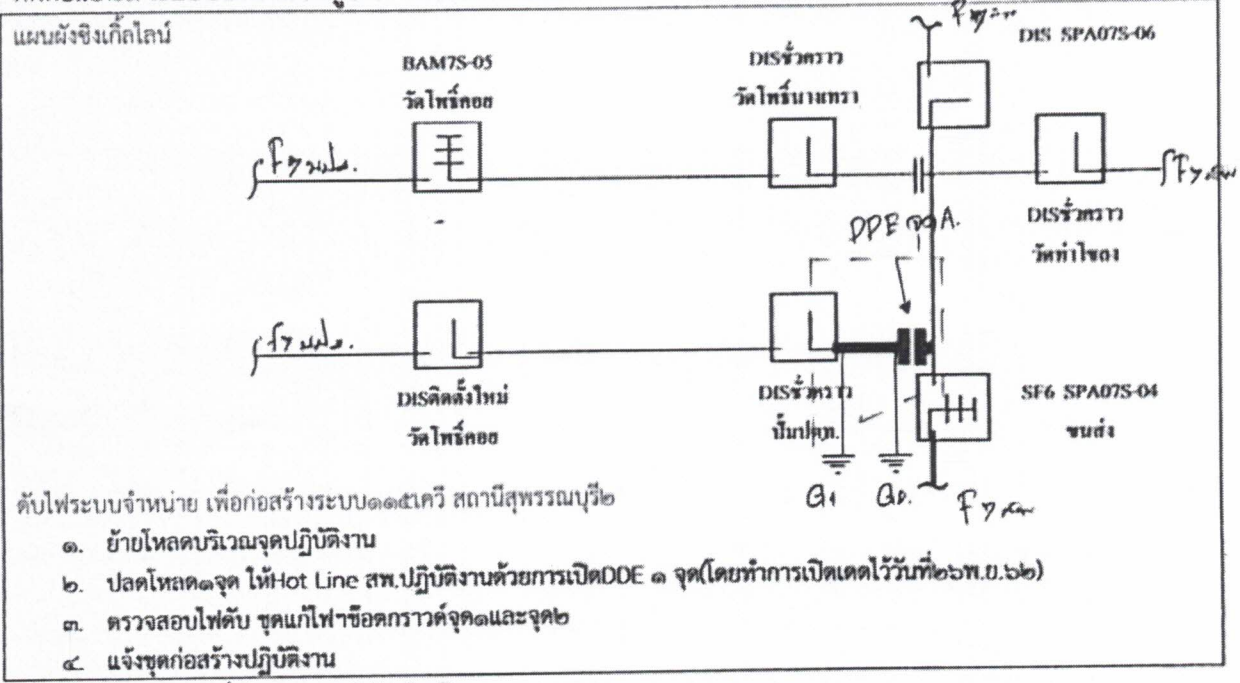

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พ.๐๗.๖๑๘
|
