



Switching Deadline  
วันที่ 6 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง.(บพ.) ๕๕๑๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๙๑ แม่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ อุทอง	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ๒๒ เหวี (งานโรงเรียน)	DIS บ้านยางไทย UTG๖๖5-๐๖	SF๖ ชั่วคราว บ้านคอนตัมกุ่ม	นายวัฒนา อนุศรี ทพ.บ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ม.๒ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง ทพ.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายประยุทธ เขียวหวาน.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

๖๕๑๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ UT๖6 จาก UT๖65-06 ถึง SF6. งดการปฏิบัติงานคอนตัมกุ่ม

ในวันที่ 11 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1698/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส โมกข์พันธ์  
3 ธ.ค. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัฒนา อนุศรี

งทพร วัฒนโกศลศรี  
(๐๐๓.๕ แทน นว.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3400

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*(Signature)*

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

วท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 6 ธ.ค. 2562



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แม่น  
แผนผังแนบ 2 แม่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านยางไทย ถึง บ้านดอนตันกุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	อทง.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้า 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1698/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	5 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	R.บ้านทางตลาด
4	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
5	SPN06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
6	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วน ฝาก SPN06						
7	SPN06S-06	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
8	SF6 บ้านดอนตันกุ่ม	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 บ้านดอนตันกุ่ม
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
10	UTG06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บ้านยางไทย
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
14	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
15	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	R.บ้านทางตลาด
16	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
17	SPN06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง


### สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

18	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ
----	--

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
20	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R R.บ้านทางตลาด
21	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
22	SPN06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
25	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
26	UTG06S-06	ปลด	สับ		อทง.		DIS บ้านยางไทย
27	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วน คืนจาก SPN06						
28	SF6 บ้านดอนตันกุ่ม	ปลด	สับ		อทง.		SF6 บ้านดอนตันกุ่ม
29	SPN06S-06	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
30	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
31	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R R.บ้านทางตลาด
32	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
33	SPN06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

# สถานะจ่ายไฟก่อน

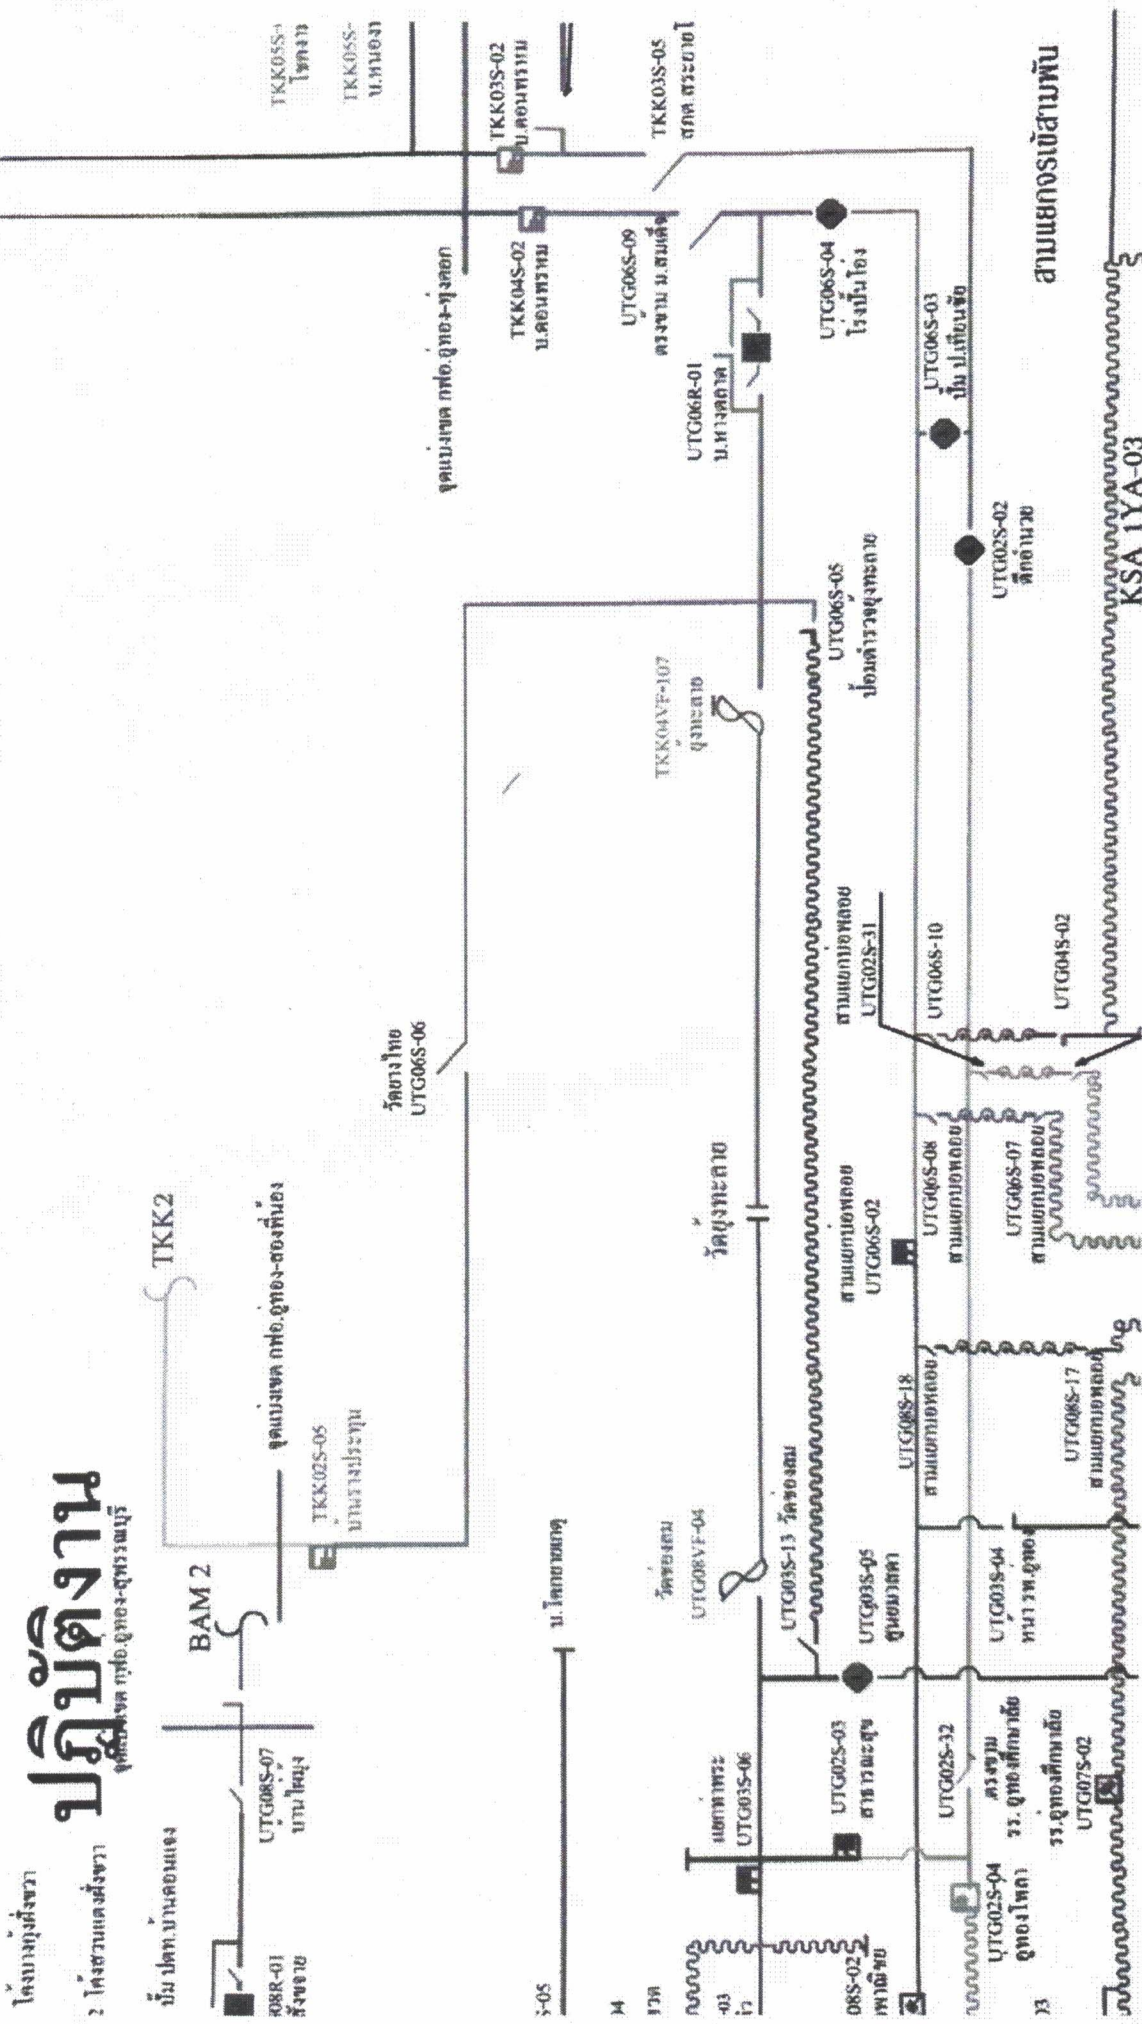

โดยช่างผู้จัดทำ

2 โคงชาวนแดงสังขวา

## ปฏิบัติงาน

จุดแบ่งเขต กฟอ. อุทอง-อุทองเหนือ

บีม ปตท. บานลอมแดง

BAM 2

TKK2

จุดแบ่งเขต กฟอ. อุทอง-อุทองเหนือ

TKK02S-05

บ.พนาภิรมย์

วัดช่างไทย

UTG06S-06

3-05

34

17A

06S-02

06S-03

06S-04

33


สถานะก่อนเข้าสัมพันธ์

KSA 1YA-03

# สถานะจ่ายไฟตอน

## ปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงาน  
ย้ายเสาไฟฟ้า ๒๒ เควี  
(งานร้องเรียน)

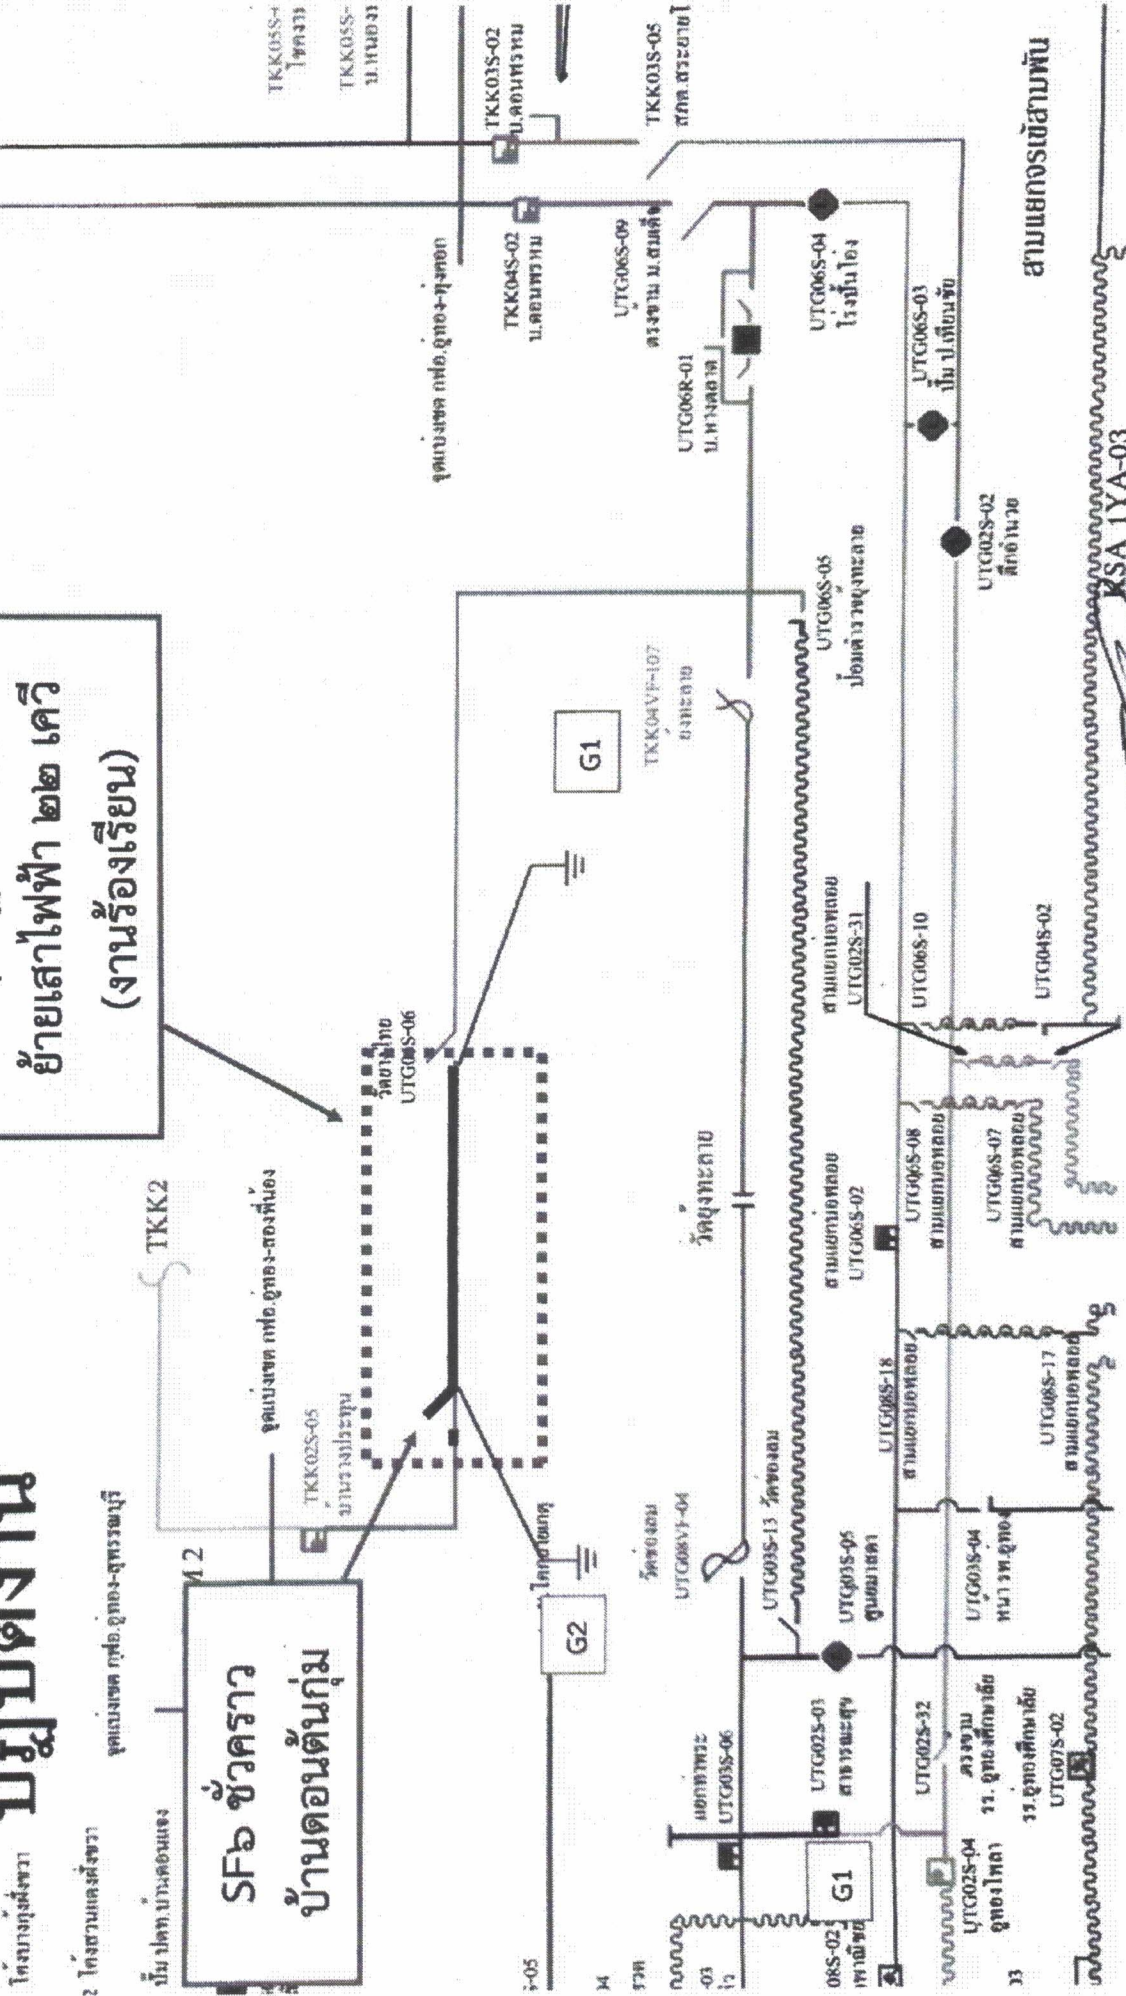

KS A 1YA-03

**แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน  
(Job Hazard Plan)**


วัน/เดือน/ปี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 งานที่ปฏิบัติ ย้ายโหลตเพื่อดำเนินการย้ายโหลตเพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ๒๒ เควี (งานร้องเรียน)  
 สถานที่ บริเวณ ม.๒ ค.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

**ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย**

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๒๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกันทางเตือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิดซ์.....๒.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑. จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒. สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔. ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	- ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้วย Voltage Detector	
๕. ระบบไฟฟ้าแรงสูง	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้วย Voltage Detector และทำการช็อตกราวด์ หัว-ท้าย จุดปฏิบัติงาน - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุททอง  
 เพื่อโปรดทราบและ  
 ดำเนินการต่อไป

  
 นายวัฒนา อานุศรี  
 (ผู้ควบคุมงาน)
