



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุธา
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

Switching Deadline
วันที่ 9 ธ.ค. 62

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟภ.สท.

ศก.การไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแควเวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|----------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| ๑. | 7 สท. | 7/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า | คิลห้องเย็น SPA07S-06 | Disสถานีกีฬา 2,Disจามจรี | โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘ |
| ๒. | 9 สท. | 8/12/62 | 08.00 | 17.00 | สุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว สถานีสท.2 | DOE จุดA | นายโอกาส บุตรบรรเทิง |
| ๓. | 7 สท. | 9,12/12/62 | 08.00 | 17.00 | | DDEร้านทุเรียน | DDEคิงข้ามถนน | |
| ๓. | 7 สท. | 10/12/62 11/12/62 | 08.00 | 17.00 | | DDEวัดท่าโขลง | DDEคิงข้ามถนน | * ๓๐ DDE วันที่ 10 ม.ค. ๖๓ จ.จ.ว. วันที่ 11 ธ.ค. ตามที่แนบ * |
| ๔. | 7 สท. | 14/12/62 | 08.00 | 17.00 | | คิลห้องเย็น SPA07S-06 | Disสถานีกีฬา 2,Disจามจรี | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สท.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาล่วงเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SPA07 จาก DDE วัดท่าโขลง ถึง DDE อินทวงคน
ในวันที่ 10/12/62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1716/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ ๑๐๖ ส.ค.น.ประ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
รจก.๖ อ.ป.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.น.(คฟ.) 3425
เรียน ผจก. กฟภ.สท.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุธา)
อก.ป.น.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแควเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

วัดท่าโขลง

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 10,11 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | ก่อสร้าง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1716/62 |
| | นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร | | วันที่ | 9 ธันวาคม 2562 |
| |  | | วันที่ | 9 ธ.ค. 62 |
| |  | | วันที่ | 9 ธ.ค. 62 |
| | 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง วันที่ 10 ธ.ค. 62 | | | | | | |
| 2 | กฟจ.สพ. ขอตัด DDE ในวันที่ 10 ธ.ค. 62 | | | | | | |
| 3 | BAM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAM | - | |
| 4 | SP-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | |
| 5 | BAM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 6 | BAM07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 7 | SPA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 8 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 9 | ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก BAM07 | | | | | | |
| 10 | BAM07S-05 | ปลด | ล๊اب | | บปม. | SCADA | SF6 วัดโพธิ์ค้อย |
| 11 | BAM02S-12 | ปลด | ล๊اب | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 12 | Dis ชค. SPA07 | ล๊اب | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 13 | BAM02S-12 | ล๊اب | ปลด | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 14 | เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 15 | แจ้งกฟจ.สพ. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน ออก | | | | | | |
| 16 | หลังกฟจ.สพ. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน ออก แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 17 | แจ้ง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ ดิ่งข้ามถนน ออก | | | | | | |
| 18 | หลัง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ ดิ่งข้ามถนน ออกแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 19 | แจ้ง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ วัดท่าโขลง ออก | | | | | | |
| 20 | หลัง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ วัดท่าโขลง ออกแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 21 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 22 | แจ้งกฟจ.สพ. นำโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน เข้า | | | | | | |
| 23 | Dis ชค. SPA07 | ปลด | ล๊اب | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 24 | BAM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAM | - | |
| 25 | SP-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | |
| 26 | BAM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 27 | BAM07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 28 | SPA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 29 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | - | |

สิ้นสุด Switching วันที่ 10 ธ.ค. 62

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 30 | เมื่อพร้อมทำงานในวันที่ 11 ธ.ค. 62 | | | | | | |
| 31 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ | | | | | | |
| 32 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 33 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| ***สิ้นสุด Switching วันที่ 11 ธ.ค. 62 ช่วงเช้า*** | | | | | | | |
| 34 | หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 35 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 36 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| ***สิ้นสุด Switching วันที่ 11 ธ.ค. 62*** | | | | | | | |
| 37 | เมื่อพร้อมกฟจ.สพ. พร้อมเชื่อม DDE (จะแจ้งอีกทีเนื่องจากวันที่ 11 ฮอทไลน์มีว่าง) | | | | | | |
| 38 | BAM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAM | - | |
| 39 | SP-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | |
| 40 | BAM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 41 | BAM07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 42 | SPA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 43 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 44 | เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 45 | Dis ชค. SPA07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 46 | แจ้งกฟจ.สพ. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน ออก | | | | | | |
| 47 | หลังกฟจ.สพ. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน ออก แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 48 | แจ้ง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ ดิ่งข้ามถนน เข้า | | | | | | |
| 49 | หลัง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ ดิ่งข้ามถนน เข้าแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 50 | แจ้ง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ วัดท่าโขลง เข้า | | | | | | |
| 51 | หลัง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ วัดท่าโขลง เข้าแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 52 | แจ้งกฟจ.สพ. นำโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ Dis วัดโพธิ์นางเทรา - DDE วัดท่าโขลง - DDE ดิ่งข้ามถนน เข้า | | | | | | |
| 53 | ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM07 | | | | | | |
| 54 | BAM02S-12 | ปลด | สับ | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 55 | Dis ชค. SPA07 | ปลด | สับ | | สพ. | | DIS วัดโพธิ์นางเทรา |
| 56 | BAM07S-05 | สับ | ปลด | | บปม. | SCADA | SF6 วัดโพธิ์ค้อย |
| 57 | BAM02S-12 | สับ | ปลด | | บปม. | SCADA | SF6 วัดมะนาว |
| 58 | BAM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAM | - | |
| 59 | SP-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | |
| 60 | BAM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 61 | BAM07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAM | - | |
| 62 | SPA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | - | |
| 63 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | - | |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*** | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ภฟ.สพ.

ถึง ผจก.ภฟ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ป.บ.)-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

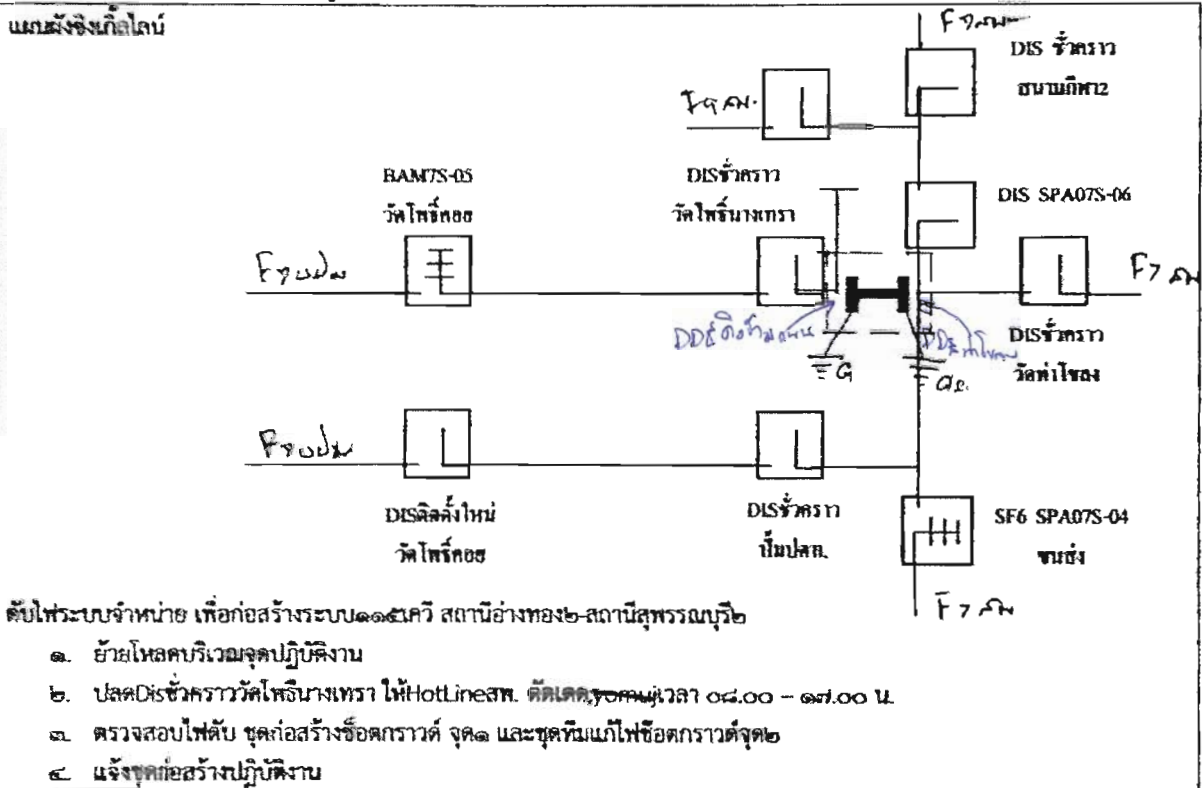
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานตัดกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ภฟ.สพ./รจก.ภฟ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๑...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ภฟ.สุพรรณบุรี มีแผนงานตัดไฟฟ้าบริเวณ ...โค้งวัดโพธิ์บางทราย ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์รี่ข้อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์รี่ ..๗,๘.. สถานี ..สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. โค้งวัดโพธิ์บางทราย

ภฟ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ข.ผ.กส.ภฟ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการตัดไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์วิบูลย์)

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
ทชง.๖(สข.) ผบ.ภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
โทร. ๐๓๔-๕๓๕๑๖๙๙, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐ ภฟ.สพ.
