



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายวิทย์ฯ สนิทศบัญญัติ

Switching Deadline

วันที่ 13 ธ.ค. 62

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีสุพรรณบุรี2 สถานีไฟฟ้า

สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	7 สท.	16/12/62, 19/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-04 SPA07S-06 SPA07S-08	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าโขลง, DDE จุดA,B	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๗๙๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	17/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว วัดโพธิ์บางแพร	DDE จุดA	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๗๙๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	20/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว นิมปศท.	DDEดึงข้าม ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๗๙๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	22/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06, Disชั่วคราว สะพานวัดราชา Disสนามกีฬา2	SPA07S-08, DDEวัดราชา สนามกีฬา	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๗๙๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เข้มมสกุล ตำแหน่ง ทพง.๗ (สท.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๓  มีโอกาสข่าวด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทย์ฯ สนิทศบัญญัติ)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ SPA07 จาก SPA7S-08 ถึง Dis ๑๑.๕๖๖๗๗๙๘๘ วัดท่าโขลง  
ในวันที่ 16, 19 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1748/62 DDE จุด A, B

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๑๗๖๐ อภิรักษ์ เข้มมสกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. อภิรักษ์ เข้มมสกุล

13 ธ.ค. 62

(นายอภิรักษ์ เข้มมสกุล)  
๑๑๑.๓๓๓ เลว.๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

3459

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สท.

อก.บช.(ก.๓) - อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง A แผ่น  
แผนผังแนบ 1. แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

13 ธ.ค. 2562

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SPA7S-04,SPA7S-06,SPA7S-08 - DIS ชค.สนามกีฬา2,วัดท่าโขลง,DDE จุด A,B  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 16,19/12/2019   | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | สพ.   | งานที่ทำ | ก่อสร้างสายส่ง 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1713/62                                     |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  |          | วันที่ 13 ธันวาคม 2562  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 13 ธ.ค. 62   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 13 ธ.ค. 62   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต<br>2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช<br>3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching****งานวันที่ 16/12/62****						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
5	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		
6	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บางปลาหมอ
7	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
8	DIS.ชค. SPA 9	ปลด	สับ		สพ.		หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2
9	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	หมู่บ้านจามจรี
10	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01						
11	BAM01S-12	ปลด	สับ		สพ.	SF6	ม.SM การ์เดนท์
12	SPA07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	ชนสง
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
14	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการโอนโหลดไลน์ SPA07 จาก DIS บีม ปตท. - จุดตัด DDE						
15	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้						
16	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
17	DIS.ชค. SPA 7	ปลด	สับ		สพ.	DIS	บีม ปตท.
18	DIS.ชค. SPA 7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	วัดท่าโขลง
19	SPA07S-06	สับ	ปลด		สพ.	DIS	ห้องเย็นสองพี่น้อง
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ.ทราบ						
24	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
25	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	บางปลาหมอ
26	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		
27	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
28	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
29	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า 16/12/62						
31	เมื่อ กฟส.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 16/12/62						
32	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา		น.	
33	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
34	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
35	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
36	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
40	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
41	DIS.ชค. SPA7	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
42	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01						
43	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
44	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ม.SM การ์เดนท์
45	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
46	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		
47	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
48	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
49	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด 16/12/62						
51	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching****งานวันที่ 19/12/62****						
52	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
53	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
54	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
55	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		
56	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01						
57	BAM01S-12	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ม.SM การ์เดนท์
58	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
59	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
60	DIS.ชค. SPA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
61	SPA07S-06	สับ	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
62	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
64	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ.ทราบ						
66	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา		น.	
67	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
68	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		
69	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
71	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
72	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า 19/12/62						
73	เมื่อ กฟส.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 19/12/62						
74	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ เวลา น.						
75	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
76	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
77	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
78	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		
79	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
80	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
81	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
82	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
83	DIS.ชค. SPA7	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
84	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01						
85	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
86	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ม.สม การ์เดนท์
87	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		
88	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
89	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
90	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
91	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด 19/12/62						
92	*****เชื่อม DDE ที่ปลดไว้ในวันที่ 20/12/62 *****						
93	เมื่อ HL พร้อมทำการเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด และตรวจสอบงานหมายเลข 1750 แล้วเสร็จ						
94	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
95	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		
96	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
97	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
98	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		
99	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		
100	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไล่นโหลดไลน์ SPA07 จาก DIS บั้ม ปตท. - จุดตัด DDE จุด B						
101	DIS.ชค. SPA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บั้ม ปตท.
102	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE ออกทั้ง 3 เฟสเข้าได้						
103	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
104	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไล่นโหลดไลน์ SPA07 จาก DIS วัดโพธิ์นางเทรา - จุดตัด DDE จุด A						
105	DIS.ชค. SPA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
106	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE ออกทั้ง 3 เฟสเข้าได้						
107	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
108	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM07						
109	BAM02S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 วัดมะนาว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
110	DIS.ชค. SPA7	ปลด	สับ		สพ.		DIS	บีม ปตท.
111	DIS.ชค. SPA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	วัดโพธิ์ค้อย
112	DIS.ชค. SPA7	ปลด	สับ		สพ.		DIS	วัดโพธิ์นางเฑรา
113	BAM02S-12	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
114	BAM07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
115	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM			
116	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM			
117	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM			
118	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA			
119	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA			
120	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
121	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด 20/12/62							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖,๑๙...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... SPA๗S-๐๔ - Disชั่วคราวสนามกีฬา๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖ กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

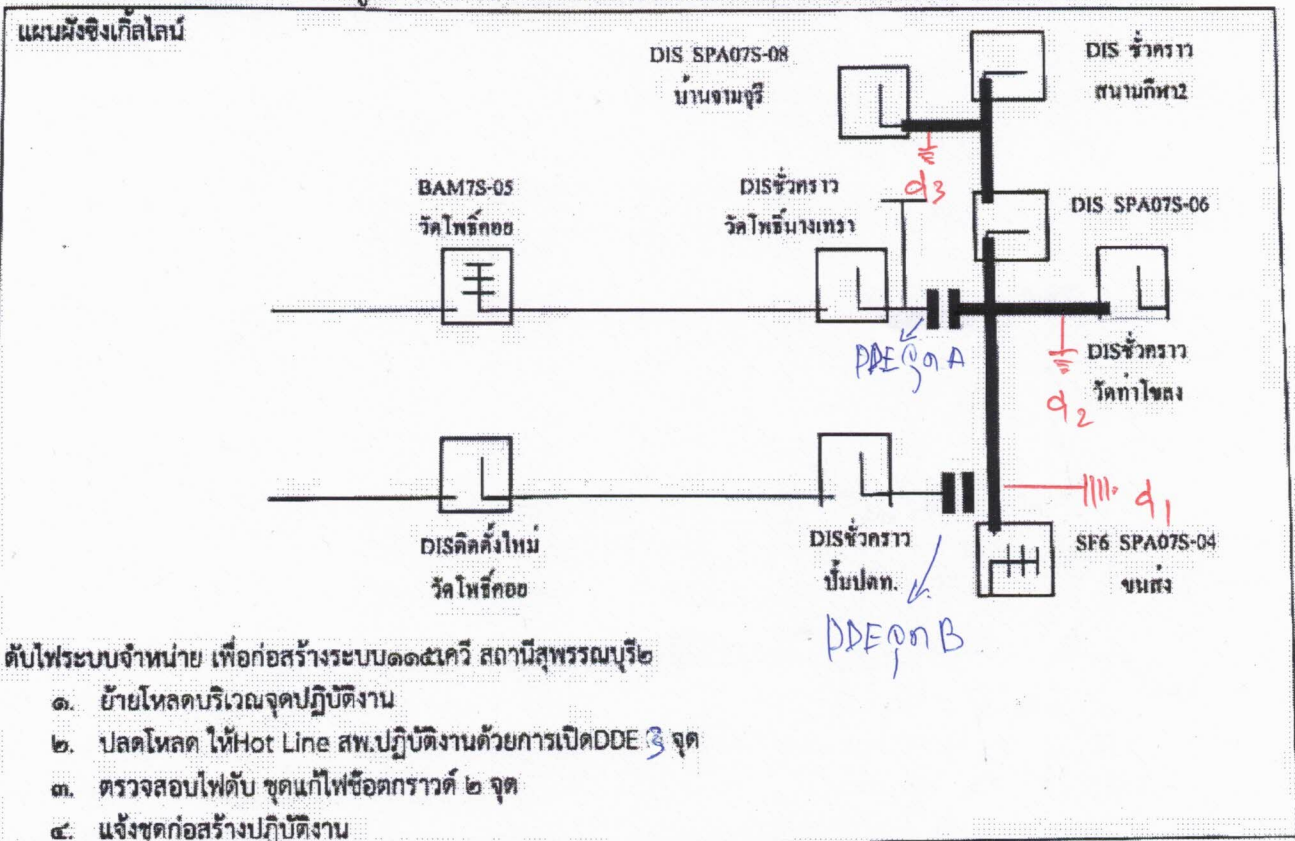

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ  
  
๒๐๑

๑๒/๑๒/๖๒  
(นายอานัติ พลเสน)  
พงษ.๖(สข.) ผ.บ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
