



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY ADMINISTRATION

เลขที่ ก.๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สนั่นศึกษญา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟล.สพ.

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีสุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า

สุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งเขยแบน จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	16/12/62, 19/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าโถง DDE จุดA,B	โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	17/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว วัดโพธิ์นางพรา	DDE จุดA	โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	20/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว ป้อมปท.	DDEตั้งห้าม ถนน	โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	22/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-06, Disชั่วคราว สะพานวัดราชา Disสนามกีฬา2	SPA075-08, DDEวัดราษฏร์ สามัคคี	โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๕๕๕ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พท.จ. (สท.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๙๕๕๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีเอกสารข่าวด มคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สนั่นศึกษญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟล.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

มคฟ ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SPA7 จาก Dis ชั่วคราว ป้อมปท ถึง DDE ตั้งห้าม ถนน

ในวันที่ 20/12/62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1750/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล
13 ธ.ค. 62

รทพร ตันติภรณ์กิจ
(๐๙๖.๖ แทน นว.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.) 3481

เรียน ผจก. กฟล.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



มจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)
18 ธ.ค. ๒๐๒๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปั้ม ปตท.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1750/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	14 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 -12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด (*SPA07VB-01 ชำรุด ปัจจุบันรับไฟจาก SPA10VB-01)						
2	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออก						
5	แจ้งชุดขอทไลน์กระแสเข้า ทำการตัด DDE จุดจัมตึงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟส						
6	หลังจากชุดขอทไลน์กระแสเข้า ทำการตัด DDE แล้วเสร็จ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
10	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
12	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	แจ้งชุดขอทไลน์กระแสเข้า ทำการเชื่อม DDE จุดจัมตึงข้ามถนน เข้าทั้ง 3 เฟส						
17	หลังจากชุดขอทไลน์กระแสเข้า ทำการเชื่อม DDE แล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการจ่ายโหลดหม้อแปลงในระบบให้เรียบร้อย						
19	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวปตท.- จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗S-0๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕ควีสถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวปตท.- จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๖-๓๓๘๗๘๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกธ..ตำแหน่ง ชน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

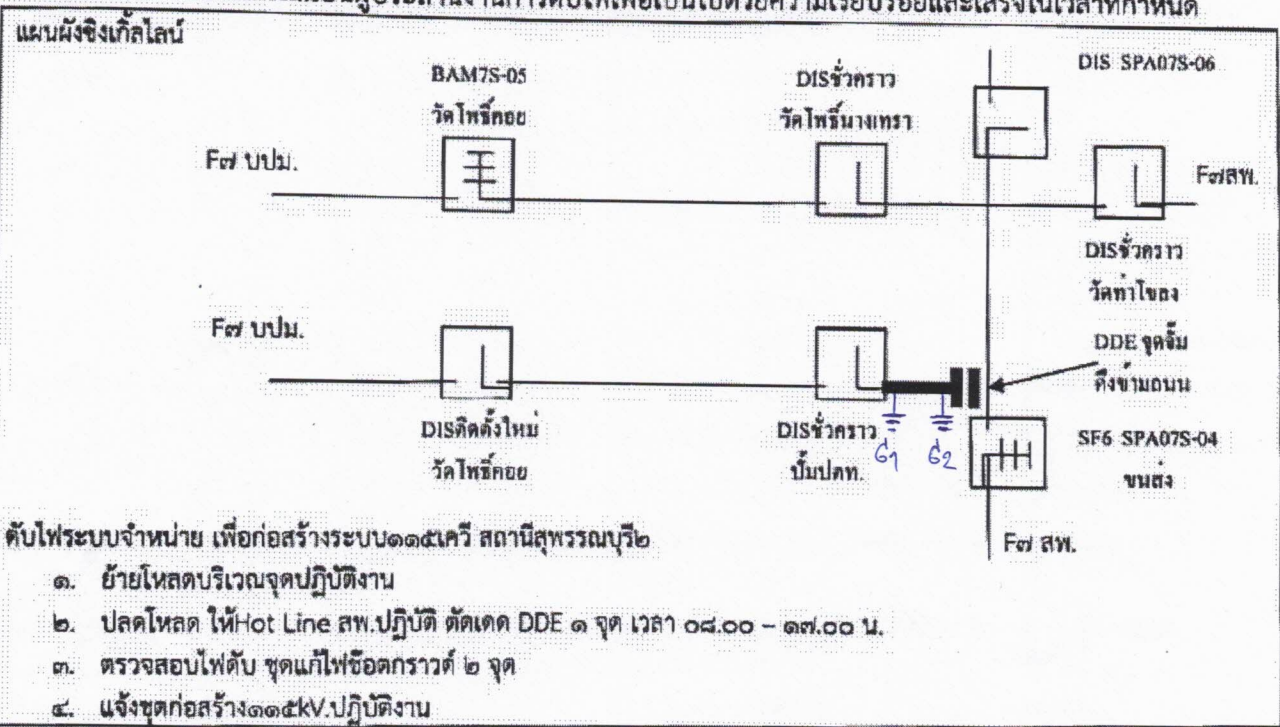

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

สนง. ทม.สพ.
(นายอานัติ พลเสน)
พชง.๖(สข.) ผบ.ก.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
