

Switching Deadline
วันที่ 18 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ อภิชาติกุล

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผอ.กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเตอร์ฯ สถานีไฟฟ้าตอมเจดีย์ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 คจ.	20/12/62	09.00	16.00	แก้ไขระบบจำหน่าย 22 เครือได้ โลบ 115 เครือ	DOA09S-11	SF6 DOA09S-07	โทร.๐๙๐ ๑๔๓๙๓๓๔ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	UT๙2YB	*	*	*		UT๙2YB-01	DOA5YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๙๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
ตำแหน่ง ผอ.กฟภ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DOA9 จาก DOA9S-11 ถึง DOA09S-17
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1753
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ 115kv จาก UT๙2YB-01 ถึง DOA5YB-01
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ
18 ธ.ค. 62


(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
อธิบดี ก.๓

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3437
เรียน ผจก. กฟภ. สพ.
อก.บช.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 ธ.ค. 2562
(นายเลิศพงศ์ แก้วจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) รักษาการแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองปรือ - บ้านหนองกุฎี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-ธ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1753/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	16 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
3	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
4	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อปฏิบัติงาน						
5	DOA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้าม Recloser หนองปรือ
6	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี เพื่อปฏิบัติงาน						
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv DOA05YB-01 ว่าสถานะโซว์ open						
8	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
9	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw.ใบมีด 115 kv
10	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw.ใบมีด 115 kv
11	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ใบมีด 115 kv
12	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		Sw.ใบมีด 115 kv
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตรวจสอบ DOA09S-07 SF6 บ้านหนองกุฎีว่าโซว์ OFF และให้ทำการล๊อคคาน						
14	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟผ.ทราบ						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					สพ.	
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					สพ.	
17	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
18	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลดShort Ground จุด G1					สพ.	
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลดShort Ground จุด G2					สพ.	
22	ไฟระบบ 115 เควี						
23	DOA05YS-01				DOA		Sw.ใบมีด 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		Sw.ใบมีด 115 kv
25	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		Sw.ใบมีด 115 kv
26	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		Sw.ใบมีด 115 kv
27	UTG02YB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
28	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
29	จ่ายไฟระบบ 22 เควี						
30	DOA09S-11	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้าม Recloser หนองปรือ
31	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ปากทางศาลเจ้าพ่อเทพาฯ-หนองกุฎี...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี
รายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๙... สถานีฯ ...ดอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ...ปากทางศาลเจ้าพ่อเทพาฯ-หนองกุฎี...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายวันฉลอง เทียนเทศ ..พชง.๔(ปฟ.)ผ.บ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
๐๘๖-๕๐๓๓๐๗๖..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายธนัช มาลัยวงษ์...ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

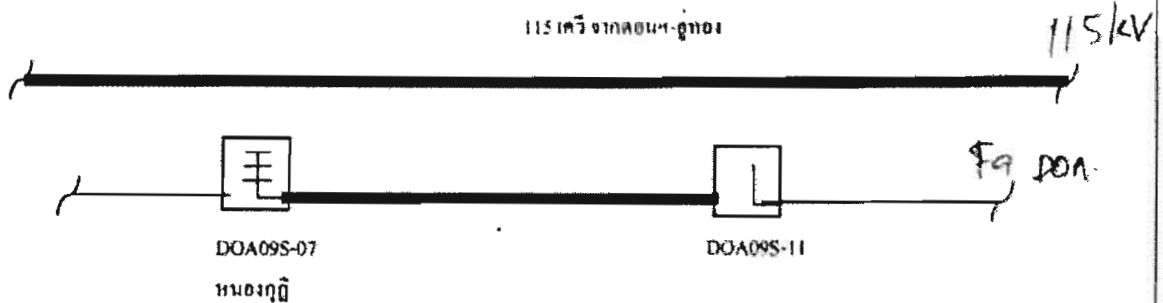

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และ ๑๑๕ เควี ปรับปรุงระบบจำหน่าย F๙ ดอนเจดีย์

๑. ปลด Dis DOA๐๙S-๑๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดหิมแก่ไฟข้อศกราวจุด๑และจุด๒
๓. แจ้งชุดซ่อมย่อยสพ. ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๓๕๘๕๕, ๓๕๘๖๐
