



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 2 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๑๓๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมณี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังส่งเขบนับ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๗ ม.ค.๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟปักเสาพาดสายใหม่	รีโครเซอร์ คอนยาร DBA๔R- ๐๓	จุดตัดเคส บ้านคอนยาร	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๔ เครื่อง ๑๖๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชร.๗ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ DBA4 จาก DBA4R-03 ถึง DDE บ้านคอนยาร

ในวันที่ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1790/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนิต งามวรวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3589
เรียน ผจก. กฟผ. กฟ. กษ.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

23 ธ.ค. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
จ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานคลอง9				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	พ.ค. 63	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย		1770/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	20 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองหอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R	บ้านดอนยาว
4	DBA04R-03	สับ	ปลด		สข.		R	บ้านดอนยาว
5	แจ้ง กฟส.สข. ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ DBA04R-03บ้านดอนยาว ออกทั้ง 3 เฟส							
6	เมื่อ กฟส.สข. ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ DBA04R-03บ้านดอนยาว ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ							
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1							
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2							
10	แจ้ง กฟส.สข. ทำการตัด DDE บริเวณสะพานคลอง9							
11	เมื่อ กฟส.สข. ทำการตัด DDE บริเวณสะพานคลอง9 แล้วเสร็จ							
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1							
13	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สข.		DIS	บ้านดอนไร่
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ							
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3							
16	แจ้ง กฟส.สข. ปฏิบัติงานได้							
17	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองหอม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
19	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองหอม
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G3							
21	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS	บ้านดอนไร่
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ							
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1							
24	แจ้ง กฟส.สข. ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานคลอง9							
25	เมื่อ กฟส.สข. ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานคลอง9 แล้วเสร็จ							
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1							
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้ง กฟส.สข. ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ DBA04R-03บ้านดอนยาว เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	DBA04R-03	ปกติ	สับ คง Nonreclosing+ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
30	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R ประตุน้ำคลองหอม
31	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R บ้านดอนยาว
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ผังคัปไฟงานปรับปรุงโรงรถของรถอเนกขารถึงสะพานคลอง ๑

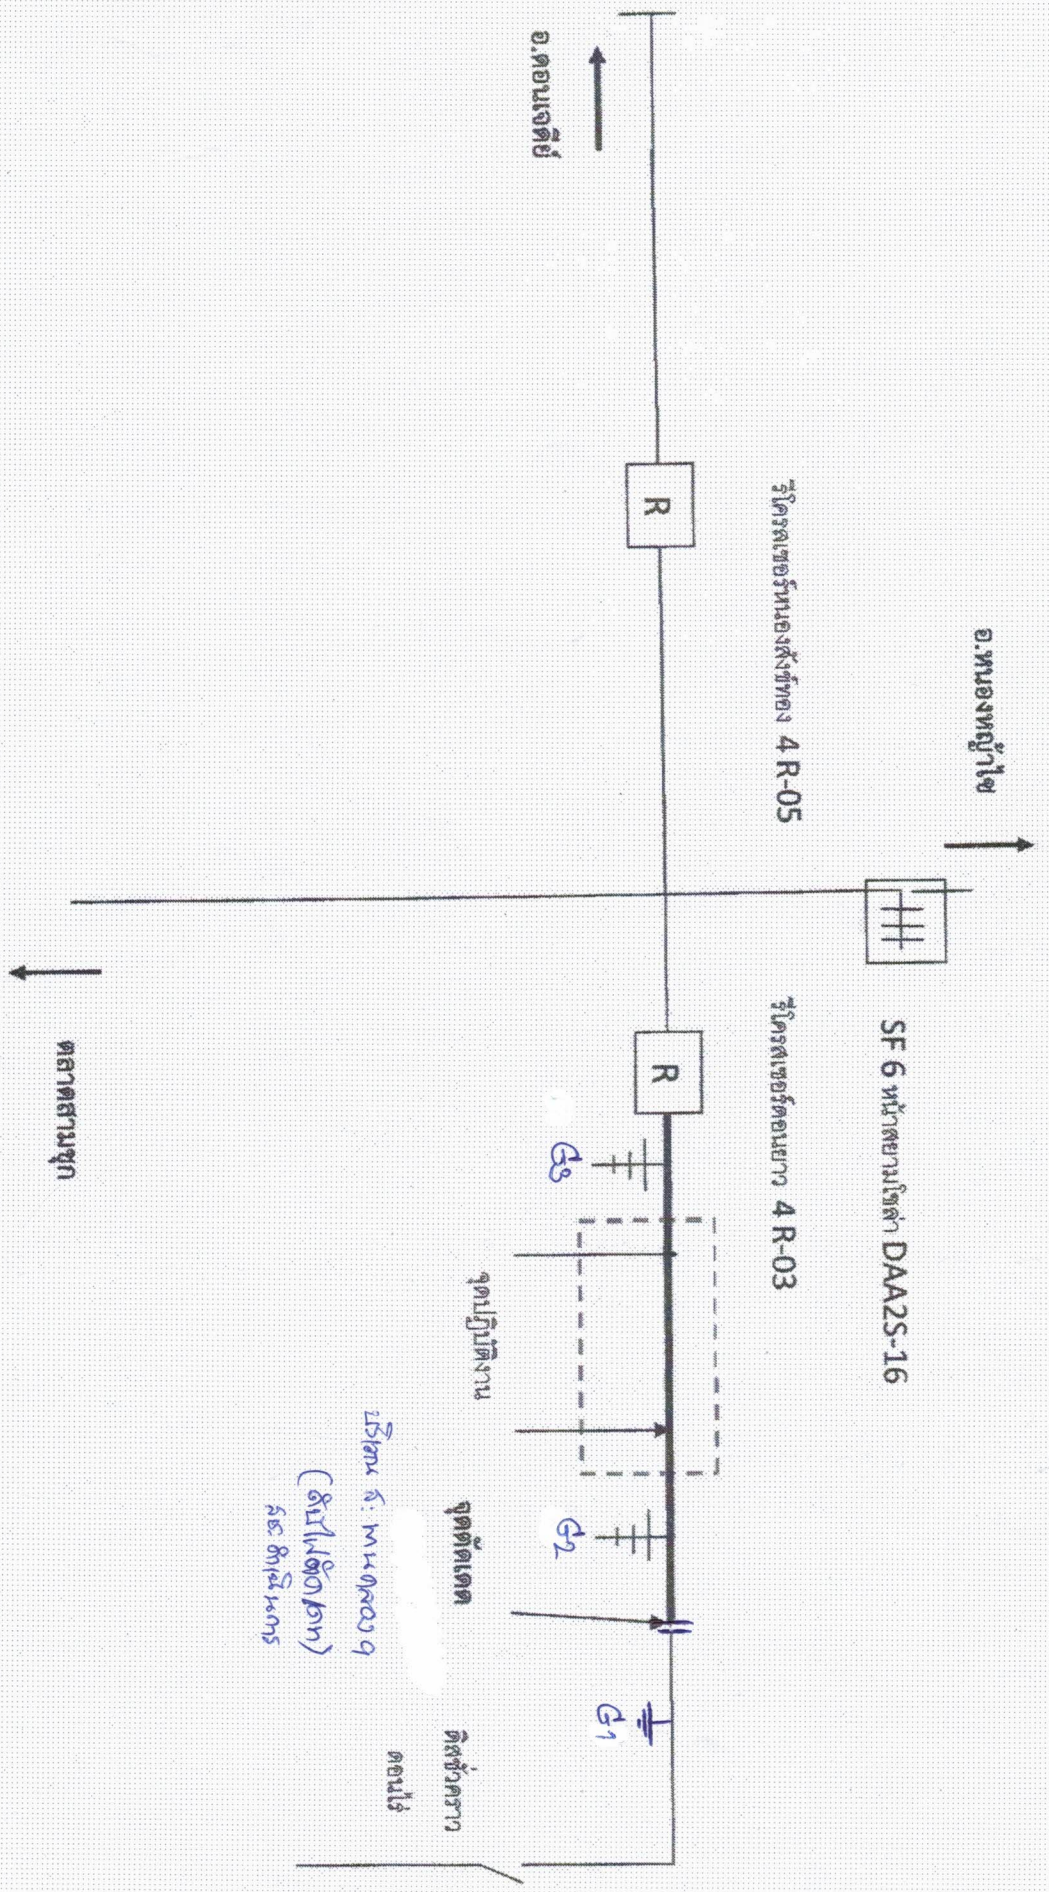

บริเวณ ก: มน.ถาวร ๑
(ยังไม่ตัด/ทำ)
ส.๕ ๘/๑๕/๕๓๗๕

ติดตั้งคราก
คอนกรีต

ตลาดสามชุก

โรงรถของรถอเนกขารของ 4 R-05

โรงรถของรถอเนกขาร 4 R-03
