



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ 0.๓ /๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
 ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์เชียร

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ. (ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท), กฟ.จ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	9/01/63	08.00	16.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	ดิสห้องเก็บ SPA075 06	Dis สนามกีฬา 2.0๒จามบุรี	ไพโรจน์ สวัสดิ์เชียร
๒.	7 สท.	10/01/63	08.00	17.00	สถานีให้ไฟฟ้าสุพรรณบุรี2	DDE วัดโพธิ์บางเพรา	DDE ดึงข้ามถนน	นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	12/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis สถานีสุพรรณ2	DDE ดึงข้ามถนน	
๔.	7 สท.	13/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis บึงปลาท.	DDE ดึงข้ามถนน	
๕.	7 สท.	14/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	SPA075 04	Dis ท่าโสม, โพธิ์บางเพรา, SPA075 06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พทง.๗ (สข.) โทร ๐๘๕-๐๐๙๙๕๕๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟ.จ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ SPA7 จาก SPA75-04 ถึง SPA 075-06  
 ในวันที่ 14 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1825/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พวิศ ราชสุวิมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

สำหับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
 เรียน ผจก. ผก.สท., กฟ.บ.ป.ง.  
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

6 ม.ค. 2563  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)  
 ๐๙/๑๒/๖๒

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนหลวง357		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ม.ค. 63	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง 115 เควี
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1825/62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มกราคม 2563
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ม.ค. 63
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 6-1-63
	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
4	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
6	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
7	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
8	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
9	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07						
10	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
11	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
12	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
13	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
14	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนจ่ายจาก SPA09						
15	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS สนามกีฬา2
16	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
17	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
18	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
19	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา (ตามผังแนบ)						
20	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา แล้วเสร็จ						
21	จ่ายไฟถึง DDE บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา						
22	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G5						
29	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
31	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
32	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
33	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
34	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
35	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
37	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
39	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
40	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
41	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
42	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
43	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3						
47	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4						
48	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G5						
49	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
50	แจ้งกพจ.สพ.ทำการไลนไหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบึง ปตท.						
51	เมื่อกพจ.สพ.ทำการไลนไหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบึง ปตท. แล้วเสร็จ						
52	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
53	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บึง ปตท.
54	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ จุด B บริเวณดิ่งข้ามถนนเลยบึง ปตท. (ตามผังแนบ)						
55	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ จุด B บริเวณดิ่งข้ามถนนเลยบึง ปตท. แล้วเสร็จ						
56	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM07						
57	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
58	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS บึง ปตท.
59	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
60	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์คอย
61	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
62	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์คอย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้งพจ.สพ.ทำการนำโหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบีม ปตท. กลับ						
64	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA09						
65	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
66	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สนามกีฬา2
67	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
69	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
70	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
71	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
72	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
73	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๔...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี  
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานี  
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์รี่ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๔ - SPA๐๗S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ...ชุดก่อสร้างเขต... เบลวโทรศัพท์  
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิกร...ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์  
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

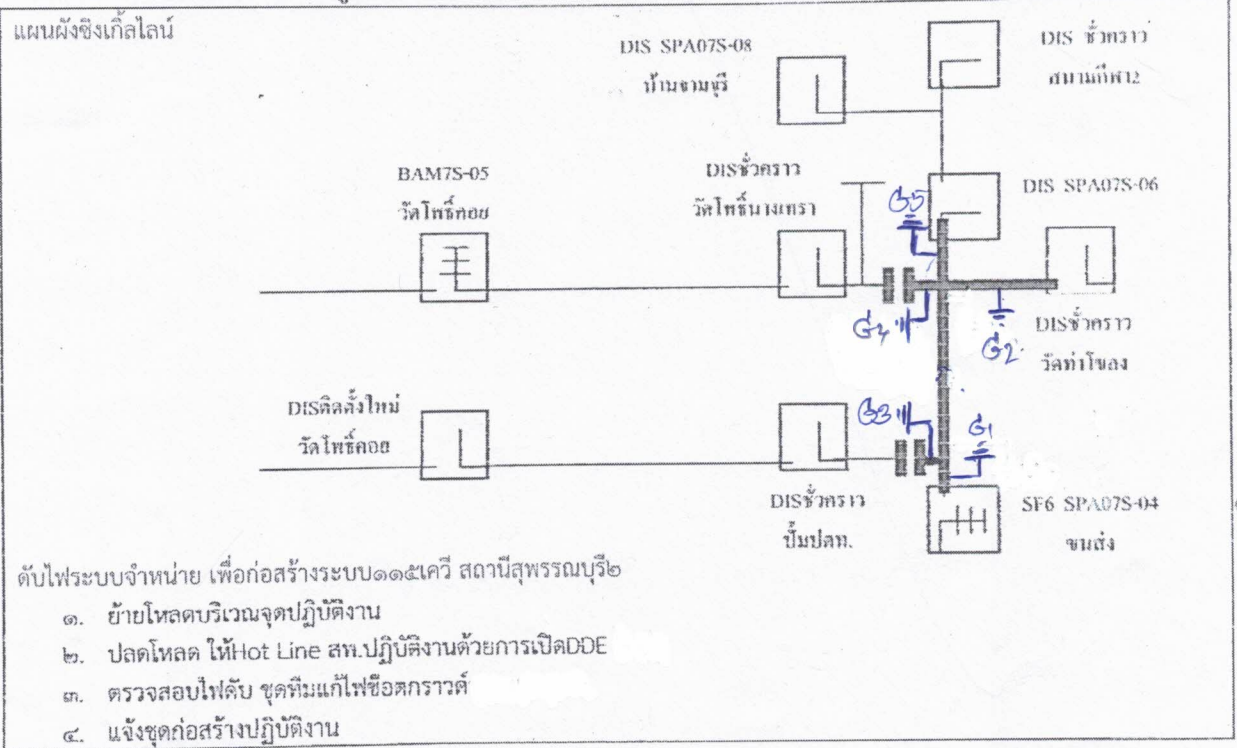

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ  
  
จาก(ท).กฟจ.สพ.

(นายอนากร สุวรรณประทีป)  
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
