

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓-กปน.(คฟ.) 382

เรียน ผอ.ก.ฟ.๕๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสำรวจชั้น 3 แผน

แผนผังแนบ 2 แผน

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์) 11 ก.พ. 64

อก.ปน.(ก.๓)

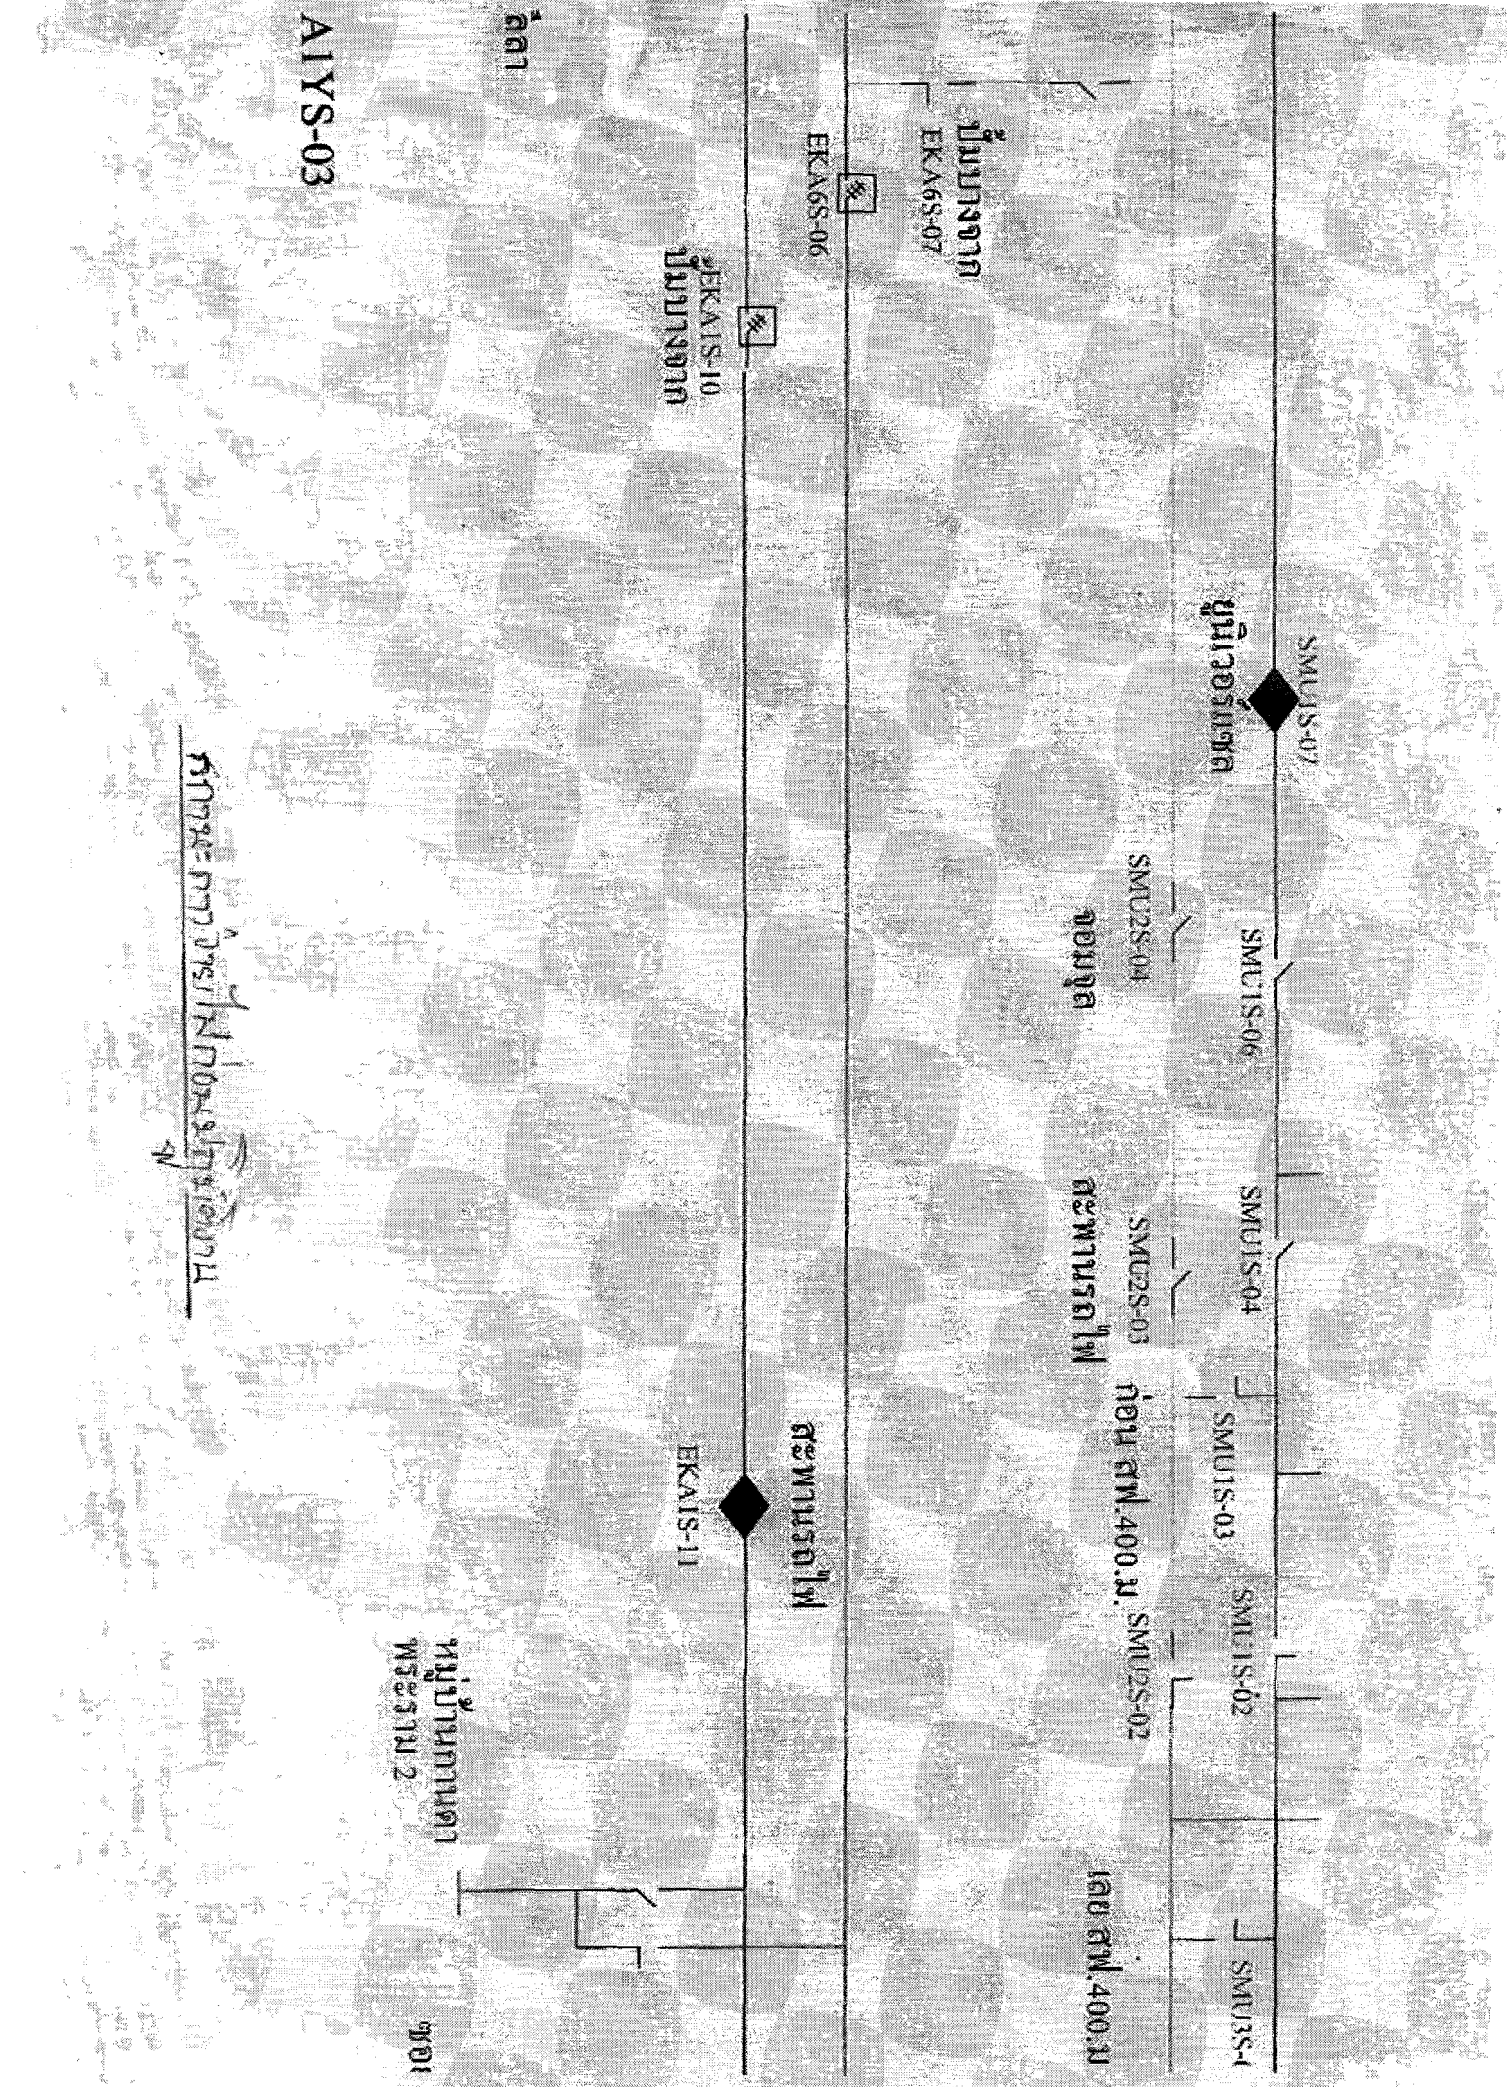
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ถึง ป้อมบางจาก แนวถนนพระราม 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	235/61	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ			วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ก.พ. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ก.พ. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
3	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
4	EKA01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		EKA		6.3 MW
5	EKA06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		EKA		2.15 MW
6	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
7	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		5 MW
8	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
9	SMF07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMF		4.5 MW
10	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนรับไฟจาก SMU03						
11	EKA01S-14	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6 หมู่บ้านเดอะแกรนด์
12	EKA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ป้อมบางจาก (บข)
13	ย้ายโหลด EKA06 บางส่วนรับไฟจาก SMF07						
14	EKA06S-14	ปลด	สับ		คกข.		SF6 เขิงสะพานบ้านไร่ฝั่งโคกขาม
15	EKA06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ป้อมบางจาก (ล่าง)
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
17	Dis ชั่วคราวไลน์ EKA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		Dis ก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ (ล่าง) จุดB
18	Dis ชั่วคราวไลน์ EKA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		Dis ก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ (บน)จุดA
19	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กพอ.สค.ทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
26	EKA01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		EKA		
27	EKA06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		EKA		
28	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
29	SMUBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU		
30	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
31	SMF07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMF		
32	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
33	เมื่อทุกชุดปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ** พร้อมตรวจสอบ SF6 EKA1S-11 ให้สับอยู่						
34	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
35	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
36	EKA01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		EKA		
37	EKA06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		EKA		
38	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
39	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		
40	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
41	SMF07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMF		
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
46	Dis ชั่วคราวไลน์ EKA01	ปลด	สับ		สค.		Dis ก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ (บน)จุดA
47	Dis ชั่วคราวไลน์ EKA06	ปลด	สับ		สค.		Dis ก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ (ล่าง) จุดB
48	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนรับไฟจาก SMU03						
49	EKA01S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6 ป้อนบางจาก (บน)
50	EKA01S-14	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 หมู่บ้านเตอะแกรนด์
51	ย้ายโหลด EKA06 บางส่วนรับไฟจาก SMF07						
52	EKA06S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 ป้อนบางจาก (ล่าง)
53	EKA06S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 เชิงสะพานบ้านไร่ฝิ่งโคกขาม
54	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
55	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
56	EKA01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		EKA		
57	EKA06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		EKA		
58	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
59	SMUBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
61	SMF07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุดสวิตชิง							



AIYS-03

รูปที่ 1

ตู้แม่ข่ายไมโครมิด

ตู้จ่ายพลังงาน 2

รูปที่ 1

