



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

018

วันที่ 9 ม.ค. 62

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.นช.(ปบ) ๓๖ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ผอ.ปบ.(อ.ต)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA4Y	๑๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	NCA4YS-07	NCB2YB	นายวิวัฒน์ นาคสมัย
๒	NCB1	๑๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	NCB1VB-01	NCB1S-01, NCB1S-02 <del>NCB1S-03</del> , NCB1S-05 NCB1R-02, NCB1S-07	พงษ.๕ กฟอ.นครชัยศรี โทร.๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๓	NCB6	๑๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	NCB6VB-01	NCB6S-01, NCB6S-02 NCB6S-03, NCB2S-08 NCB6S-04	
๔	NCB7	๑๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	NCB7VB-01	NCB7S-01, NCB7S-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนนครชัยศรี-ห้วยพลู (ฝั่งขวา)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ชน.ปบ โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

ลงชื่อ   
( นายสมเกียรติ อ.สงวน )  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครชัยศรี ๓ ม.ค. ๖๒  
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร.๐๓๔-๓๓๓๔๖๑, ๑๔๕๕๕  
โทรสาร.๐๓๔-๓๓๓๔๖๓, ๑๔๕๕๐๘



สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115KV จาก NCA445-07 ถึง NCB276-01  
ในวันที่ 13-๑๑-62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 26/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ NCB1 จาก NCB15-01 ถึง NCB15-02, NCB15-05, NCB1R-02  
ในวันที่ 13-๑๑-62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 26/62 NCB15-05

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ NCB6 จาก NCB65-01 ถึง NCB65-02, NCB65-03, NCB25-05, NCB65-09  
ในวันที่ 13-๑๑-62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 26/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเคอร์ NCB7 จาก NCB75-01 ถึง NCB75-02  
ในวันที่ 13-๑๑-62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 26/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิชิตพงษ์ (โพธิ์ทอง) ประธานงานการขอดับไฟกับ สก.ฉก. 1/1  
5 ม.ค. 62  
ก.๓

สทพร ธานีเอกธรรกิจ  
(ทช.สทพร ธานีเอกธรรกิจ)  
ว.ค. 6 แทน นพ.ฉพ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 018

เรียน ผคฟ. กฟผ.-๑๖๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 4.ม.ค. 2562



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

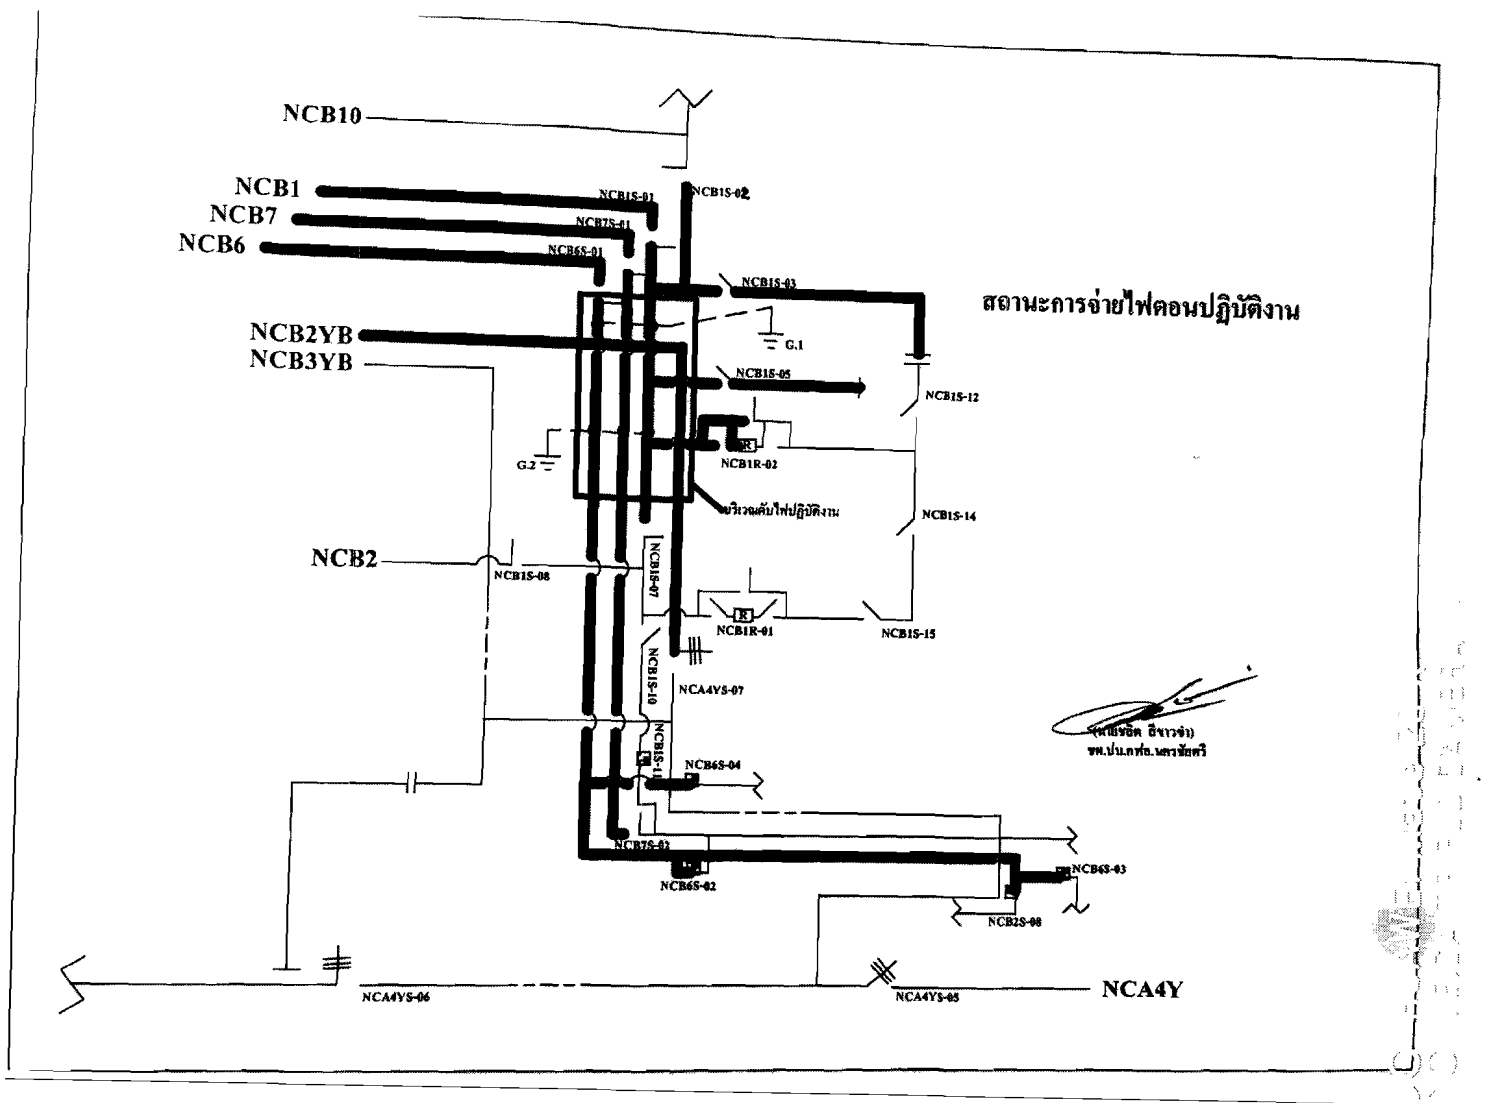
1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนนครชัยศรี - หัวขลุ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 26/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐภาณุจรรย์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 6 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L = 0.37 MW
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		L = 4.77 MW
6	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
7	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		L = 4.37 MW
8	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
9	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 1.37 MW
10	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 3.00 MW
11	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 2.17 MW
12	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 2.81 MW
13	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัตกลางคูเวียง
14	NCB01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R ชุ่มประตูดัดสำโรง
15	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ NCA01						
16	NCB01S-09	ปลด	สับ		นช.		Dis บ้านก้านันช้าง
17	NCB01R-02	สับ	ปลด		นช.		R วัตสำโรง
18	แจ้งกฟอ.นช.ให้ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ NCB01R-02 (ชุ่มประตูดัดสำโรง) ออกทั้ง 3 เฟส						
19	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วนไปจ่ายจาก NCB02						
20	NCB01S-08	ปลด	สับ		นช.		DIS ก่อน บ.TUW
21	NCB01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงไม้จ่ายะ
22	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB04						
23	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รัตนตุ้
24	NCB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
25	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA06						
26	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนักจรล่าง
27	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งช่างหน้าให้ตรวจสอบ NCB02S-08 (SF6 รกส.) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและให้ล๊อคคาน						
29	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC09						
30	NCA01S-15	ปลด	สับ		นช.		SF6 วัดตุ๊กตา
31	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
32	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟ						
33	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
34	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
35	NCB07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้าม รร. ภัทรญาณ
36	NCB01S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.1
37	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.6
38	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.7
39	NCB01S-05	สับ	ปลด		นช.		DIS คลองทราย
40	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv NCB02YB-01 และ Sw.โบมีด 115kv NCB02YS-01,02,03 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด						
41	ตรวจสอบ AB 115kv NCA04YS-07 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลดและล๊อคกุญแจ						
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
49	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
50	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
51	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
52	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
53	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
54	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
55	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
56	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
57	NCB01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดกลางคูเวียง
58	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
59	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
60	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
61	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
62	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
63	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
64	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
66	NCB01S-05	ปลด	สับ		นช.		DIS คลองทราย
67	NCB01S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.1
68	NCB06S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.6
69	NCB07S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.7
70	NCB07S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ตรงข้าม รร. ภัทรญาณ
71	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- -
72	NCB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- -
73	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วนกลับจาก SAC09						
74	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- -
75	NCA01S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 วัดตุ๊กตา
76	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA06						
77	NCB06S-03	ปลด	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
78	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนักวงจรถ่วง
79	แจ้งช่างหน้าให้ปลดล็อคคาน NCB02S-08 (SF6 ธกส.)						
80	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนกลับจาก PMB04						
81	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
82	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ไร่ต้น
83	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วนกลับจาก NCB02						
84	NCB01S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงไม้จำเยะ
85	NCB01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ก่อน บ. TUW
86	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ NCA01 กลับตามสภาพปกติ						
87	แจ้งกฟอ.นช.ให้สับไบเมิตด้านนอกไลน์ของ NCB01R-02 (ซุ่มประตูดัดสำโรง) เข้าทั้ง 3 เฟส						
88	NCB01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นช.		R วัดสำโรง
89	NCB01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		Dis บ้านก้านช้าง
90	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
91	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
92	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
93	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
94	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
95	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
96	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
97	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
98	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
99	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
100	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
101	NCB01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดกลางคูเวียง
102	NCB01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R ซุ่มประตูดัดสำโรง

\*\*\*สิ้นสุด Switching ทั้งหมด\*\*\*



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

(นายโชค ชิงวางใจ)  
พ.บ.ภ.พ.ช. นายโชคใจ
