



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๔๖๔ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กลุ่มแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง.....ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๖ ONB	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เสา - สาย ไฟฟ้าแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ ๖ อม.๒	DIS ONB ๖S-๐๖	จุดปลด DDE ข้างบริษัท สยามน้ำมัน จก.	นายบริชา แก้วสีม่วง โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๒๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิต ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๔๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | ฟีดเดอร์ ONB06 จาก ONB 6S-06 ถึง DDE ข้าง. สยามน้ำมัน จก.

ในวันที่ 24 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 280/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ รักษาการ ผจก.กฟอ.กทบ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ เกษมไชย มาบัณฑิต

(นาย กฤษณะสิทธิ์ รักษาการ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 496

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแบบ ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปบ.(ก.๓) 20 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยวปอ.11 พิเศษ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 280/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กพ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
5	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD = 3.10 MW
6	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD = 0.02 MW
7	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	LOAD = 1.65 MW
8	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	LOAD = 1.70 MW
9	ย้ายโหลด ONB06 บางส่วนไปจ่ายจาก SAA10						
10	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
11	ONB07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11
12	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
13	ONB06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ก่อนถึงโรงงานเพชรชิตินันท์
14	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
15	ONB07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	แจ้งกฟอ.กทบ.ไลน์โหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ช้างบริษัท สยามน้ำมัน ถึง Dis ONB06S-06 ออก						
18	หลังกฟอ.กทบ.ไลน์โหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ช้างบริษัท สยามน้ำมัน ถึง Dis ONB06S-06 ออกแล้วเสร็จ						
19	แจ้ง Hotline 22 เควี ตัด DDE บริเวณไลน์แยกปากทางท่าฉลอม ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ						
20	หลัง Hotline 22 เควี ตัด DDE บริเวณไลน์แยกปากทางท่าฉลอม ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
23	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB	-	-
26	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
27	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
28	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
29	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-

ผู้กฟอ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
34	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
35	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
36	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
37	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
38	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
39	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
40	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	แจ้ง Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณไลน์แยกปากทางท่าฉลอม เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ						
43	หลัง Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณไลน์แยกปากทางท่าฉลอม เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
44	แจ้งกพท.นำโหด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ช้างบริษัท สยามน้ำมัน ถึง Dis ONB06S-06 เข้า						
45	หลังกพท.นำโหนด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ช้างบริษัท สยามน้ำมัน ถึง Dis ONB06S-06 เข้าแล้วเสร็จ						
46	ย้ายโหนด ONB06 บางส่วนกลับจาก SAA10						
47	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
48	ONB07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11
49	ONB06S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ก่อนถึงโรงงานเพชรชิเด็นซ์
50	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
51	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
52	ONB07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11
53	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
54	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
55	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB	-	-
56	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
57	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
58	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
59	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							


แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ

สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.

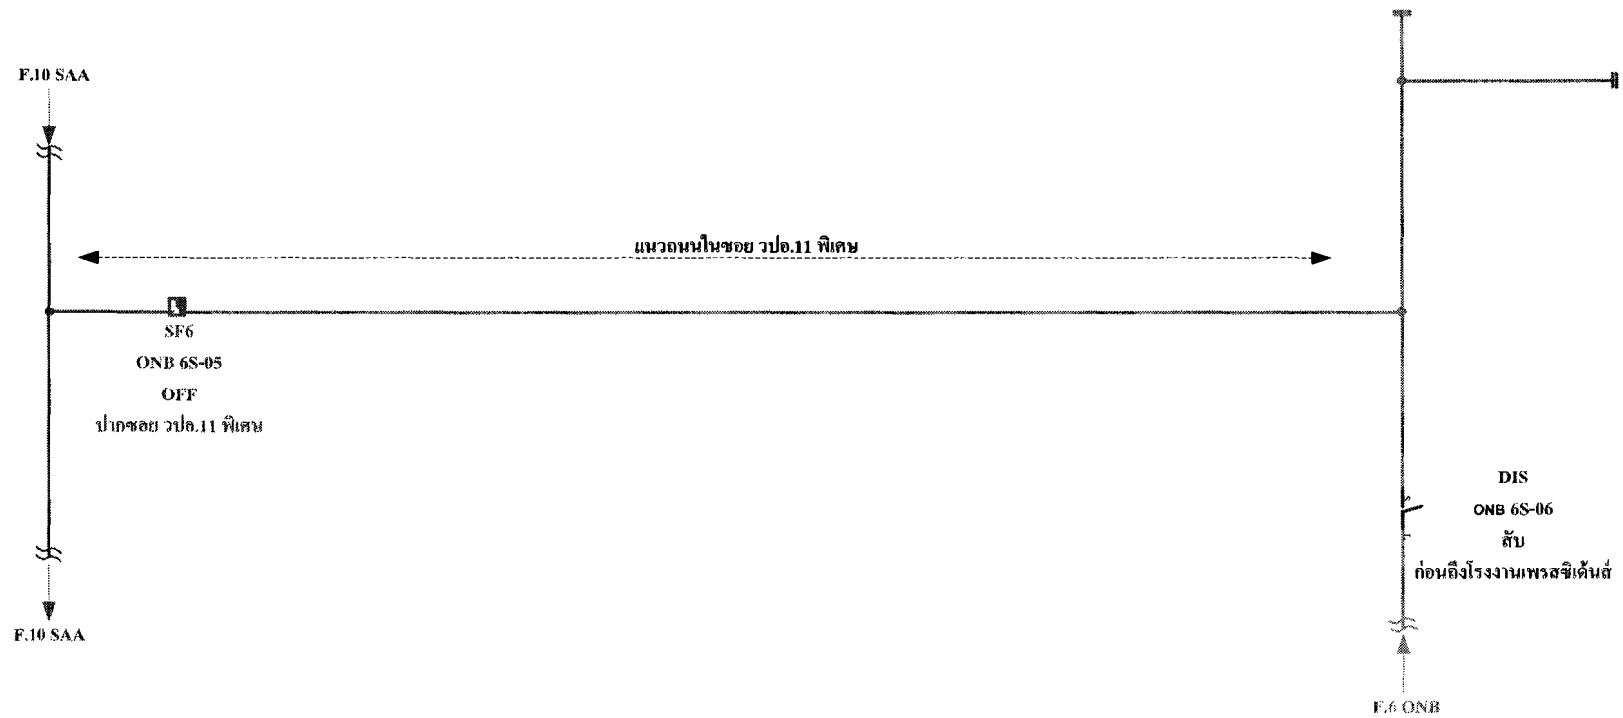

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังตัดไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ช่าง ผกศ., คปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ สายเมนใหม่เป็นสายเปลือยขนาด ๑๕๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๕๕ ต.มม.

สายฟีดเดอร์ 6 หมายเลข ๑๖.2 เส้นที่ไฟดับมีสัญลักษณ์

จุด Shot Ground

