


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BOP05 จาก DH ช่วงตรวจซ่อมคพฟ บังคับ ถึง DH ช่วงตรวจซ่อมคพฟ บังคับ บังคับ
 ในวันที่ 14, 15, 16 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 375/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ประจักษ์ วัฒน ประสานงานขอดับไฟกับ ช่างซ่อม ควบคุมไฟ


 (นายประจักษ์ วัฒน)
 วันที่ 6 มี.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

701

เรียน ผจก. กพฟ. บพอ. ออ.ว. (ก.๓)

อนุมัติให้เลิกแผนป. เพื่อตรวจซ่อมความผิดปกติ
 พร้อมทั้งลงข้อมูลเข้าแผนดิไฟลิ่งใน www.pca.co.th


 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์กุล)

อก.ปบ.(ก.๓) - 8 มี.ค. 2562

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 2 แผ่น



สำเนาเรียน สฟฟ.

๑๐๗ (๓๗๕)

เพื่อทราบ หล่ออัตรพนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ควบคุม
 ที่หน้า ๑๐๗ - ๗. เป็นต้นไป ลงนามจากหัวหน้าศูนย์


 ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ บ้านยางสูง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14,15,16/3/2562 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 315/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 6 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 7 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 มี.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายนัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ท | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ | | | | | | |
| 2 | BOP-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BOP | | |
| 3 | BOP05VB-01 | Auto | Manual | | BOP | | - |
| 4 | BOP04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | บพล. | SCADA | AVR. บ้านยางสูง |
| 5 | BOP05R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT,GND | | บพล. | SCADA | AVR. บ้านหนองรี Manual TAPปรับ TAP 1 |
| 6 | LWU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWU | | |
| 7 | LWU02R-04 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | SCADA | AVR. ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ |
| 8 | ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก LWU02 | | | | | | |
| 9 | DAA09S-19 | ปลด | สับ | | ทปร. | SCADA | SF6 ปลักประตู |
| 10 | BOP05S-13 | สับ | ปลด | | ทปร. | SCADA | SF6 สี่แยกหนองปรือ |
| 11 | ทำการบายพาส BOP05R-03 | | | | | | |
| 12 | SF6.BY PASS | ปลด | สับ | | บพล. | | AVR. บ้านหนองรี |
| 13 | BOP05R-03 | สับ | ปลด | | บพล. | | AVR. บ้านหนองรี |
| 14 | ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก BOP04 | | | | | | |
| 15 | BOP04S-17 | ปลด | สับ | | ทปร. | | SF6 สี่แยกหนองปรือ |
| 16 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | บพล. | | DIS ก่อนถึงAVR.บ้านหนองรี |
| 17 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา08.00 น. | | | | | | |
| 18 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | บพล. | | DIS ข้ามสะพานบ้านยางสูง |
| 19 | แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บพล.ทราบ | | | | | | |
| 20 | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1 | | | | | บพล. | |
| 21 | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2 | | | | | บพล. | |
| 22 | BOP-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BOP | | |
| 23 | BOP05VB-01 | Manual | Auto | | BOP | | - |
| 24 | BOP04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | บพล. | | AVR. บ้านยางสูง |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|--------------|------------|----------|------------------------------|
| 25 | LWU-TP1 | Manual | Auto | | LWU | | | |
| 26 | LWU02R-04 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | | AVR. | ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | | |
| 27 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 28 | BOP-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BOP | | | |
| 29 | BOP05VB-01 | Auto | Manual | | BOP | | - | - |
| 30 | BOP04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | บพล. | | AVR. | บ้านยางสูง |
| 31 | LWU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWU | | | |
| 32 | LWU02R-04 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | | AVR. | ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ |
| ๓๓ | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1 | | | | | บพล. | | |
| 34 | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2 | | | | | บพล. | | |
| 35 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| 36 | DIS ชั่วคราว | ปลด | ล๊ับ | | บพล. | | DIS | ข้ามสะพานบ้านยางสูง |
| 37 | ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04 | | | | | | | |
| 38 | DIS ชั่วคราว | ปลด | ล๊ับ | | บพล. | | DIS | ก่อนถึงAVR.บ้านหนองรี |
| 39 | BOP04S-17 | ล๊ับ | ปลด,ล๊อคคาน | | หปร. | | SF6 | สี่แยกหนองปรือ |
| 40 | ทำการนำ BOP05R-03 เข้าระบบ | | | | | | | |
| 41 | BOP05R-03 | ปลด | ล๊ับ Nonreclosing, ALT,GND | | บพล. | | AVR. | บ้านหนองรี |
| 42 | SF6.BY PASS | ล๊ับ | ปลด | | บพล. | | AVR. | บ้านหนองรี |
| 43 | ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก LWU02 | | | | | | | |
| 44 | BOP05S-13 | ปลด | ล๊ับ | | หปร. | SCADA | SF6 | สี่แยกหนองปรือ |
| 45 | DAA09S-19 | ล๊ับ | ปลด | | หปร. | SCADA | SF6 | ปลั๊กประตู |
| ๔๐ | BOP-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BOP | | | |
| 47 | BOP05VB-01 | Manual | Auto | | BOP | | - | - |
| 48 | BOP04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | บพล. | SCADA | AVR. | บ้านยางสูง |
| 49 | BOP05R-03 | Nonreclosing, ALT,GND | Normal | | บพล. | SCADA | AVR. | บ้านหนองรี Auto TAP |
| 50 | LWU-TP1 | Manual | Auto | | LWU | | | |
| 51 | LWU02R-04 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | SCADA | AVR. | ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | | |

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

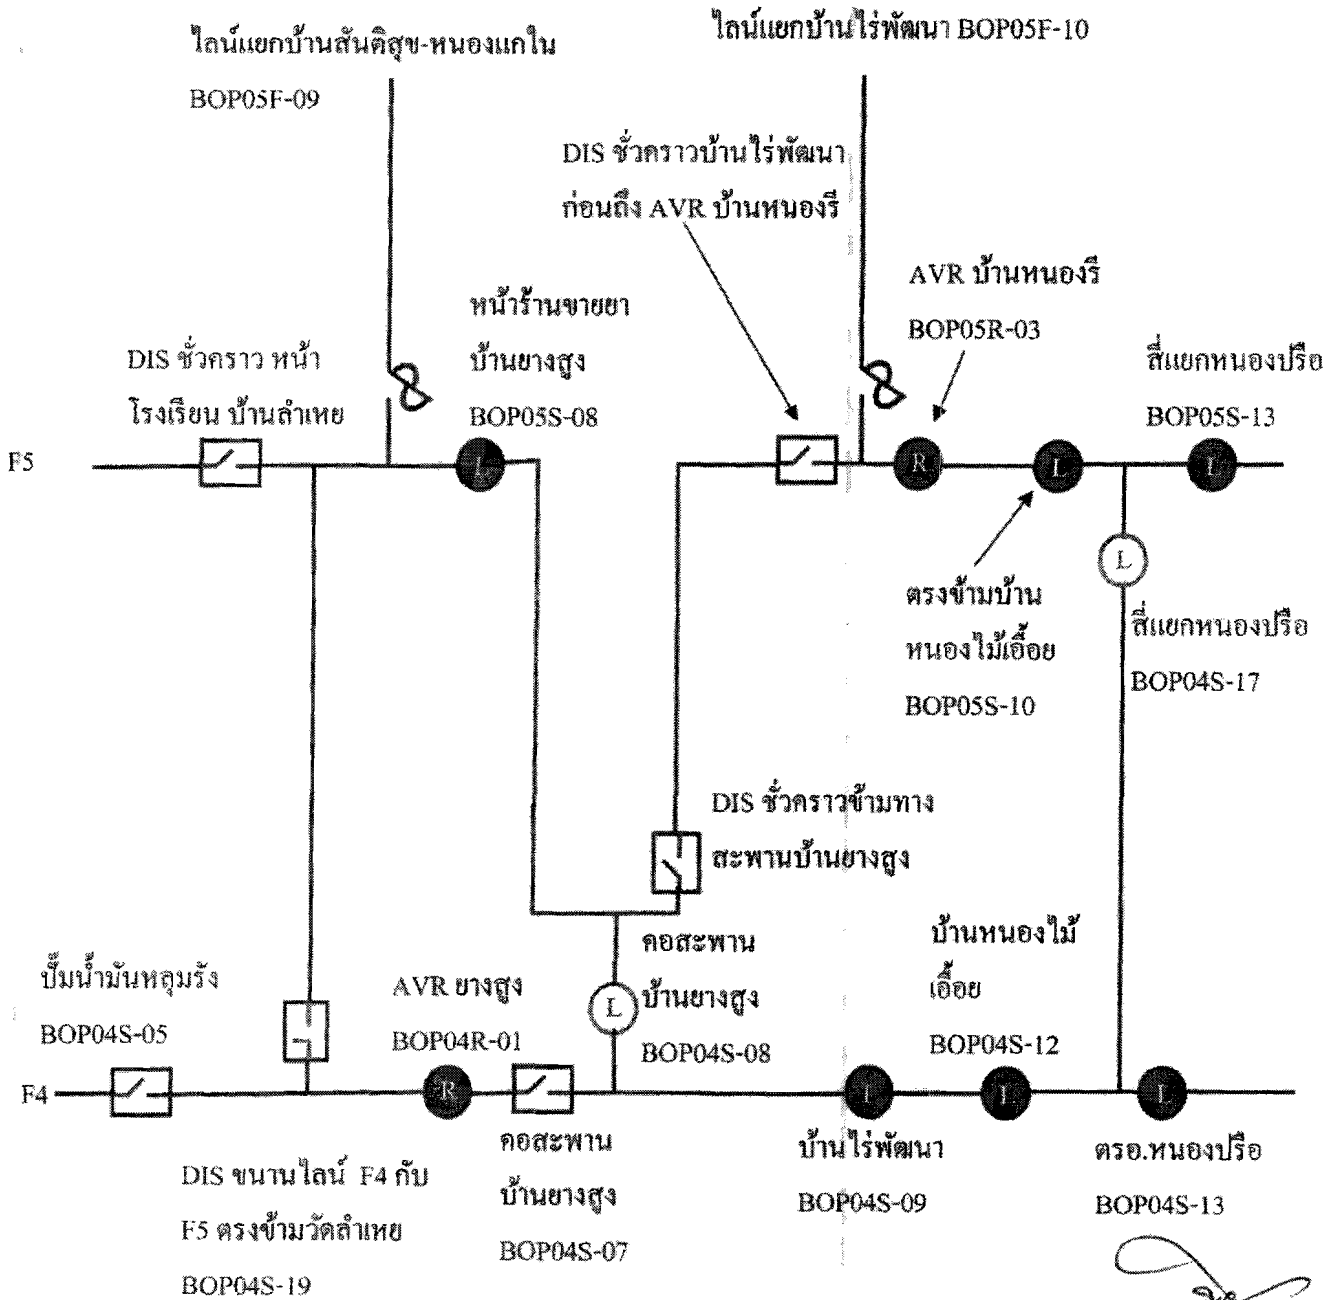

[Handwritten Signature]
๒๖ กพ. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

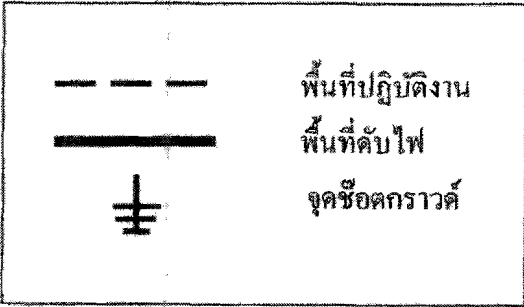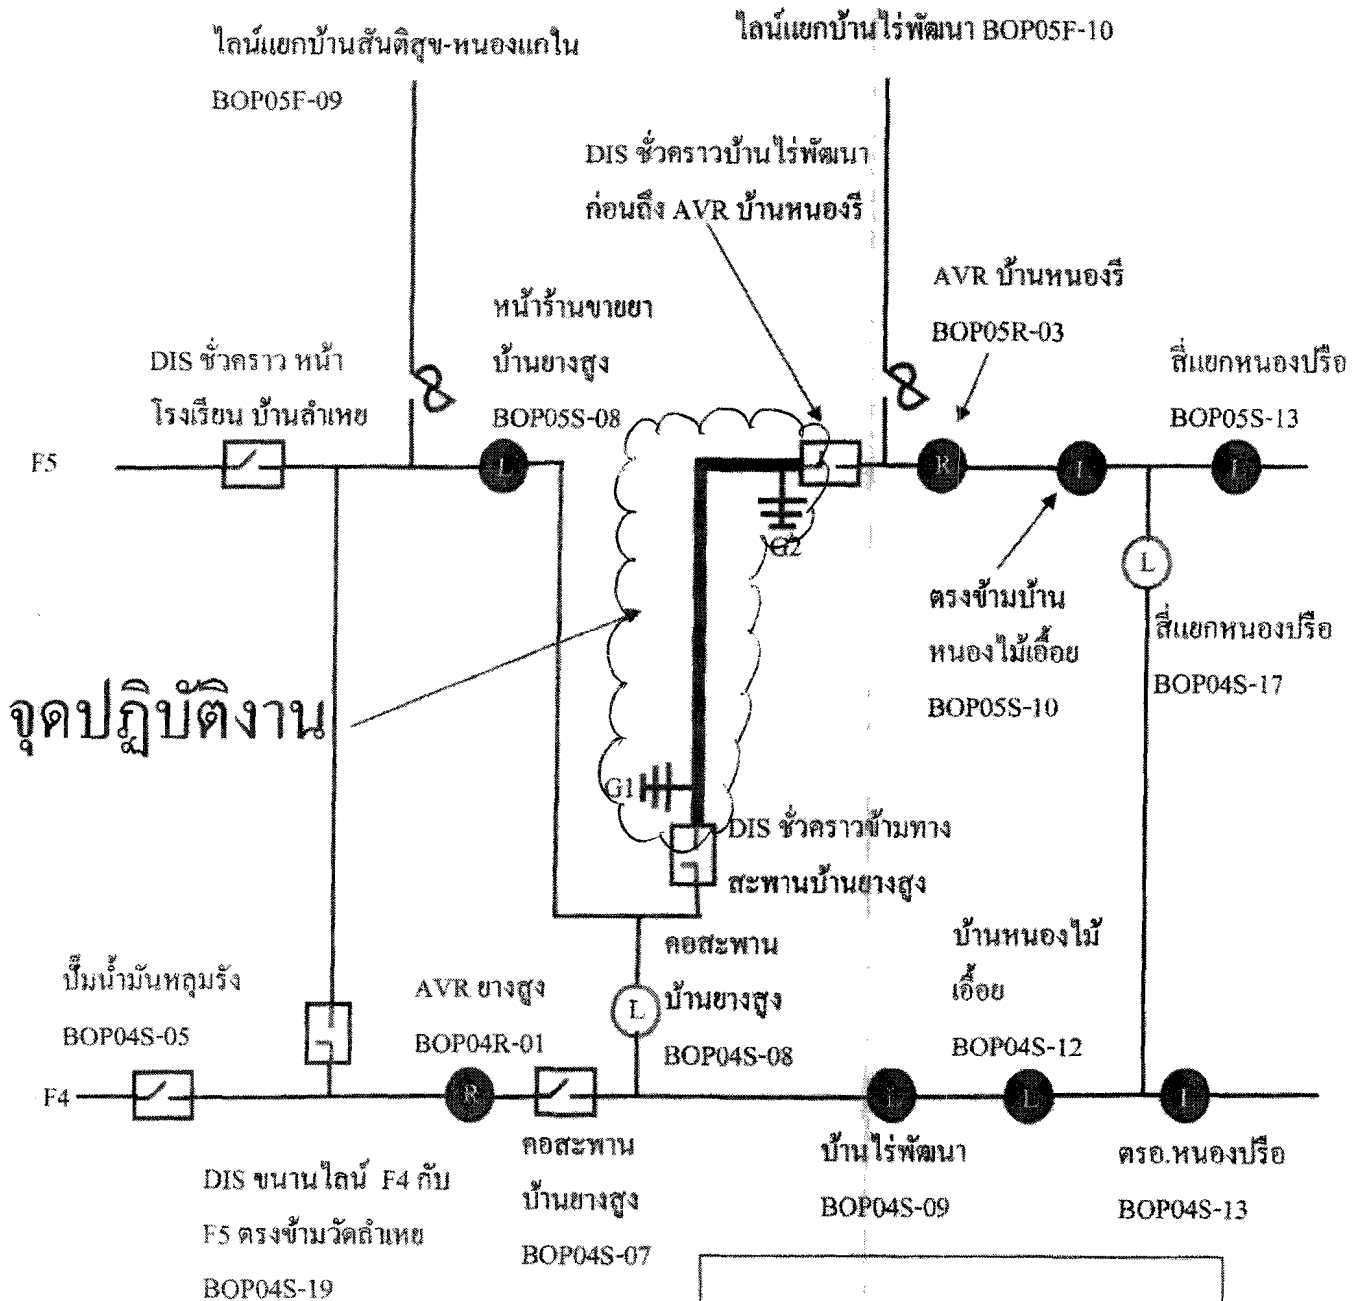

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
